

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

*ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
с.ЗАХАРОВСКОЕ, с.ШИЛИНСКОЕ, д.КОЛЯСНИКОВА, д.ШИПИЦИНА.*

ПОДД-2015

2015 г.

Утверждаю:

Глава администрации МО "Обуховское сельское поселение":

_____ В.И. Верховурбов

" _____ " _____ 2015 года

*ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
с.ЗАХАРОВСКОЕ, с.ШИЛИНСКОЕ, д.КОЛЯСНИКОВА, д.ШИПИЦИНА.*

Исполнитель:

Директор общества с ограниченной ответственностью
"АгроНефтеХимПроект"

_____ А.Г. Фурсов

" _____ " _____ 2015 года

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Номер листов
1	Ведомость рабочих чертежей	3
2	Условные обозначения	4
3	Схема улично-дорожной сети с.Захаровское	5
4	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, пер.Гагарина	6-8
5	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, ул.Бачурина (часть1)	9-12
6	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское ул.Бачурина (часть2)	13-17
7	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, ул.Ленина (часть1)	18-22
8	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, ул.Ленина (часть1)	23-28
9	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, ул.Новая	29-31
10	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, ул.Советская	32-36
11	Проект организации дорожного движения по с.Захаровское, ул.Тимова	37-39
12	Схема улично-дорожной сети с.Шилкинское	40
13	Проект организации дорожного движения по с.Шилкинское, ул.Ленина (часть1)	41-47
14	Проект организации дорожного движения по с.Шилкинское, ул.Ленина (часть2)	48-50
15	Схема улично-дорожной сети д.Колясников	51
16	Проект организации дорожного движения по д.Колясников, Ключевая	52-55
17	Проект организации дорожного движения по д.Колясников, Центральная	56-61
18	Проект организации дорожного движения по д.Колясников, Южная	62-64
19	Схема улично-дорожной сети д.Шипицина	65
20	Проект организации дорожного движения по д.Шипицина,ул.Кондратьева(часть1)	66-69
21	Проект организации дорожного движения по д.Шипицина,ул.Кондратьева(часть2)	70-72
22	Проект организации дорожного движения по д.Шипицина,ул.Пролетарская (часть2)	73-75
23	Проект организации дорожного движения по д.Шипицина,ул.Пролетарская(часть3)	76-78
24	Проект организации дорожного движения по д.Шипицина,ул.Северная (часть 1)	79-81
25	Проект организации дорожного движения по д.Шипицина,ул.Северная (часть 2)	82-84

1. Настоящий проект организации дорожного движения (далее по тексту - ПОДД) муниципальных автодорог, находящихся на территории "Обуховского сельского поселения", с.Захаровское, с.Шилкинское, д.Колясников, д.Шипицина, разработан Обществом с ограниченной ответственностью "АгроНефтеХимПроект" по заказу администрации Обуховского сельского поселения.

2. ПОДД разработан на основании статьи 21 Федерального закона "О безопасности движения" №196-ФЗ от 10 декабря 1995г.

3. ПОДД разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правил дорожного движения, стандартов, технических норм и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимого режима движения и организация регулирования узлов в соответствии с категорией улицы (дороги), конструктивными элементами поперечного профиля, искусственными дорожными сооружениями и другими факторами, влияющими на дорожное движение;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении объектов, населенных пунктов, маршрутах проезда грузового транспорта, в том числе с опасными грузами и транзитных автомобилей через населенный пункт.

- обеспечение рационального использования всей ширины проезжей части для движения автотранспортных средств, соблюдения правил движения и парковки.

4. Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

5. Техническое задание на разработку ПОДД утверждено Заказчиком.


6. Обследование улично-дорожной сети проведено в феврале 2015 года.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Контур проезжей части в бровках			Горизонтальная дорожная разметка, с указанием номера по ГОСТ Р 51256-99
	<p>Автобусные остановки на автомобильной дороге</p> <p>1 - Автобусный павильон существующий 2 - Автобусный павильон проектируемый 3 - Заездной карман</p>		<p>— (239)</p> <p>— (399)</p>	Способы установки дорожных знаков: - сбоку на стойке (стойках) - сбоку на консоли
	<p>Искусственные сооружения</p> <p>1 - Водопропускные трубы, с указанием месторасположения 2 - Мосты, путепроводы, с указанием адреса начала и адреса конца сооружения</p>		<p>— (239) </p> <p>— (239) </p>	<p>Дорожные знаки</p> <p>— Существующие</p> <p>— Проектируемые</p>
	<p>Примыкание к проезжей части, с указанием месторасположения</p> <p>2 - Тротуар существующий 3 - Тротуар проектируемый</p>		<p>— (239) </p>	— Ошибочно дислоцированные
	График кривых в плане, с указанием начала и конца кривой, радиуса кривой и угла поворота трассы			Участки дороги (улицы) представляемые на отдельном листе
	График продольных уклонов, с указанием начала и конца уклона, его значения в промиллях и длины уклона			Металлические опоры высоковольтной ЛЭП
	<p>График необеспеченной видимости</p> <p>— В прямом направлении, — В обратном направлении, С указанием начала и конца участка с ограниченной видимостью и минимального допустимого значения обеспеченной видимости для данной категории дороги (улицы) или ее участка</p>			<p>Ограждающие и направляющие устройства</p> <p>— ограждения пешеходные существующие</p> <p>— ограждения пешеходные проектируемые</p> <p>— ограждения барьерные существующие</p> <p>— ограждения барьерные проектируемые</p> <p>— столбики сигнальные существующие</p> <p>— столбики сигнальные проектируемые</p>
	<p>Ширина проезжей части и обочин. Значения указанные от дефиса слева относятся к левой стороне проезжей части, справа - к правой:</p> <p>10 - ширина обочины 10,5 - ширина укрепленной части обочины 3,0 - ширина полосы движения в данном направлении</p>		<p>— (3.1)</p> <p>— (1.33)</p> <p>— (2.1)</p>	<p>— Существующие</p> <p>— Ошибочно дислоцированные</p> <p>— Проектируемые</p>
	<p>Опоры освещения:</p> <p>1 - существующая; 2 - проектируемая</p>			
	<p>Светофоры:</p> <p>— Транспортные существующие</p> <p>— Светофор типа Т.7</p> <p>— Пешеходные существующие</p>			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата



СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ с.ЗАХАРОВСКОЕ

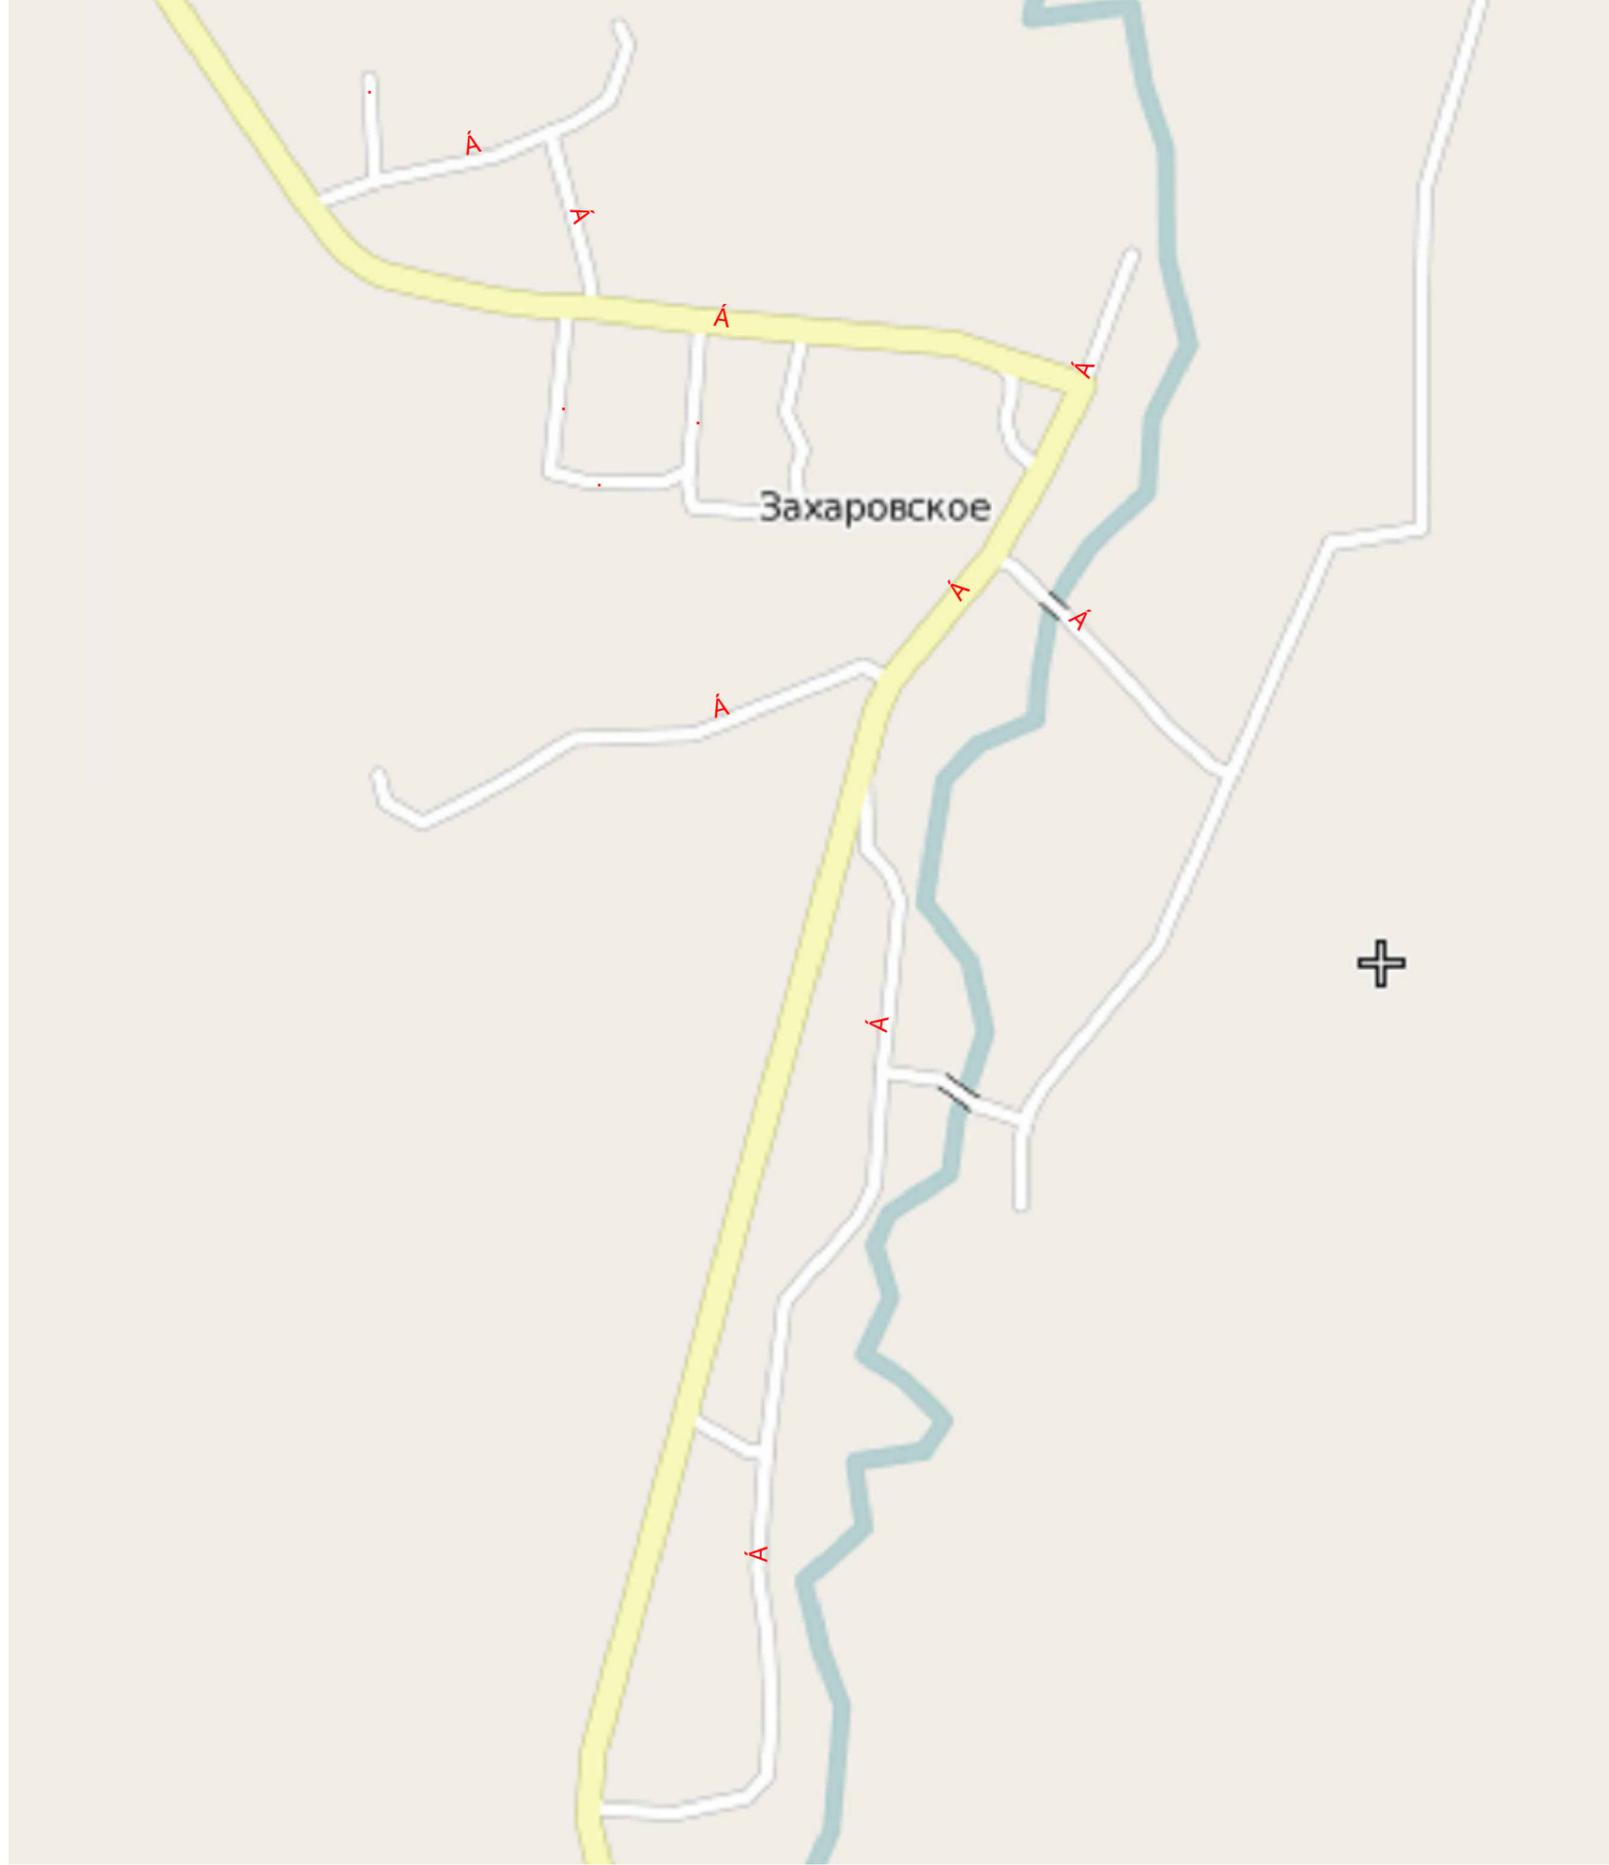

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО пер.ГАГАРИНА
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

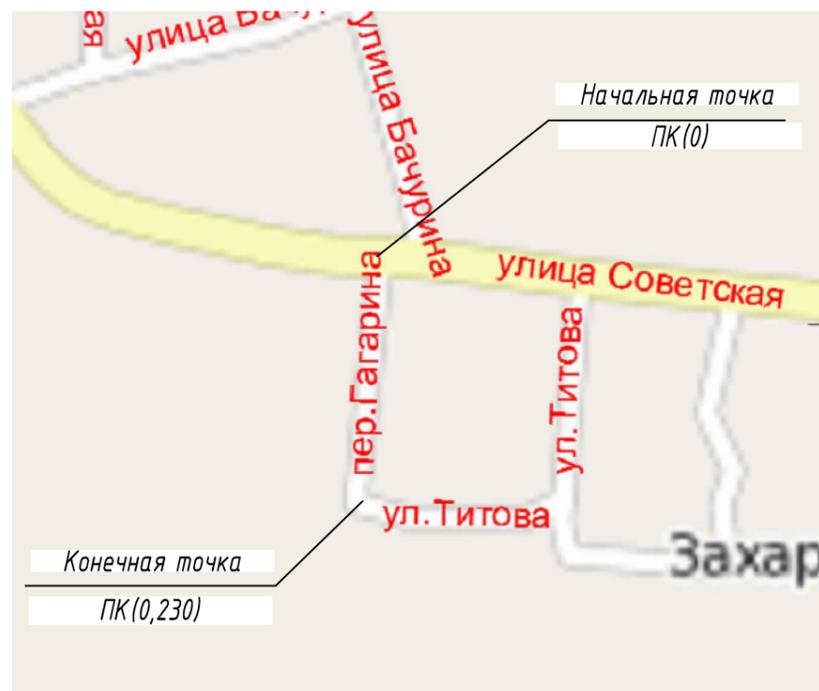

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ пер.ГАГАРИНА

1. Переулок Гагарина имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность пер.Гагарина составляет 230 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей переулок Гагарина и ул.Советская. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,230).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

4. По пер.Гагарина осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование пер.Гагарина установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по пер.Гагарина отсутствуют

7. Светофорные объекты на пер.Гагарина отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (административный район)	с. Захаровское пер. Гагарина
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

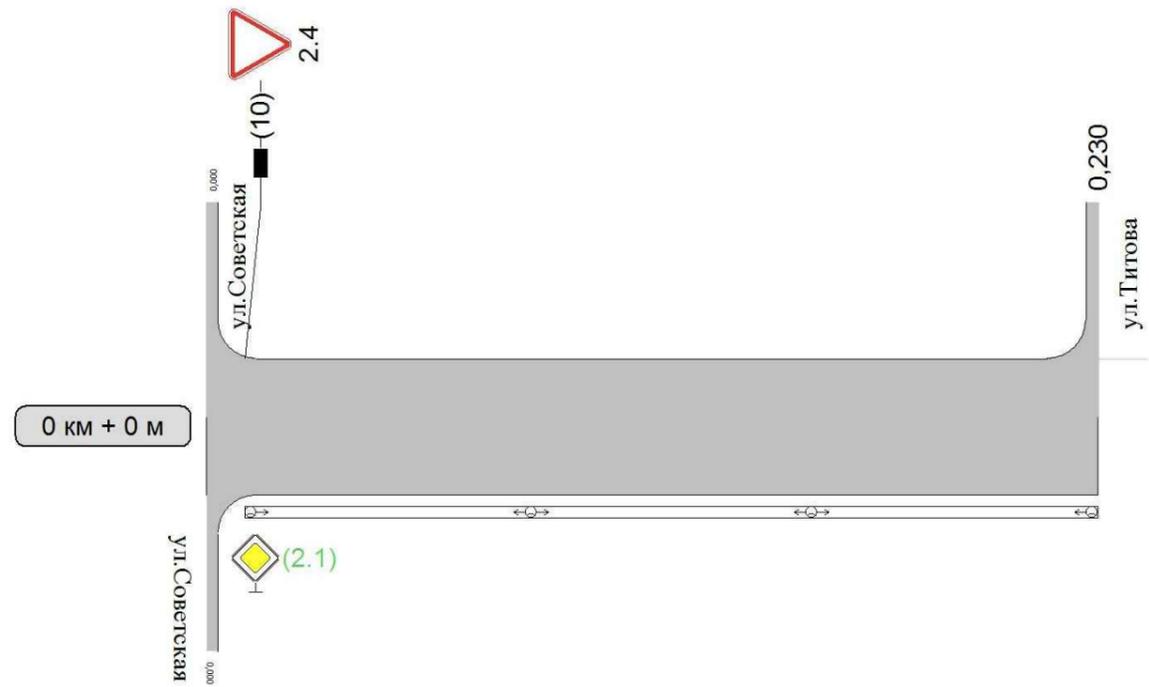

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001897 - с.Захаровское пер.Гагарина

Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					1		
		Итого:					2		
		Всего установлено:					1		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					1		
		Всего:					2		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001897 - с.Захаровское пер.Гагарина

Участок: 0,000 - 0,230 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
	Итого для группы	0
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

8

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.БАЧУРИНА часть1
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.БАЧУРИНА часть1

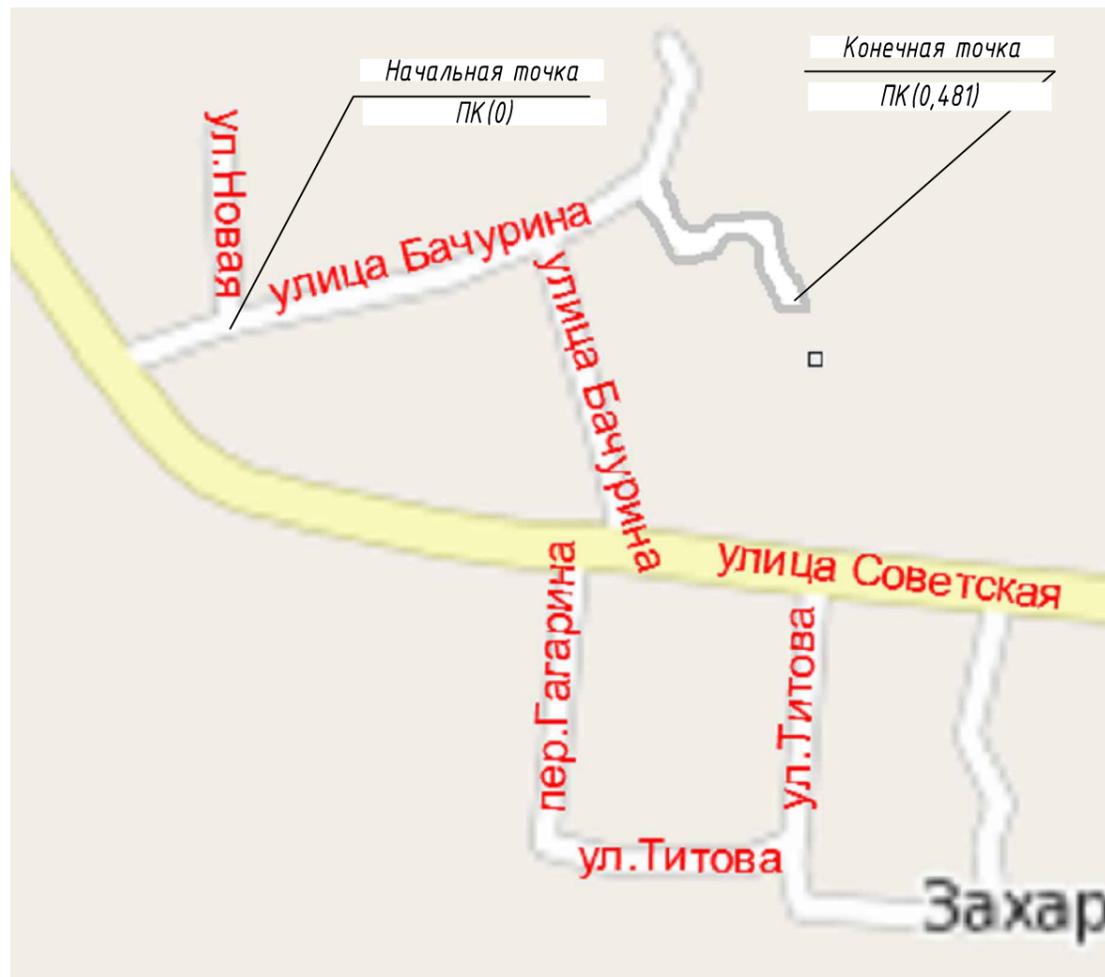

1. Улица Бачурина часть1 имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Бачурина часть1 составляет 481 м.

Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,481).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Бачурина часть1 осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта;


5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Бачурина часть1 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.

6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Бачурина отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.Бачурина часть1 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (адм. район)	с. Захаровское ул. Бачурина (часть 1)		Разметка на участке:
Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		

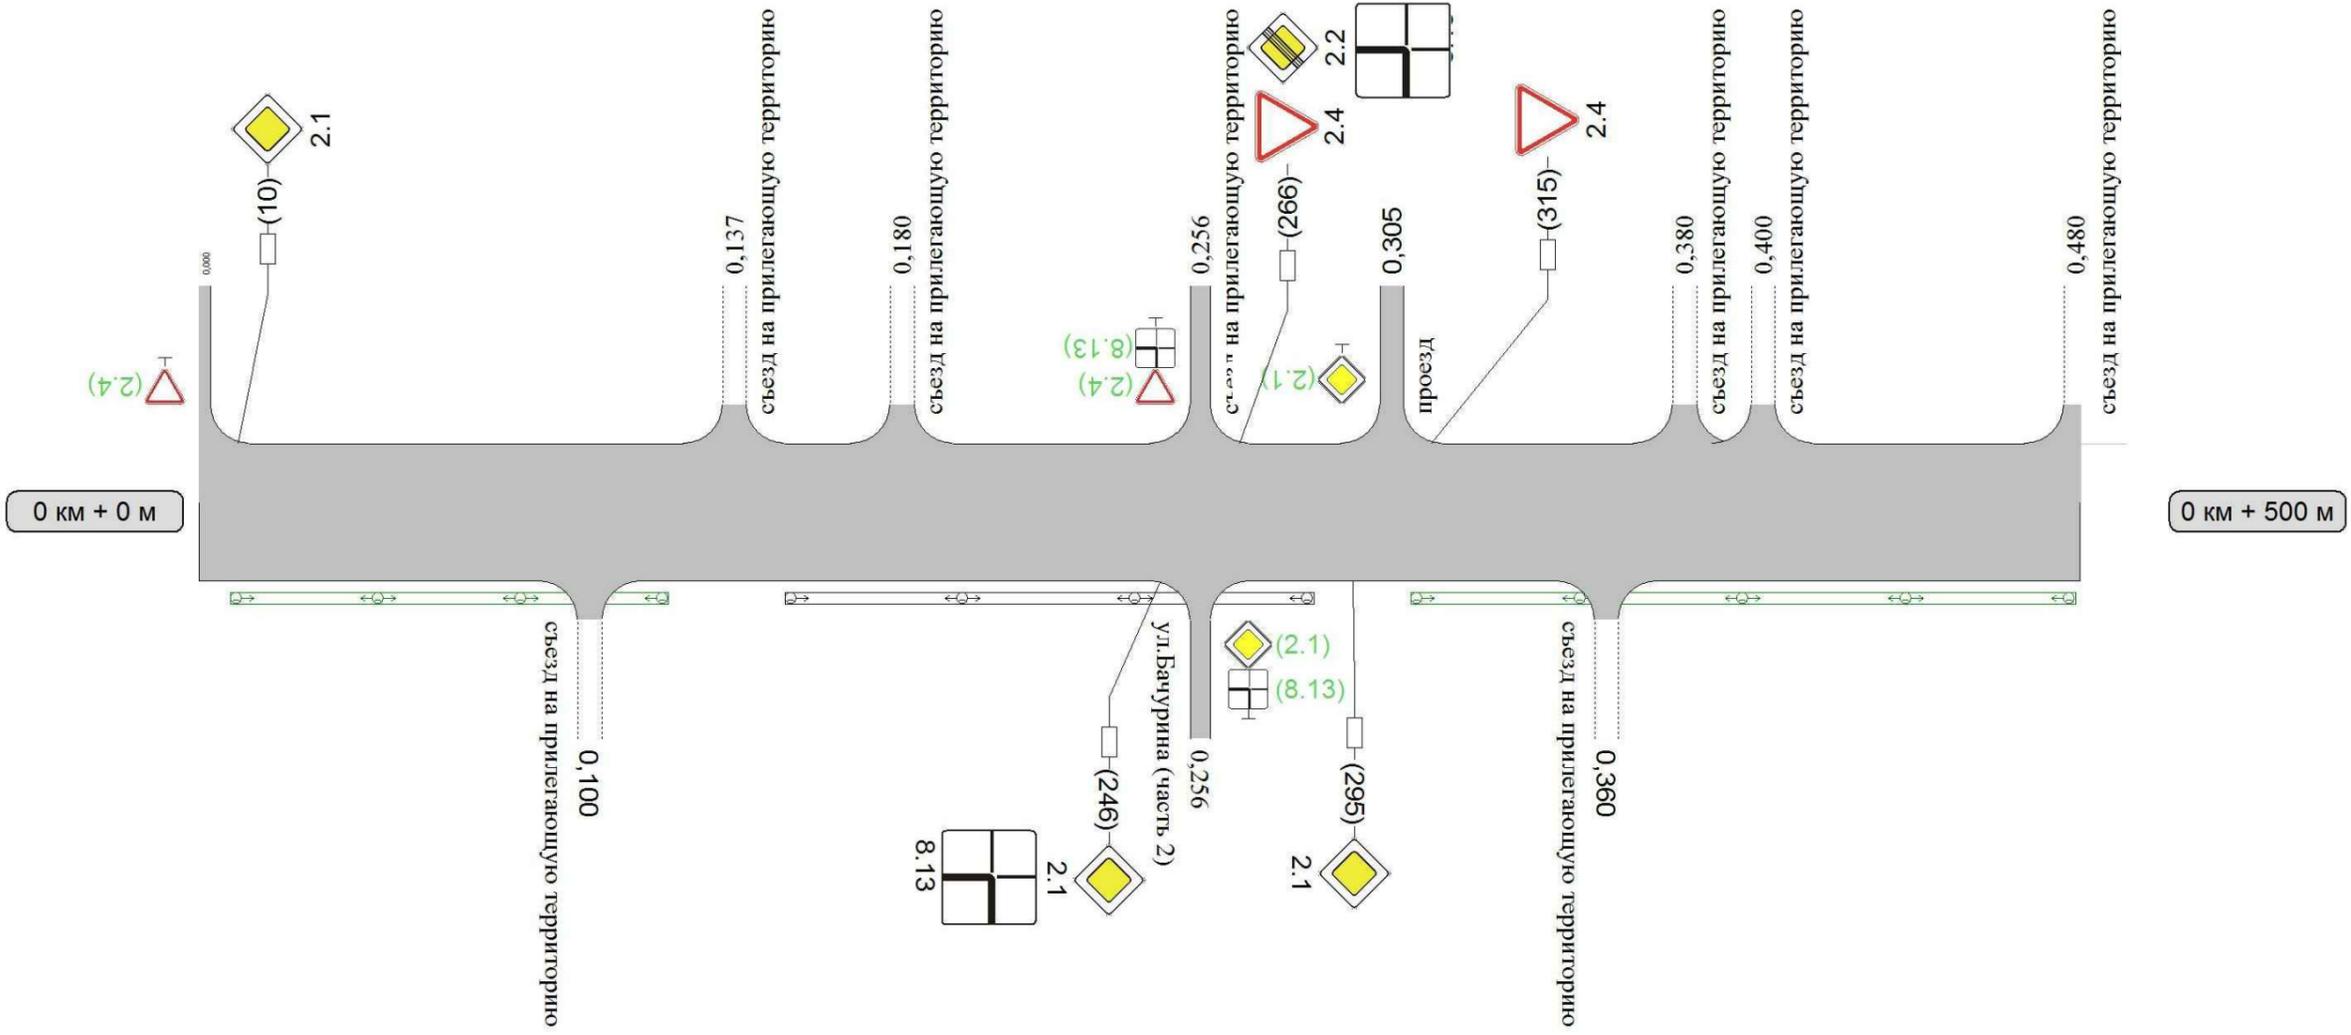

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,481 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Местоположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется установить	1		слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+246	требуется установить	1	справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+256	требуется установить	1	съезд справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+295	требуется установить	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+305	требуется установить	1		съезд слева
6	2.2	Конец главной дороги	2		0+266	требуется установить	1		слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+256	требуется установить	1		съезд слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+266	требуется установить	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+315	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							10		
Итого:							10		
Знаки дополнительной информации(таблички)									
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+256	требуется установить	1	съезд справа	
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+266	требуется установить	1		слева
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+256	требуется установить	1		съезд слева
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+246	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							4		
Итого:							4		
Всего установлено:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							14		
Всего:							14		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

11

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,481 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	3
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступите дорогу	2
	Итого для группы	6
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	2

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,481 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+008	0+120		4/4	112	0	112	Справа
2	0+310	0+480		5/5	170	0	170	Справа
Итого:				9/9	282	0	282	



Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

12

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.БАЧУРИНА часть2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

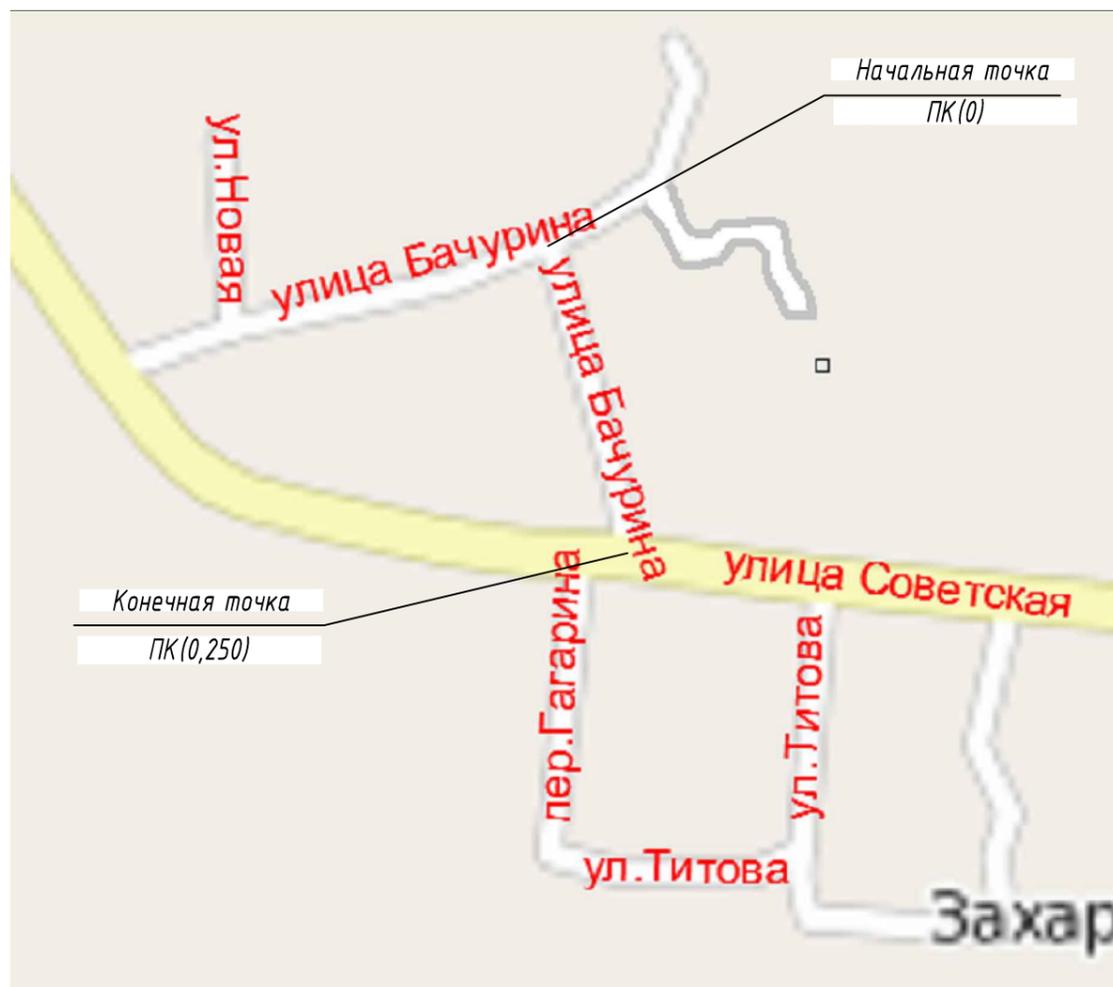


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.БАЧУРИНА часть2

1. Улица Бачурина часть2 имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Бачурина часть2 составляет 250 м.
Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Бачурина и ул.Бачурина. Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Бачурина и ул.Советской. Конечной точке присвоен ПК (0,250).
3. Ширина проезжей части составляет 6 м.
4. По ул.Бачурина часть2 осуществляется движение:
 - легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Бачурина часть2 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Бачурина часть2 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Бачурина часть2 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (административный район)	с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)		
Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	НД : ПО 10 - 45	НД : ПО 59 - 85	НД : ПО 95 - 109
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		

Разметка на участке:
1.1 : 91 м
1.6 : 109 м
1.14.1 : 6 м
1.25 : 26 шт

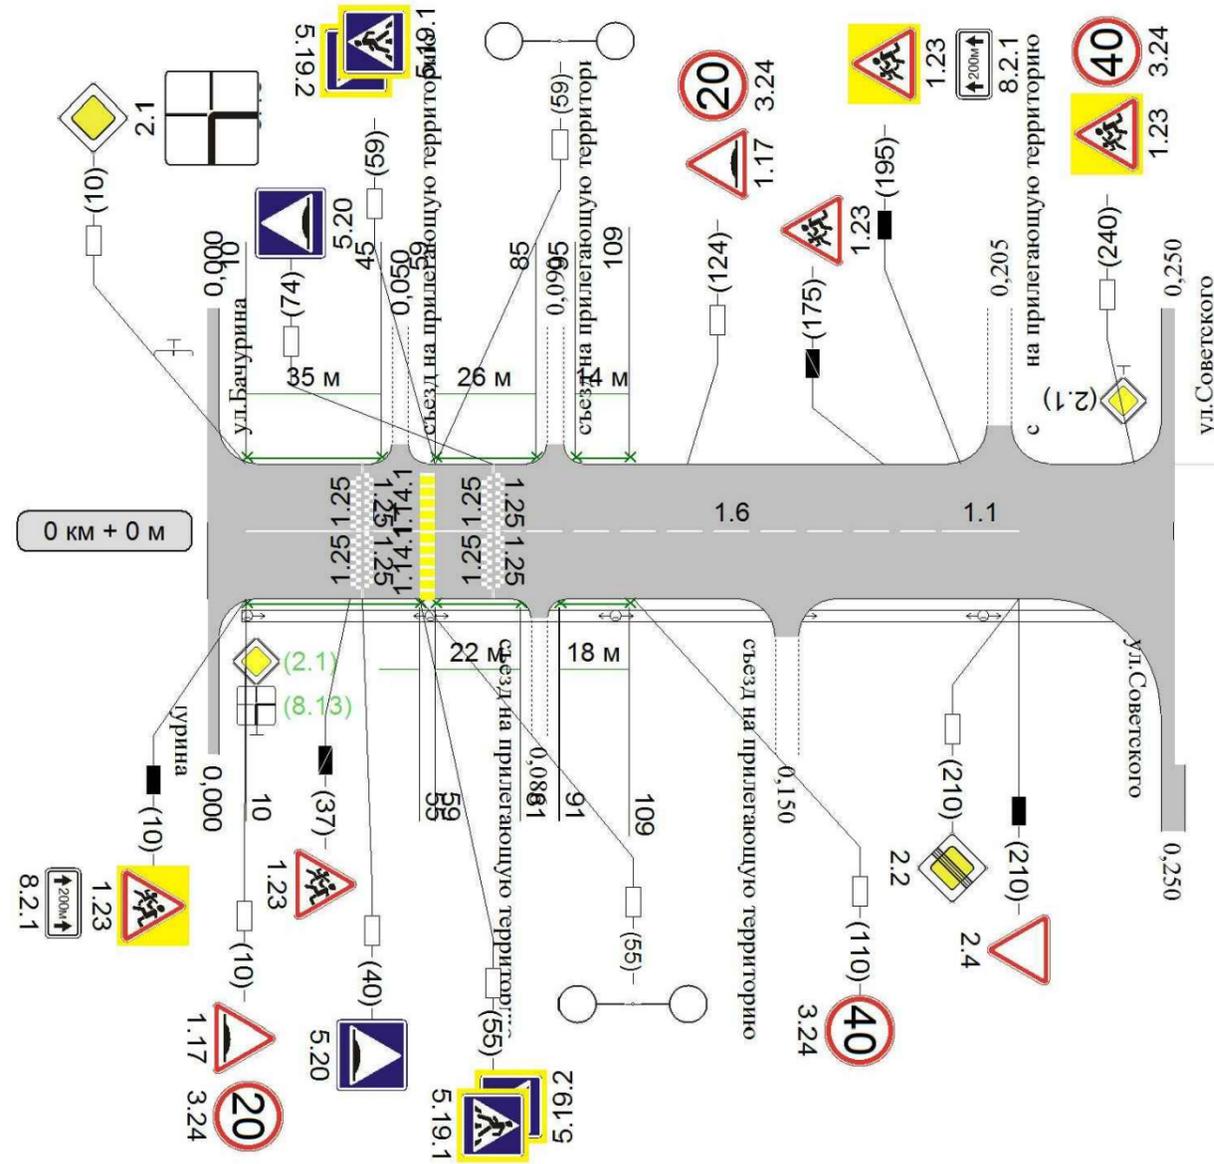

0 км + 500 м

Осевая линия	1.1 10 - 81	1.6 81 - 190	1.1 190 - 210
1-ая от осевой			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	НД : ПО 10 - 55	НД : ПО 59 - 81	НД : ПО 91 - 109
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типо размер знака	Площадь знаков, м2 (для знака в индивидуальном проектировании)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+010	требуется установить	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+124	требуется установить	1		слева
3	1.23	Дети	2		0+010	установлено	1	справа	
4	1.23	Дети	2		0+037	демонтировать	1	справа	
5	1.23	Дети	2		0+175	демонтировать	1		слева
6	1.23	Дети	2		0+195	установлено	1		слева
7	1.23	Дети	2		0+240	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					2		
		Итого демонтировать:					2		
		Итого требуется:					3		
		Итого:					5		
		Знаки приоритета							
8	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется установить	1		слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+250	установлено	1		съезд слева
11	2.2	Конец главной дороги	2		0+210	требуется установить	1	справа	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	установлено	1	справа	
		Итого установлено:					2		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					4		
		Итого:					6		
		Запрещающие знаки							
14	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+010	требуется установить	1	справа	
15	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+110	требуется установить	1	справа	
16	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+124	требуется установить	1		слева
17	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+240	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					4		
		Итого:					4		
		Знаки особых предписаний							
18	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+055	требуется установить	1	справа	
19	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+059	требуется установить	1		слева
20	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+055	требуется установить	1	справа	
21	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+059	требуется установить	1		слева
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+040	требуется установить	1	справа	
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+074	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					6		
		Итого:					6		
		Знаки дополнительной информации (таблички)							
24	8.2.1	Зона действия	2		0+010	установлено	1	справа	
25	8.2.1	Зона действия	2		0+195	установлено	1		слева
26	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	требуется установить	1		слева
27	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
28	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
		Итого установлено:					2		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					3		
		Итого:					5		
		Всего установлено:					6		
		Всего демонтировать:					2		
		Всего требуется установить:					20		
		Всего:					26		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
1.17	Искусственная неровность	2
1.23	Дети	1
	Итого для группы	3
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.2	Конец главной дороги	1
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
3.24	Ограничение максимальной скорости	4
	Итого для группы	4
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
5.20	Искусственная неровность	2
	Итого для группы	6
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	1

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
Итого:			160	0	0			0		
1	0+010	0+045	35	0	0	Слева	Конструкция перильного типа	0		
2	0+010	0+055	45	0	0	Справа	Конструкция перильного типа	0		
3	0+059	0+081	22	0	0	Справа	Конструкция перильного типа	0		
4	0+059	0+085	26	0	0	Слева	Конструкция перильного типа	0		
5	0+091	0+109	18	0	0	Справа	Конструкция перильного типа	0		
6	0+095	0+109	14	0	0	Слева	Конструкция перильного типа	0		

Ведомость объемов работ по нанесению разметки

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

Обозначение	Количество, км	Количество, шт
1.1	0,091	0
1.6	0,109	0
1.14.1	0,000	2

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

16

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-ра до пешеходных переходов
1	0+057	нерегулируемый	наземный	отсутствуют

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ км	№ столба+м	1.1	1.6	1.14.1	1.25	Итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.75	1	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	1.6	0.4	
0.25	0+250	91,00	109,00	6,50	26,00	38,07
ИТОГО:		91,00	109,00	6,50	26,00	38,07
ЛИН.КМ.		0,09	0,11	0,01	0,03	0,00
ПРИВЕД.КМ.		0,09	0,08	0,01	0,03	0,00
ПЛОЩАДЬ		9,10	8,18	10,40	10,40	38,07

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0+055		2	0	0	
2	0+059		2	0	0	
Итого:			4	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0001896 - с.Захаровское ул.Бачурина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+003	0+103	Слева		100	0
Итого:					100	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

17

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ЛЕНИНА часть1
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ЛЕНИНА часть1

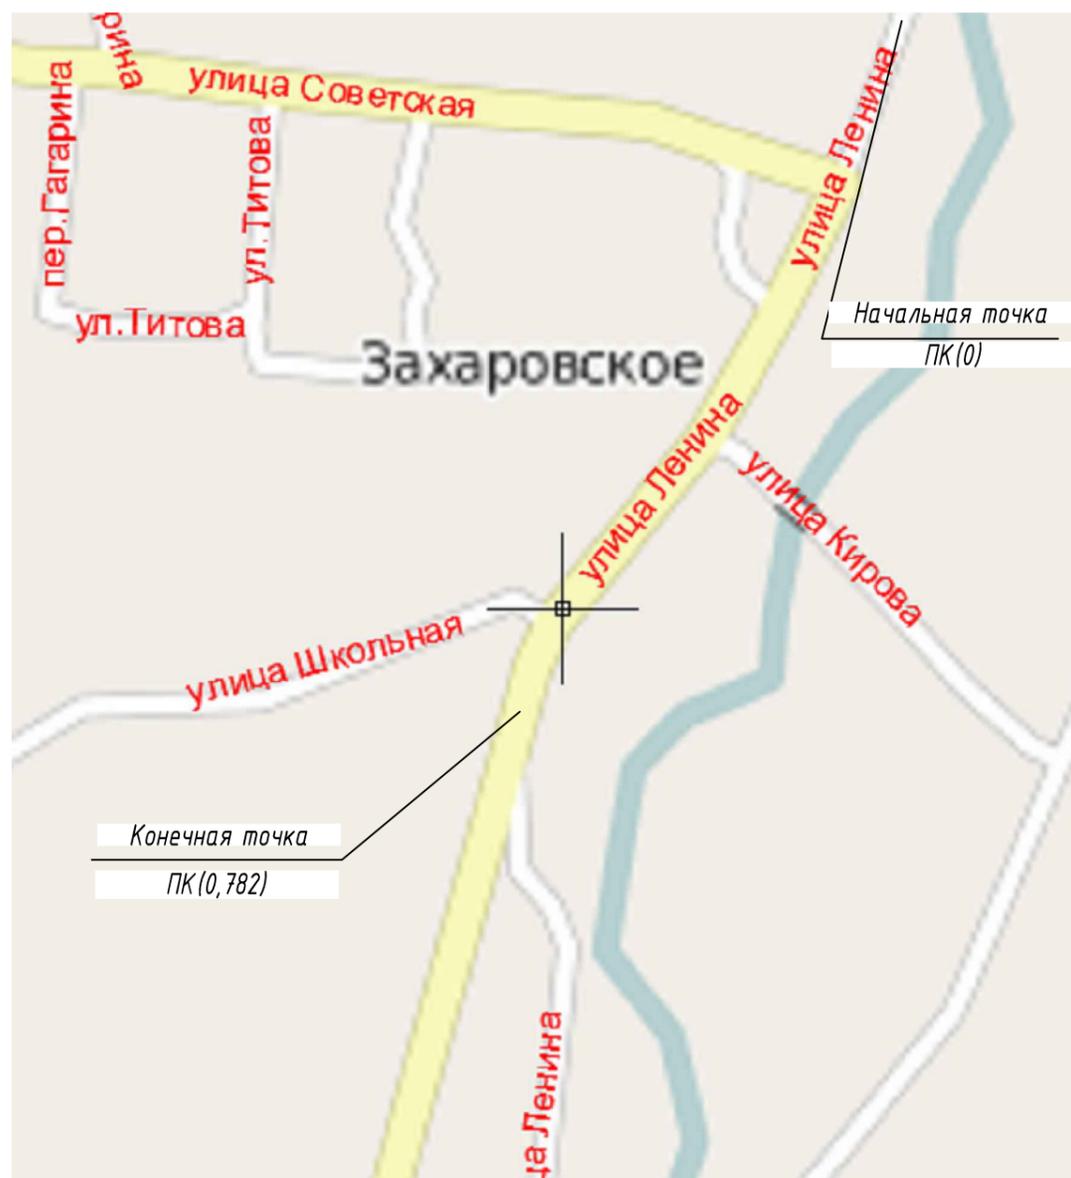


1. Улица Ленина часть1 имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Ленина часть1 составляет 782 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,782).
3. Ширина проезжей части составляет 6 м.
4. По ул.Ленина часть1 осуществляется движение:
 - легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Ленина часть1 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Ленина часть1 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Ленина часть1 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (административный район)	с. Захаровское ул. Ленина (часть 1)	
Элементы дорожной разметки в продольном профиле		
Элементы дорожной разметки в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:
 1.1 : 60 м
 1.5 : 110 м
 1.6 : 100 м

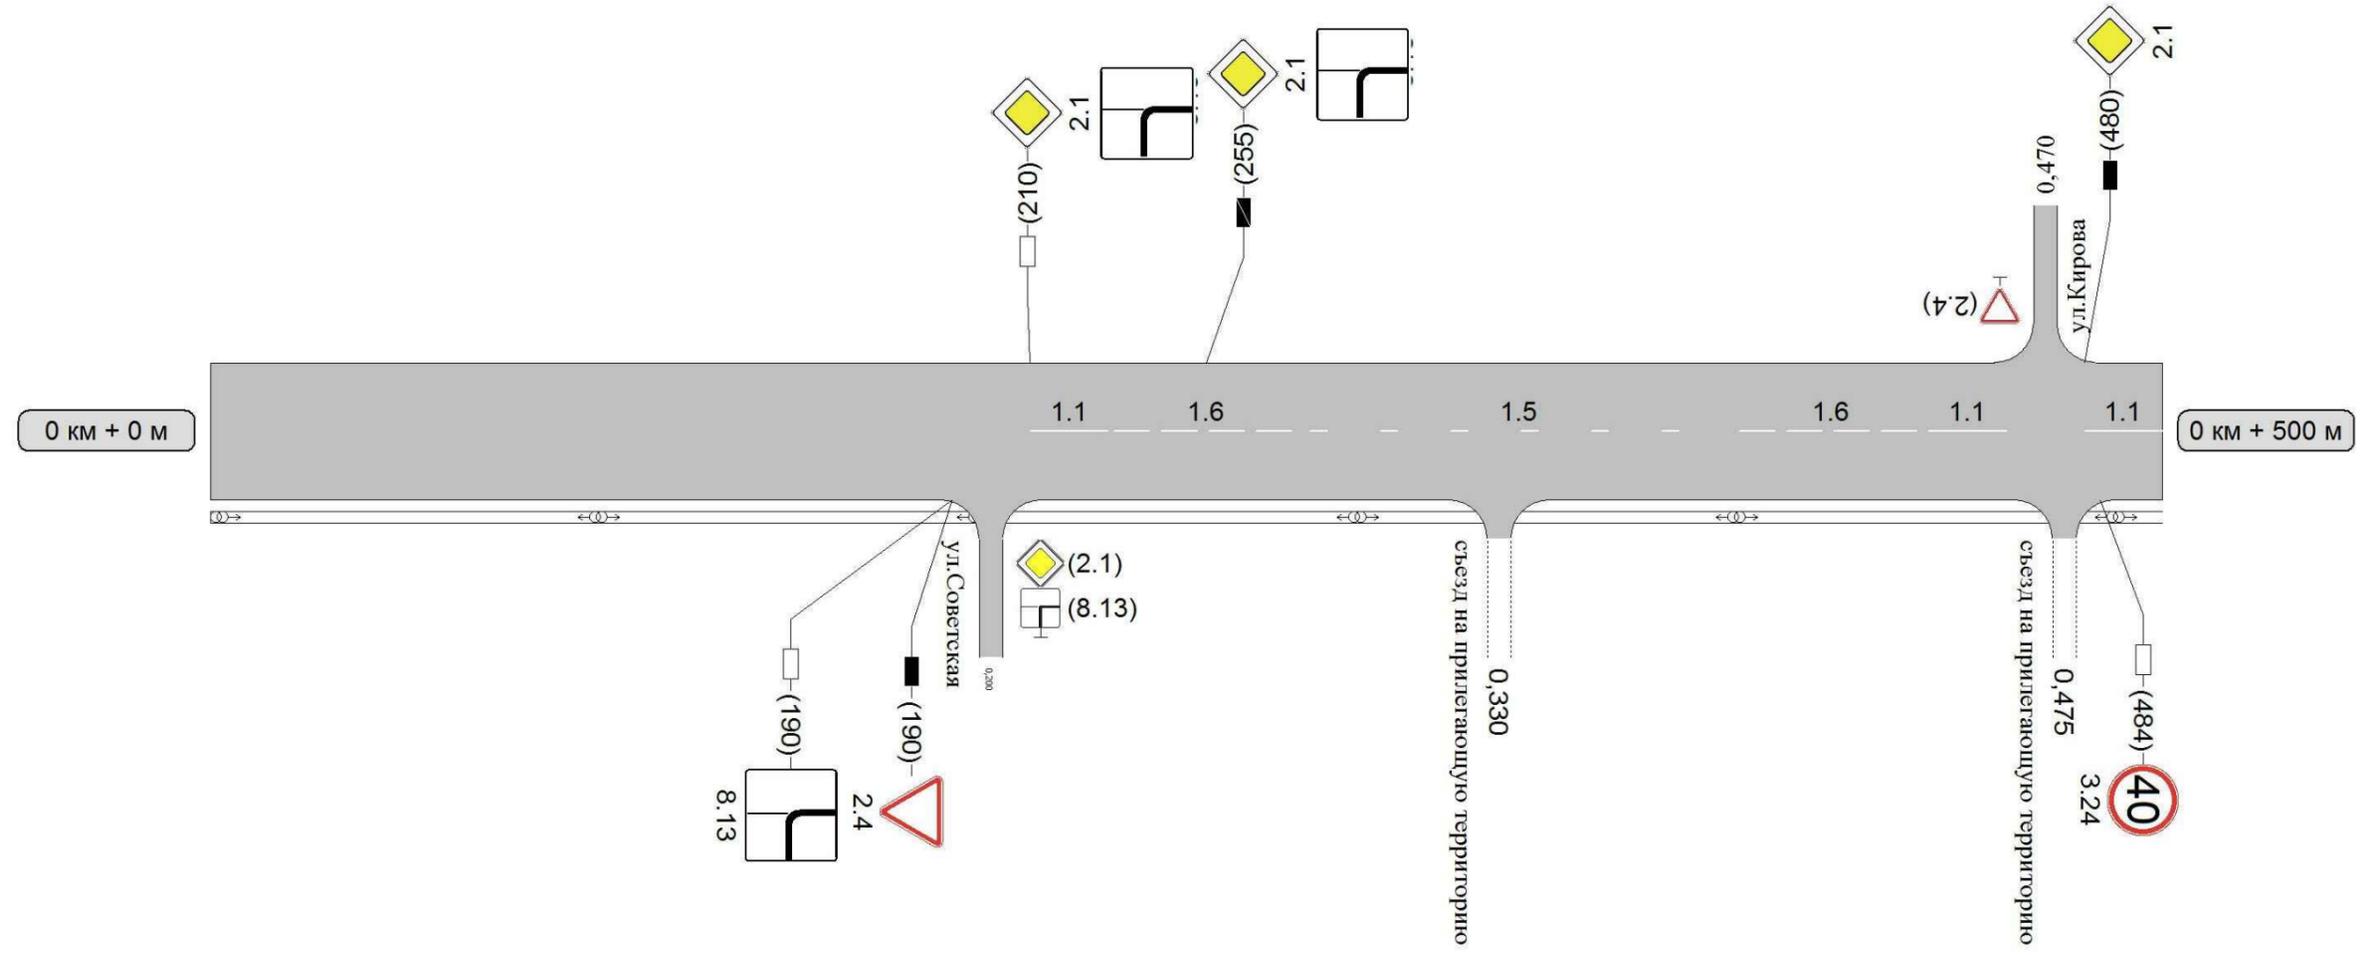


Горизонтальная дорожная разметка	Осевая линия	1.1	1.6	1.5	1.6	1.1	1.1
	1-ая от осевой	210 - 230	230 - 280	280 - 390	390 - 440	440 - 460	480 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							
Тротуары справа							

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм. элементы дороги)	с. Захаровское ул. Ленина (часть 1)		
Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане	500		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		

Разметка на участке:
1.1 : 40 м
1.6 : 222 м

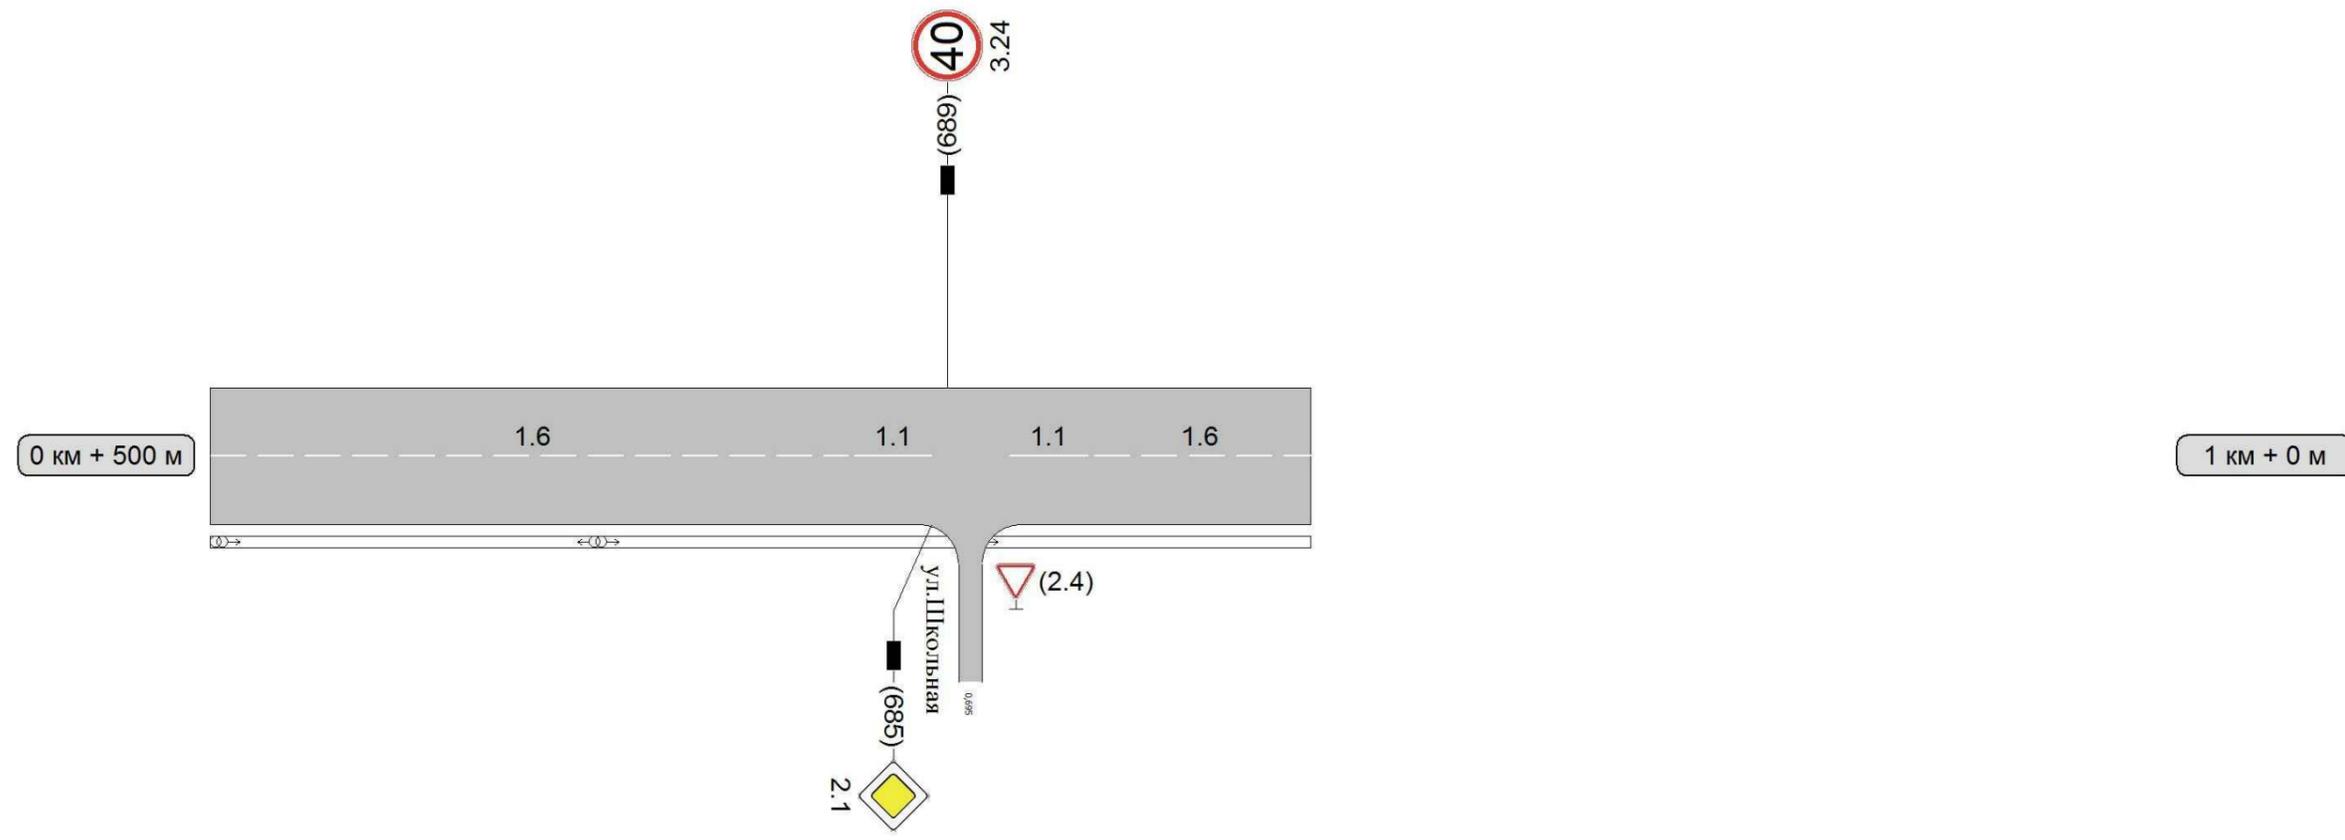

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6 500 - 665	1.1 665 - 685	1.1 705 - 725	1.6 725 - 782
	1-ая от осевой				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа					

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001900 - с.Захаровское ул.Ленина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,782 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+200	установлено	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+210	требуется установить	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+255	демонтировать	1		слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+480	установлено	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+685	установлено	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+190	установлено	1	справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+470	установлено	1		съезд слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+695	установлено	1	съезд справа	
Итого установлено:							6		
Итого демонтировать:							1		
Итого требуется:							1		
Итого:							7		
Запрещающие знаки									
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+484	требуется установить	1	справа	
10	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+689	установлено	1		слева
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							2		
Знаки дополнительной информации (таблички)									
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+200	установлено	1	съезд справа	
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+210	требуется установить	1		слева
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+255	демонтировать	1		слева
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+190	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							1		
Итого требуется:							2		
Итого:							3		
Всего установлено:							8		
Всего демонтировать:							2		
Всего требуется установить:							4		
Всего:							12		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001900 - с.Захаровское ул.Ленина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,782 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
3.24	Ограничение максимальной скорости	1
	Итого для группы	1
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	2

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: 0001900 - с.Захаровское ул.Ленина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,782 км.

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	Итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.25	0.75	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	
0.782	0+782	100,00	110,00	322,00	36,90
ИТОГО :		100,00	110,00	322,00	36,90
ЛИН.КМ.		0,10	0,11	0,32	0,00
ПРИВЕД.КМ.		0,10	0,03	0,24	0,00
ПЛОЩАДЬ		10,00	2,75	24,15	36,90

Ведомость объемов работ по нанесению разметки

Дорога: 0001900 - с.Захаровское ул.Ленина (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,782 км.

Обозначение	Количество, км	Количество, шт
1.1	0,1	0
1.5	0,1	0
1.6	0,3	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

22

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ЛЕНИНА часть2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ЛЕНИНА часть2

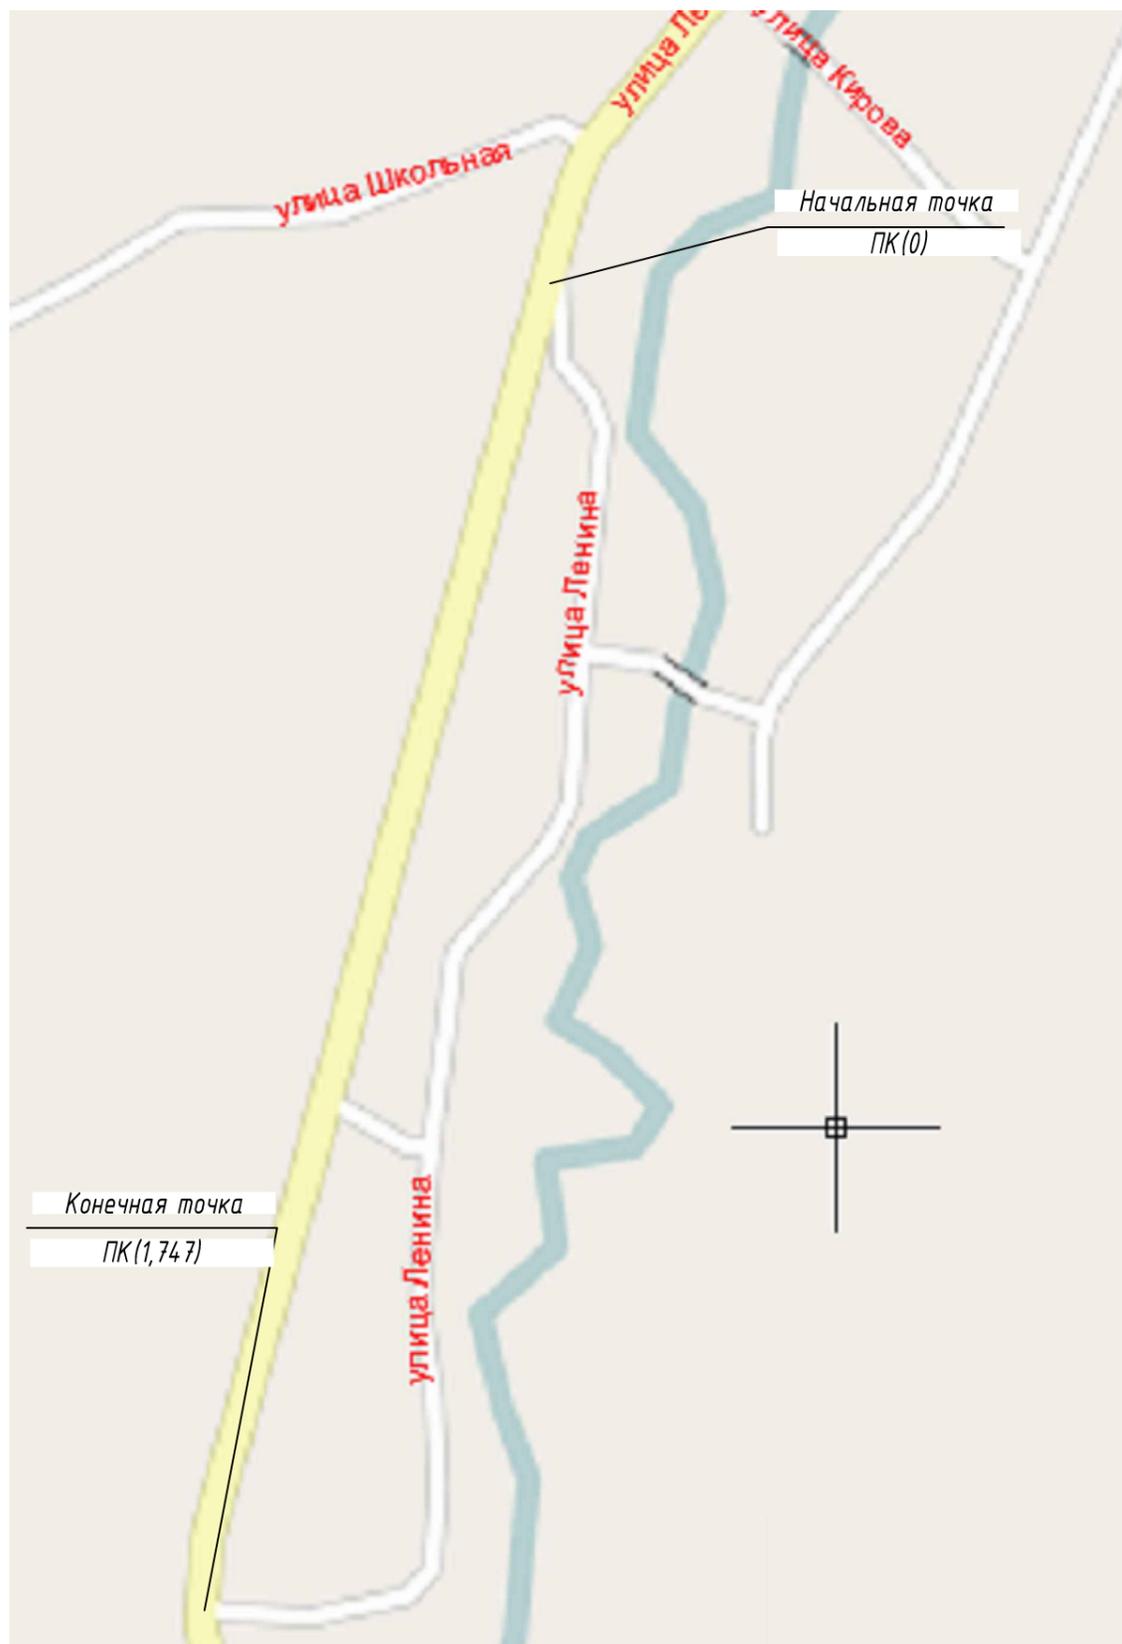


1. Улица Ленина часть2 имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Ленина часть2 составляет 1747 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (1,747).
3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.
4. По ул.Ленина часть2 осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Ленина часть2 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул.Ленина часть2 отсутствуют
7. Светофорные объекты на ул.Ленина часть2 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (административный район)	с.Захаровское ул.Ленина (часть 2)
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

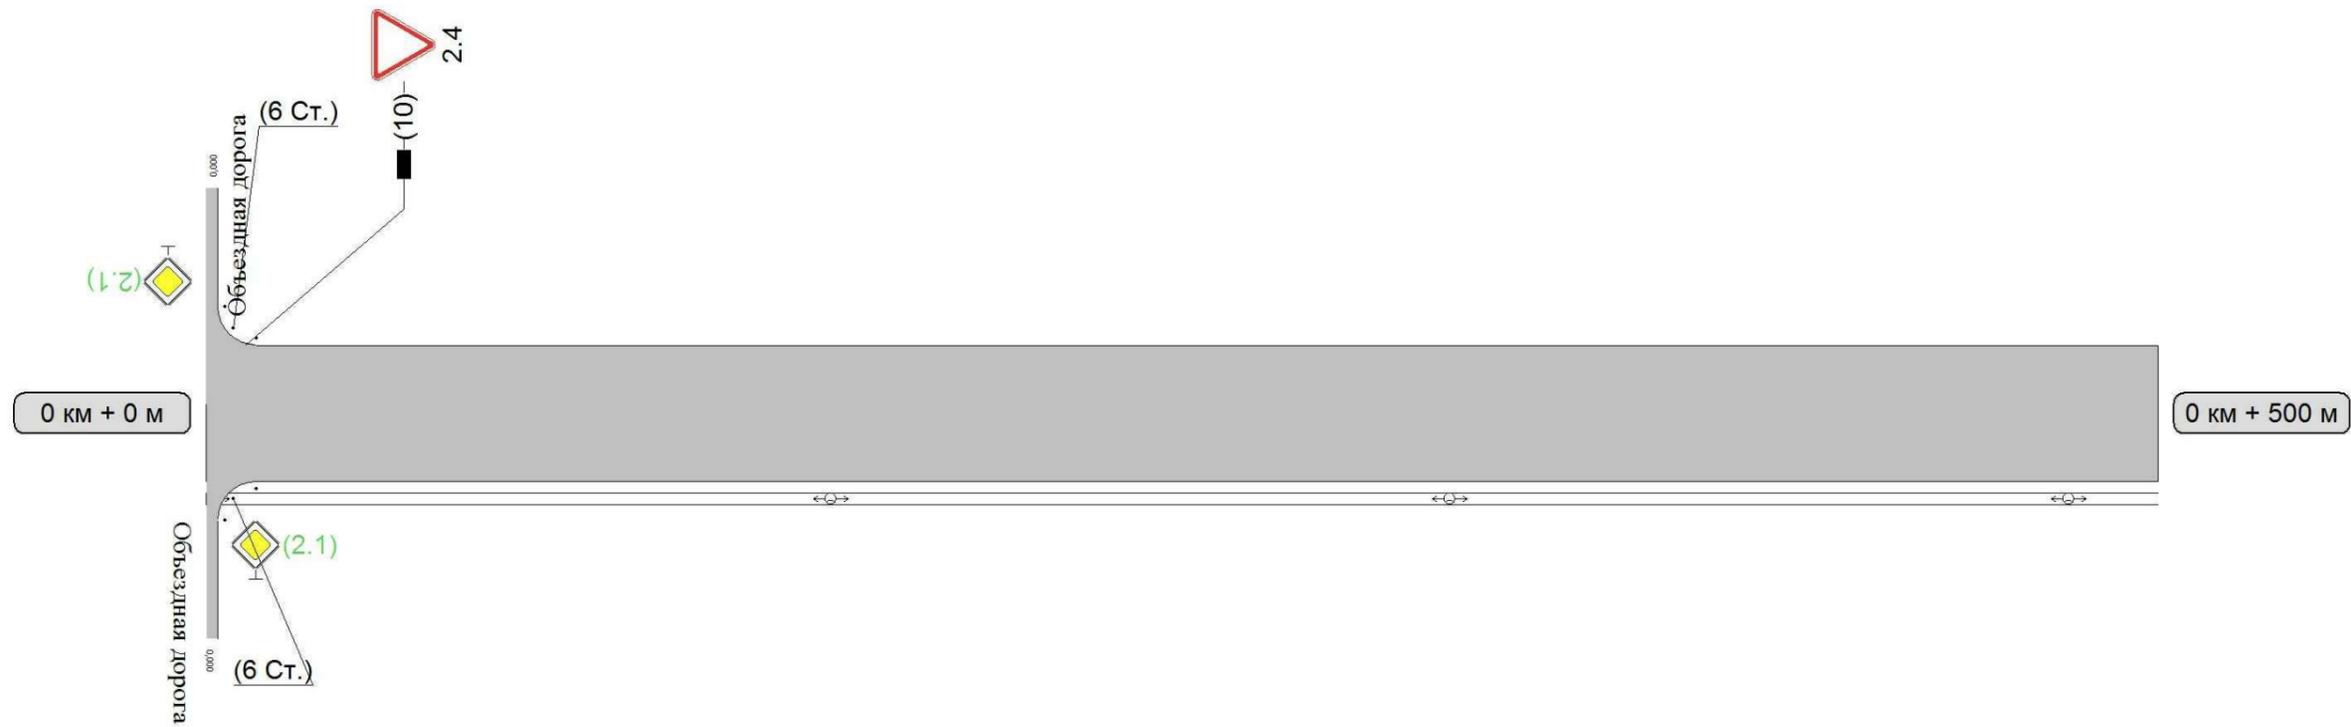


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-ая от осевой
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (административный район)	с. Захаровское ул. Ленина (часть 2)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

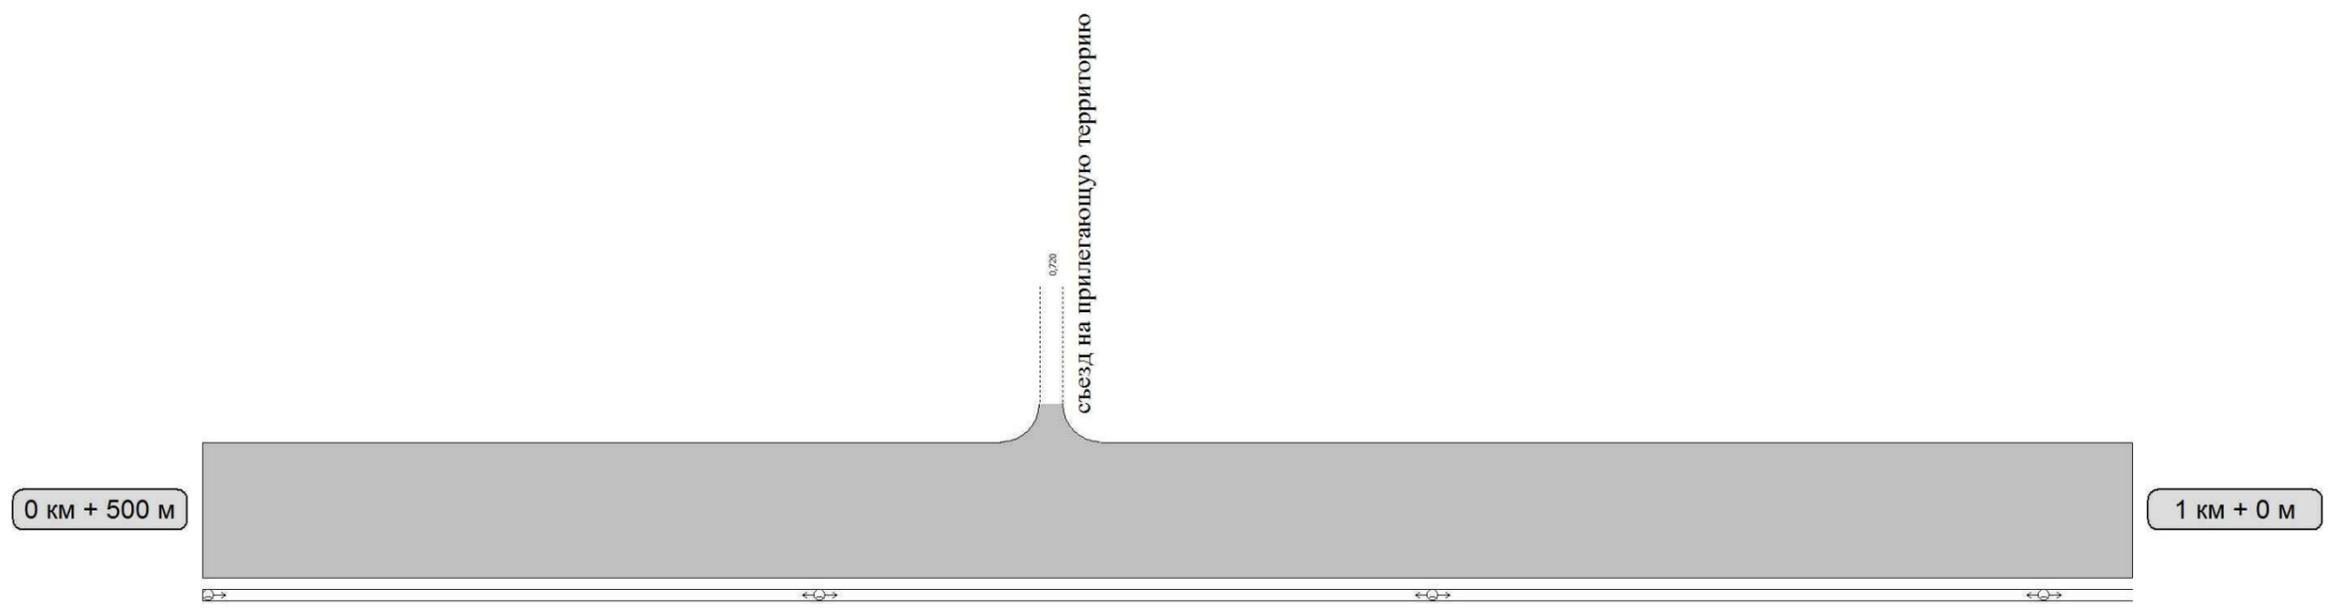


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (административный район)	с.Захаровское ул.Ленина (часть 2)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

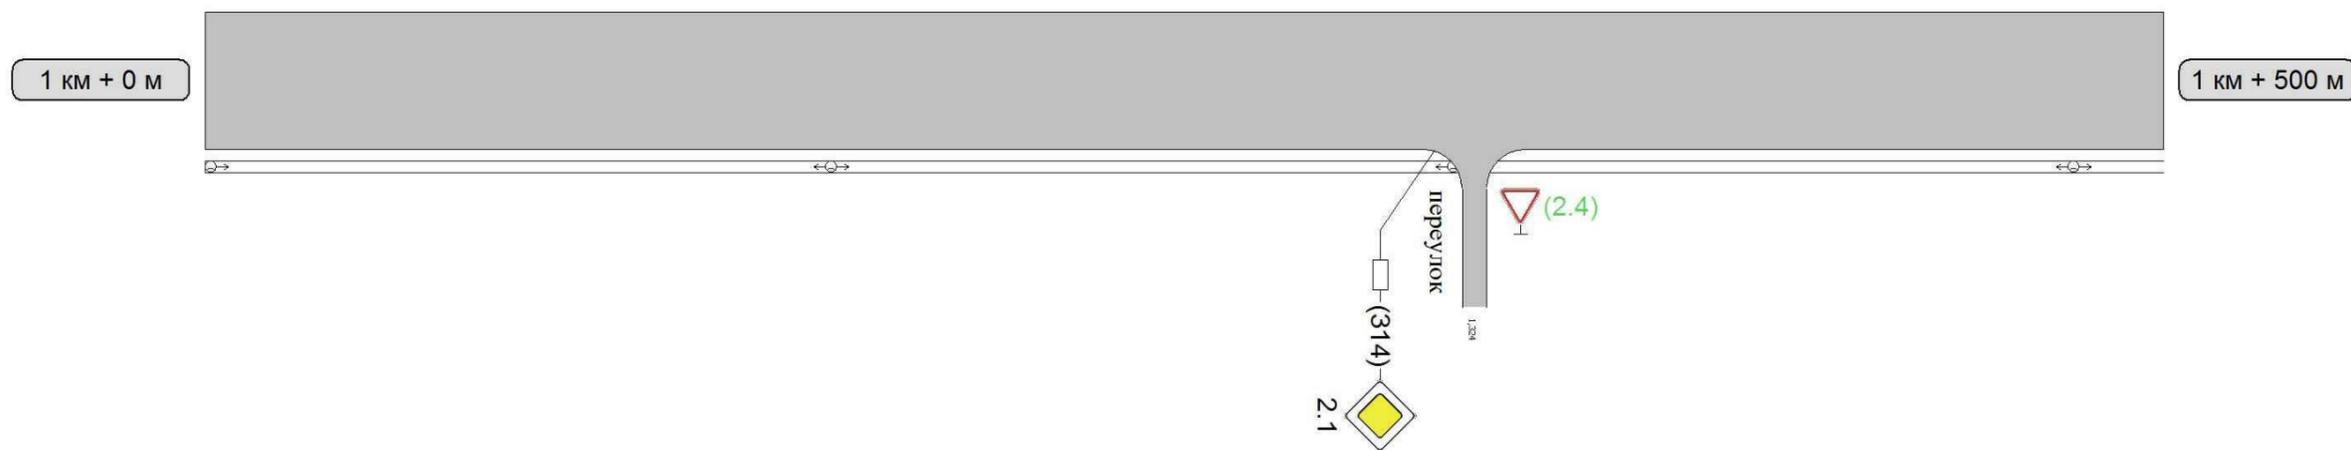


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм.-территориальный район)	с.Захаровское ул.Ленина (часть 2)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожка разметки слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

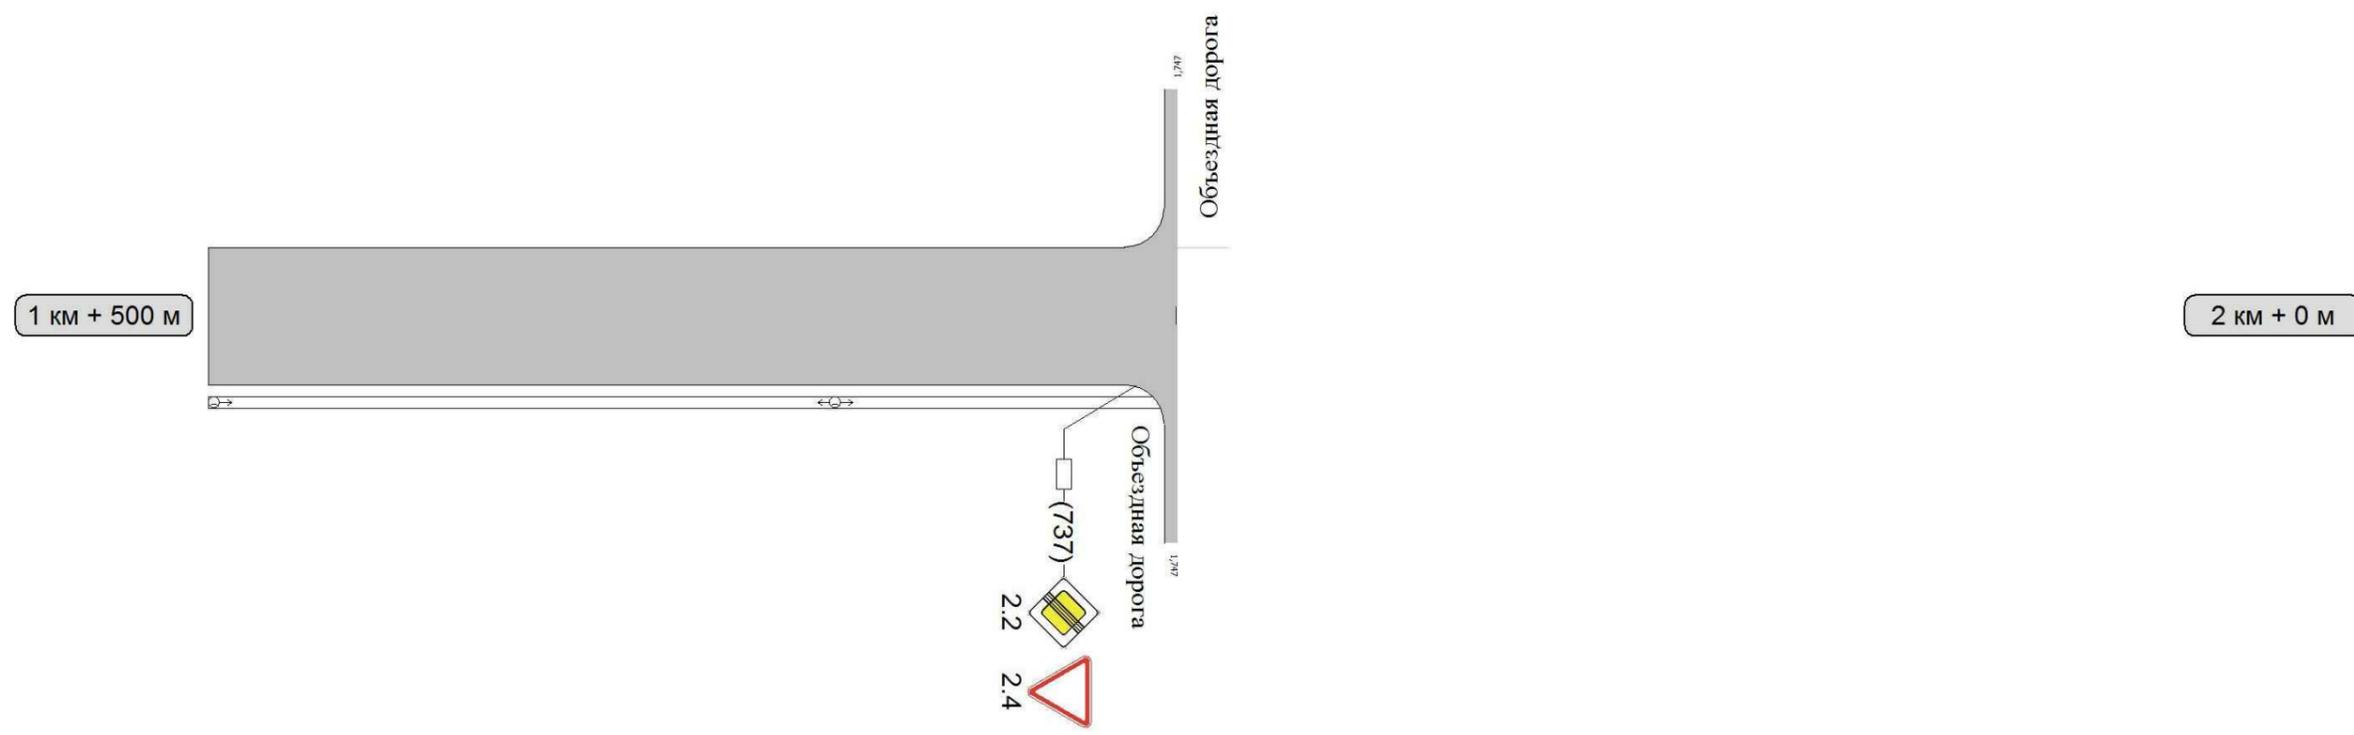

Горизонтальная дорожка разметки справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001901 - с.Захаровское ул.Ленина (часть 2)

Участок: 0,000 - 1,747 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		1+314	требуется установить	1	справа	
4	2.2	Конец главной дороги	2		1+737	требуется установить	1	справа	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		1+324	требуется установить	1	съезд справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		1+737	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							6		
Итого:							7		
Всего установлено:							1		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							6		
Всего:							7		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001901 - с.Захаровское ул.Ленина (часть 2)

Участок: 0,000 - 1,747 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	3
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

28

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.НОВАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.НОВАЯ

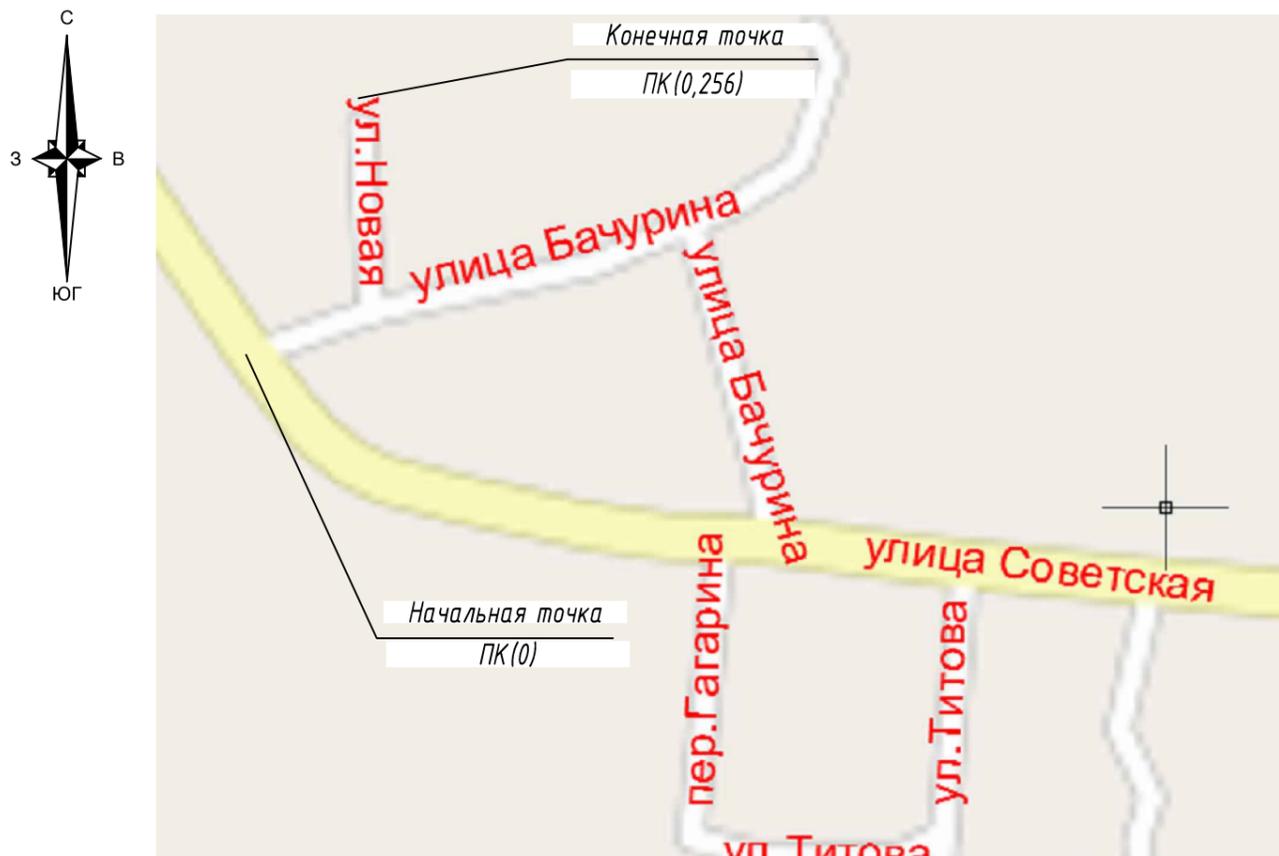


1. Улица Новая имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Новая составляет 256 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,256).
3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
4. По ул.Новая осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Новая установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Новая отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Новая отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (адм. элемент района)	с.Захаровское ул.Новая
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

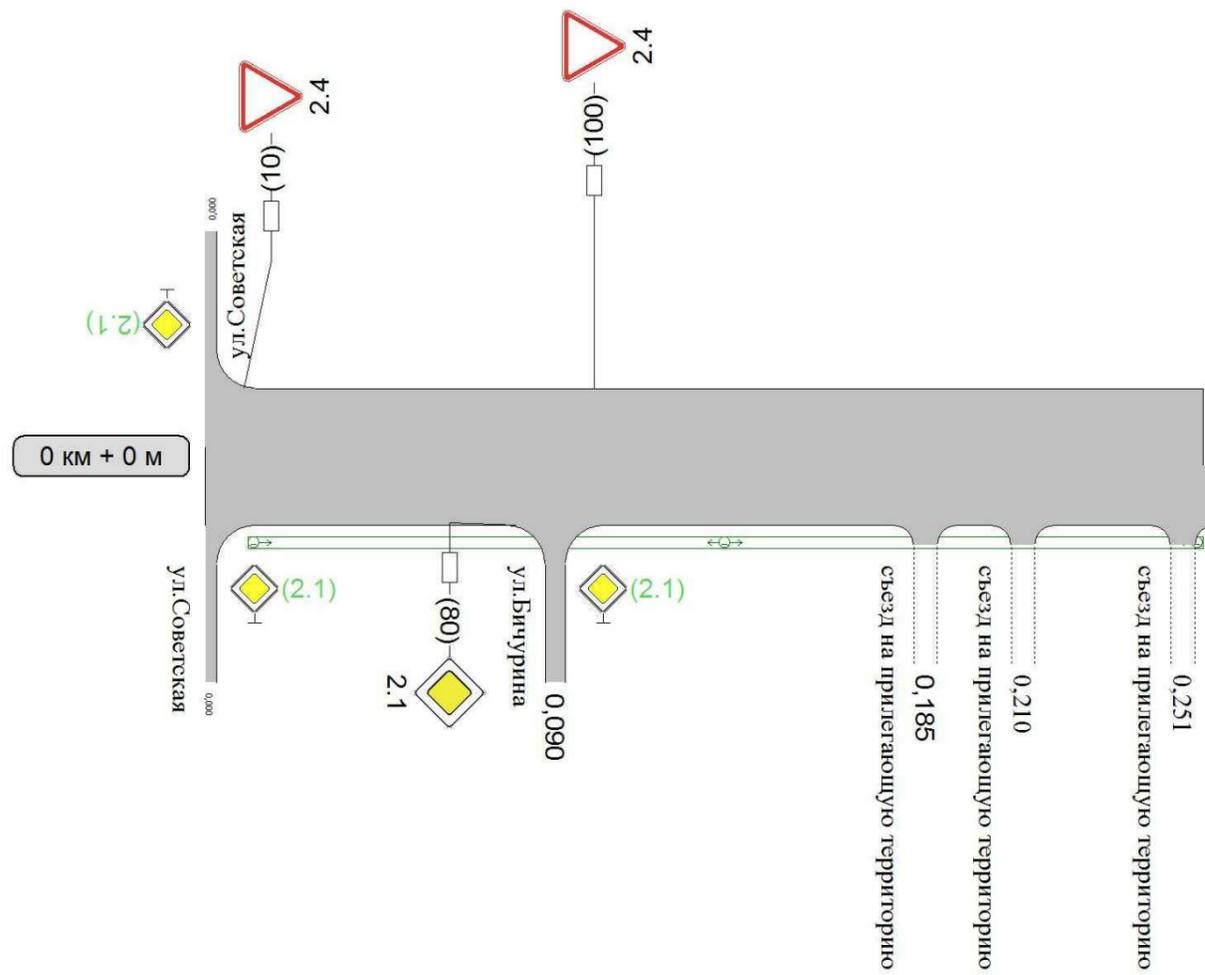

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001894 - с.Захаровское ул.Новая

Участок: 0,000 - 0,256 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+080	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+090	требуется установить	1	съезд справа	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+100	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							6		
Итого:							6		
Всего установлено:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							6		
Всего:							6		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001894 - с.Захаровское ул.Новая

Участок: 0,000 - 0,256 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.4	Уступите дорогу	2
	Итого для группы	3
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001894 - с.Захаровское ул.Новая


Участок: 0,000 - 0,256 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+011	0+256		3/3	245	0	245	Справа
Итого:				3/3	245	0	245	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.СОВЕТСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**




ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.СОВЕТСКАЯ

1. Улица Советская имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Советская составляет 750 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,750).
3. Ширина проезжей части составляет 6 м.
4. По ул.Советская осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Советская установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Советская отсутствуют
7. Светофорные объекты на ул.Советская отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (адм.территориальный район)	с.Захаровское ул.Советская
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:
 1.1 : 90 м
 1.5 : 210 м
 1.6 : 135 м

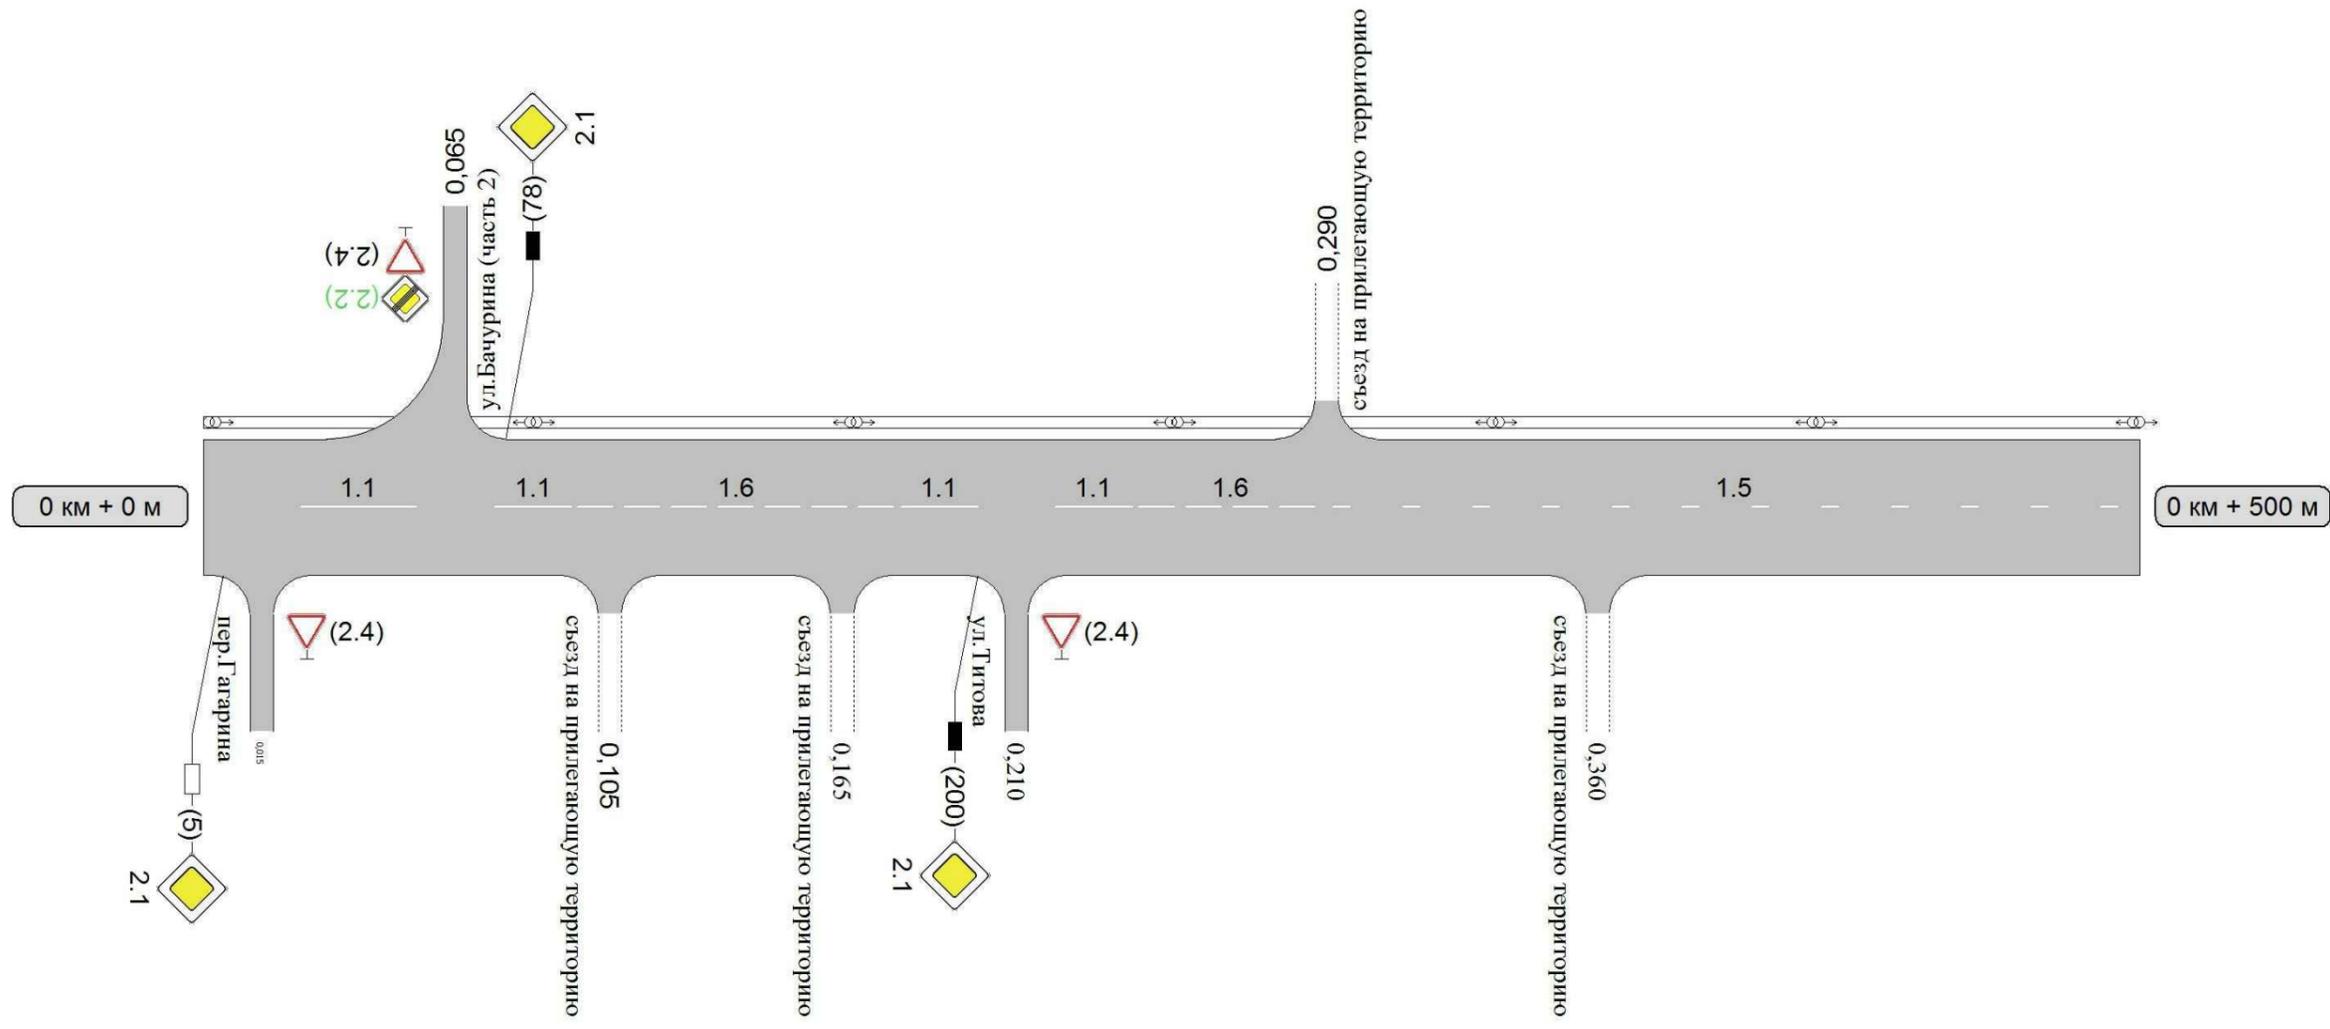


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1	1.1	1.6	1.1	1.1	1.6	1.5
	1-ая от осевой	25 - 55	75 - 95	95 - 180	180 - 200	220 - 240	240 - 290	290 - 500
Тротуары справа	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (административный район)	с.Захаровское ул.Советская		
Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане	500		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		

Разметка на участке:
1.1 : 19 м
1.5 : 180 м
1.6 : 40 м

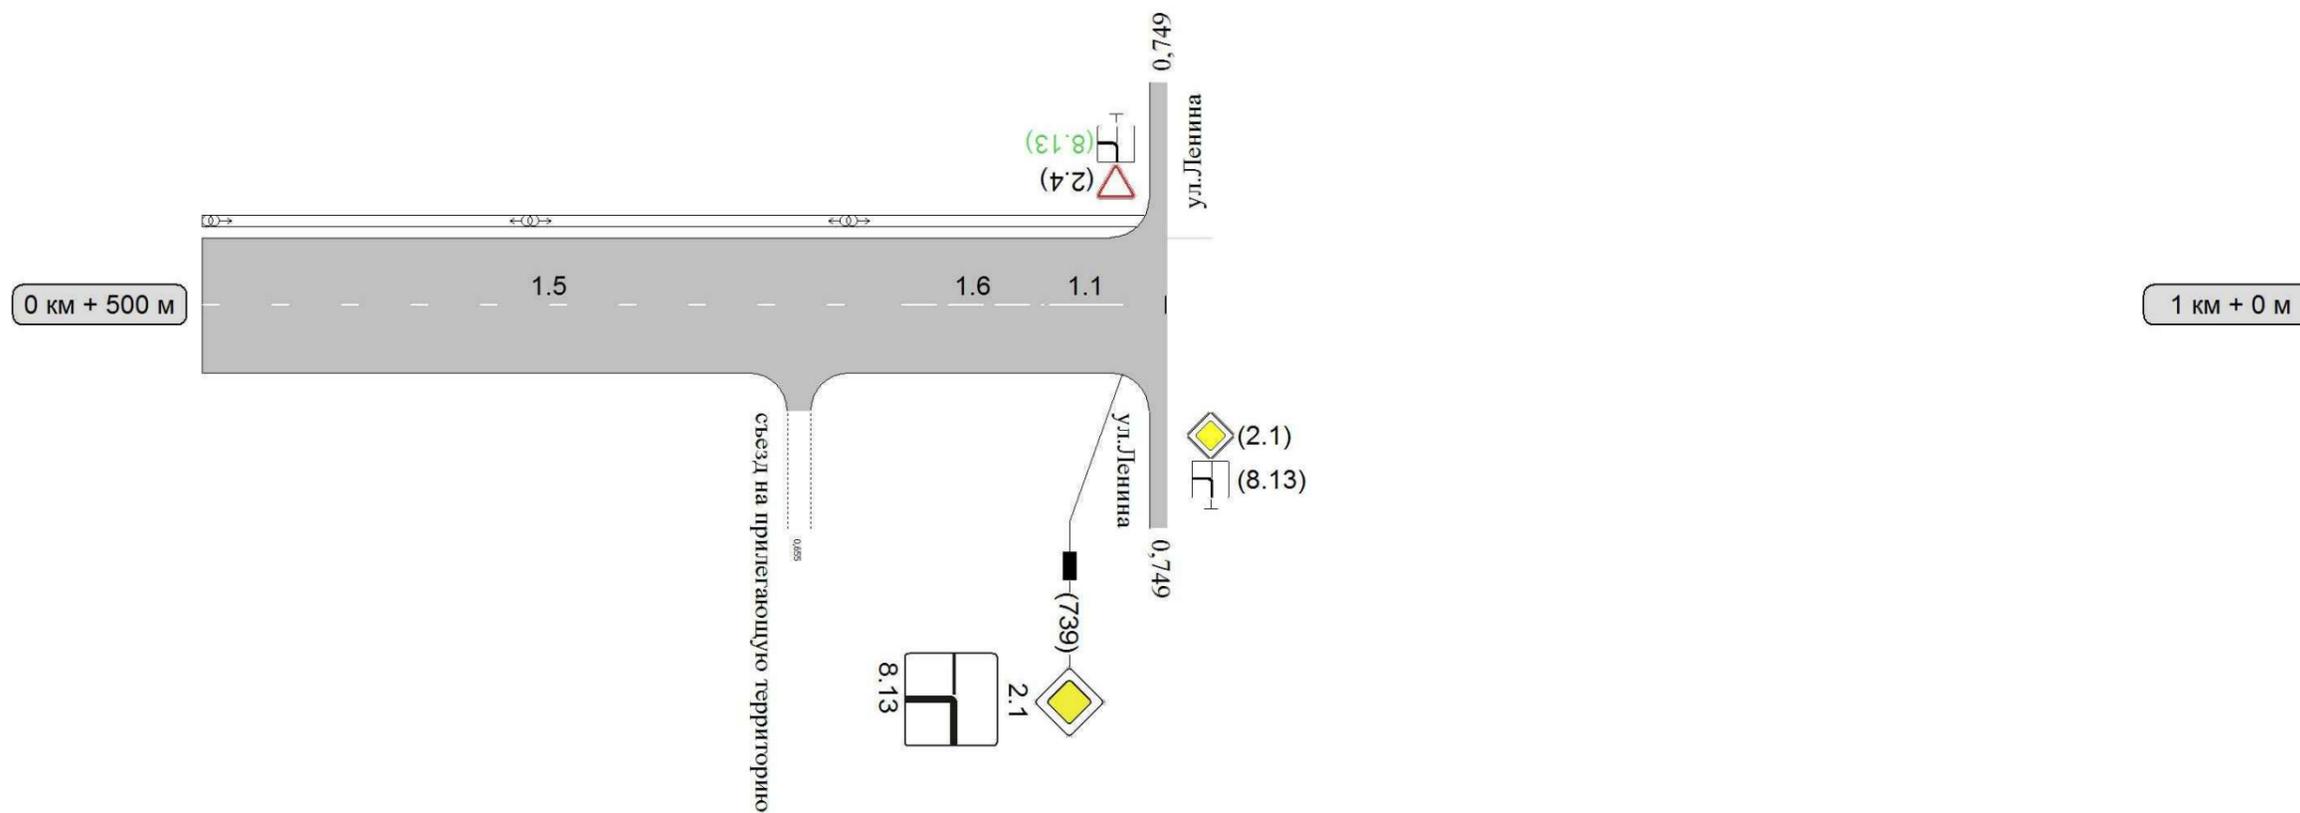

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 500 - 680	1.6 680 - 720	1.1 720 - 739	
	1-ая от осевой				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа					

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001898 - с.Захаровское ул.Советская
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Мест ора споло жение	Мес т ора споло жение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	требуется установить	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+078	установлено	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+200	установлено	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+739	установлено	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+749	установлено	1	съезд справа	
6	2.2	Конец главной дороги	2		0+065	требуется установить	1		съезд слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	установлено	1	съезд справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	установлено	1		съезд слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	установлено	1	съезд справа	
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+749	установлено	1		съезд слева
		Итого установлено:					8		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					10		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+739	установлено	1	справа	
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+749	установлено	1	съезд справа	
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+749	требуется установить	1		съезд слева
		Итого установлено:					2		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					1		
		Итого:					3		
		Всего установлено:					10		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					3		
		Всего:					13		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

35

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: 0001898 - с.Захаровское ул.Советская

Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	Итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.25	0.75	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	
0.75	0+750	109,00	390,00	175,00	33,77
ИТОГО:		109,00	390,00	175,00	33,77
ЛИН.КМ.		0,11	0,39	0,17	0,00
ПРИВЕД.КМ.		0,11	0,10	0,13	0,00
ПЛОЩАДЬ		10,90	9,75	13,13	33,77

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001898 - с.Захаровское ул.Советская

Участок: 0,000 - 0,750 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость объемов работ по нанесению разметки

Дорога: 0001898 - с.Захаровское ул.Советская



Участок: 0,000 - 0,750 км.

Обозначение	Количество, км	Количество, шт
1.1	0,109	0
1.5	0,390	0
1.6	0,175	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ТИТОВА
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

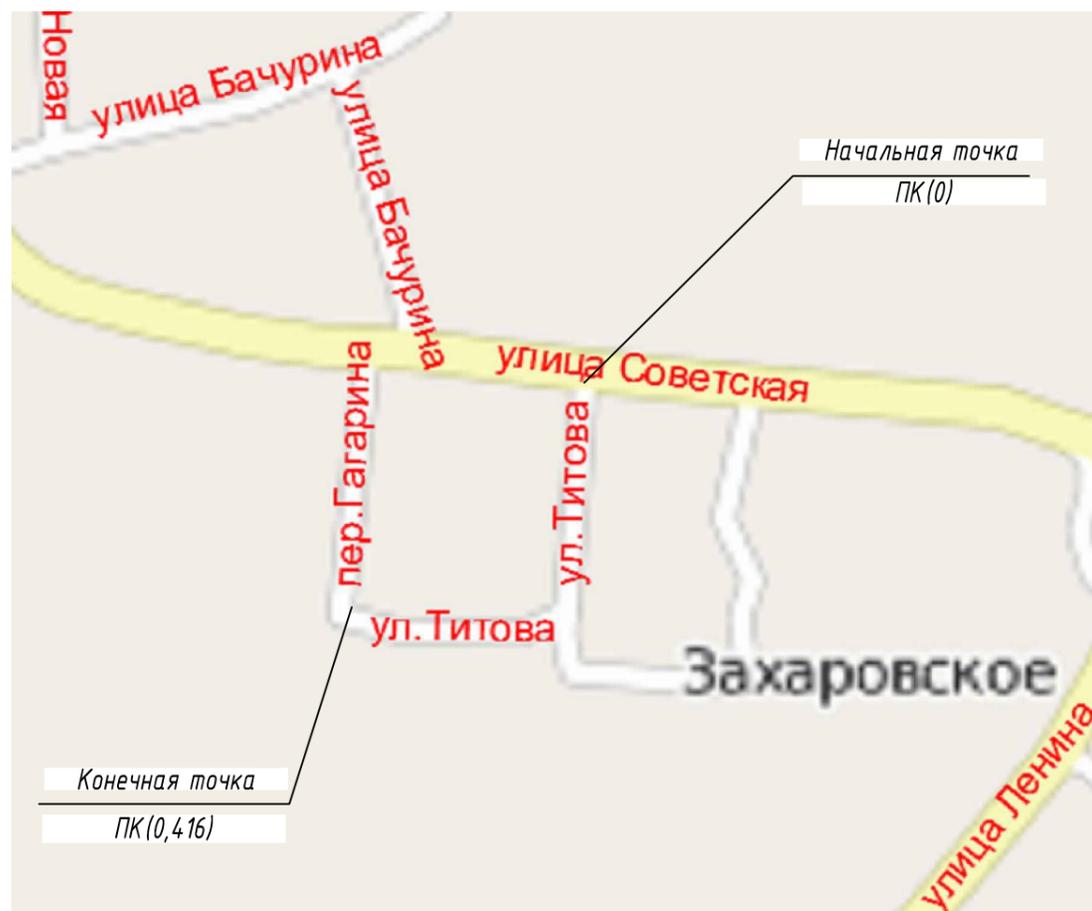


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ТИТОВА

1. Улица Титова имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Титова составляет 416 м.
Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Титова и ул.Советская. Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,416).
3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
4. По ул.Титова осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Титова установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Титова отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Титова отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (адм. - элементы дороги)	с.Захаровское ул.Титова
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

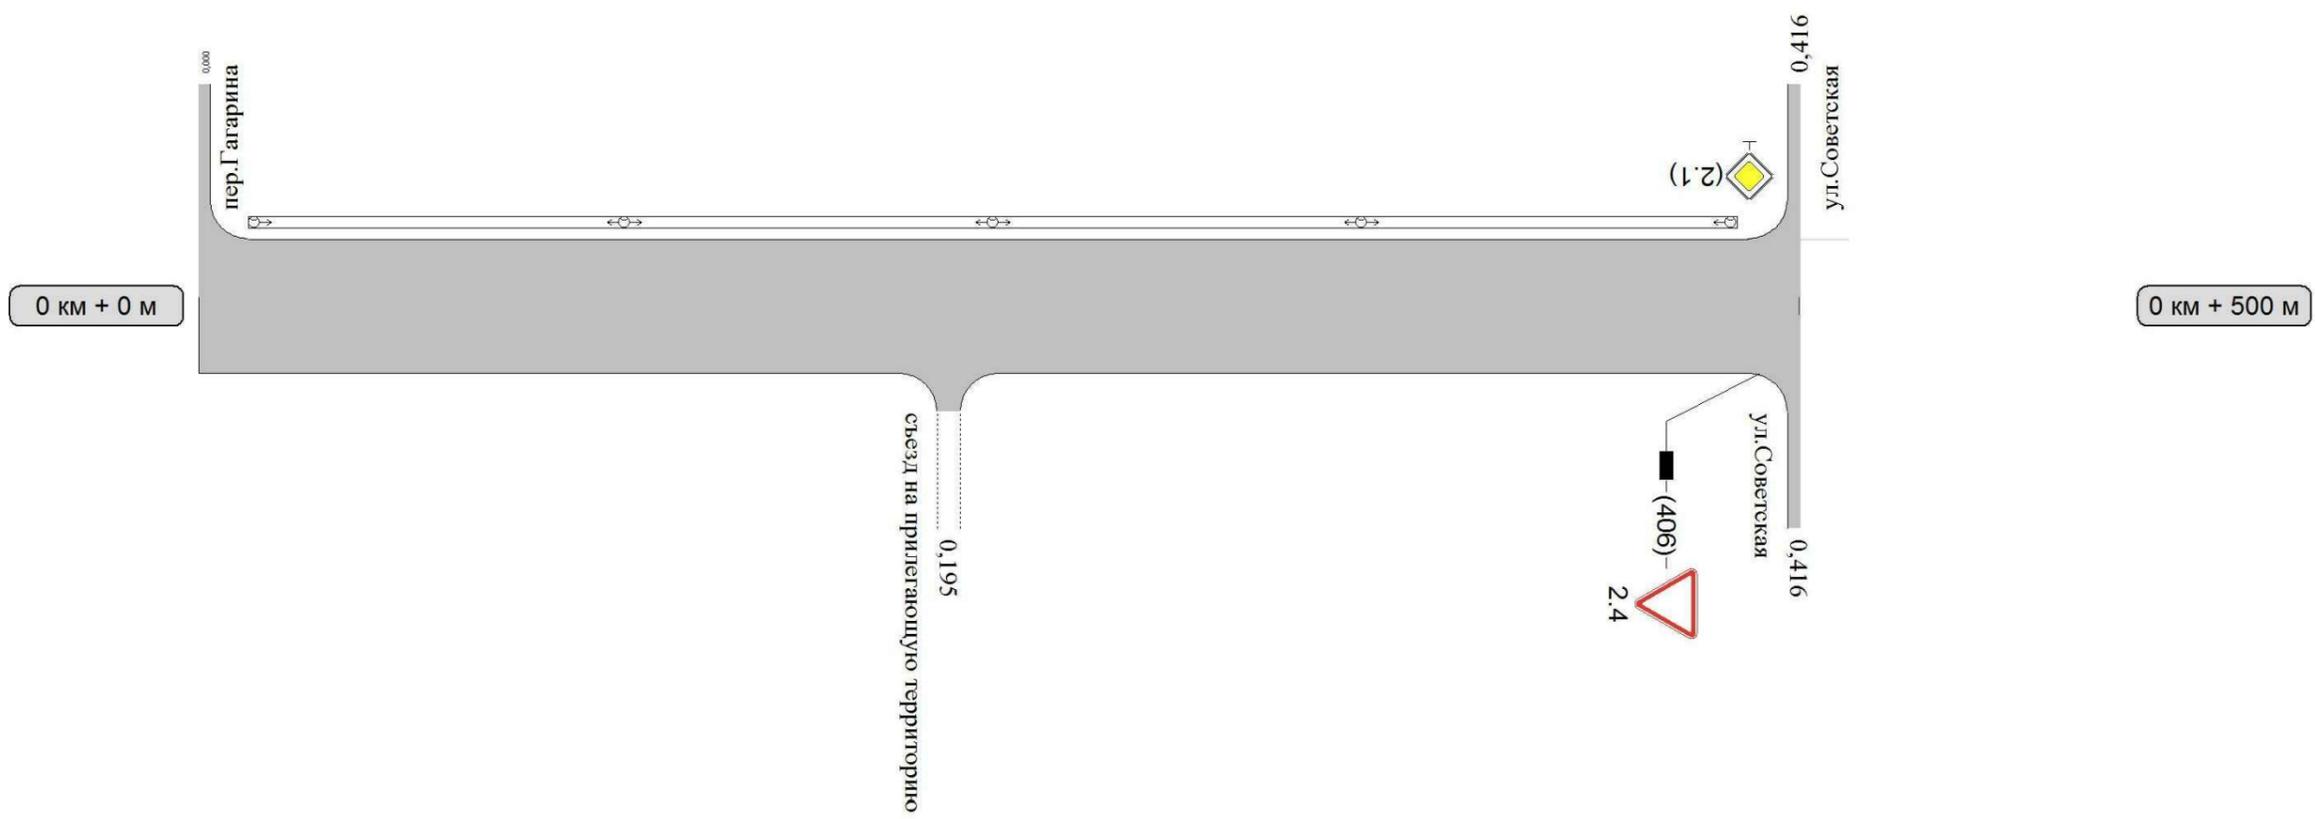

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-ая от осевой
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001899 - с.Захаровское ул.Титова

Участок: 0,000 - 0,416 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+416	установлено	1		съезд слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+406	установлено	1	справа	
		Итого установлено:					2		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					0		
		Итого:					2		
		Всего установлено:					2		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					0		
		Всего:					2		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001899 - с.Захаровское ул.Титова


Участок: 0,000 - 0,416 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
	Итого для группы	0
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ с.ШИЛКИНСКОЕ

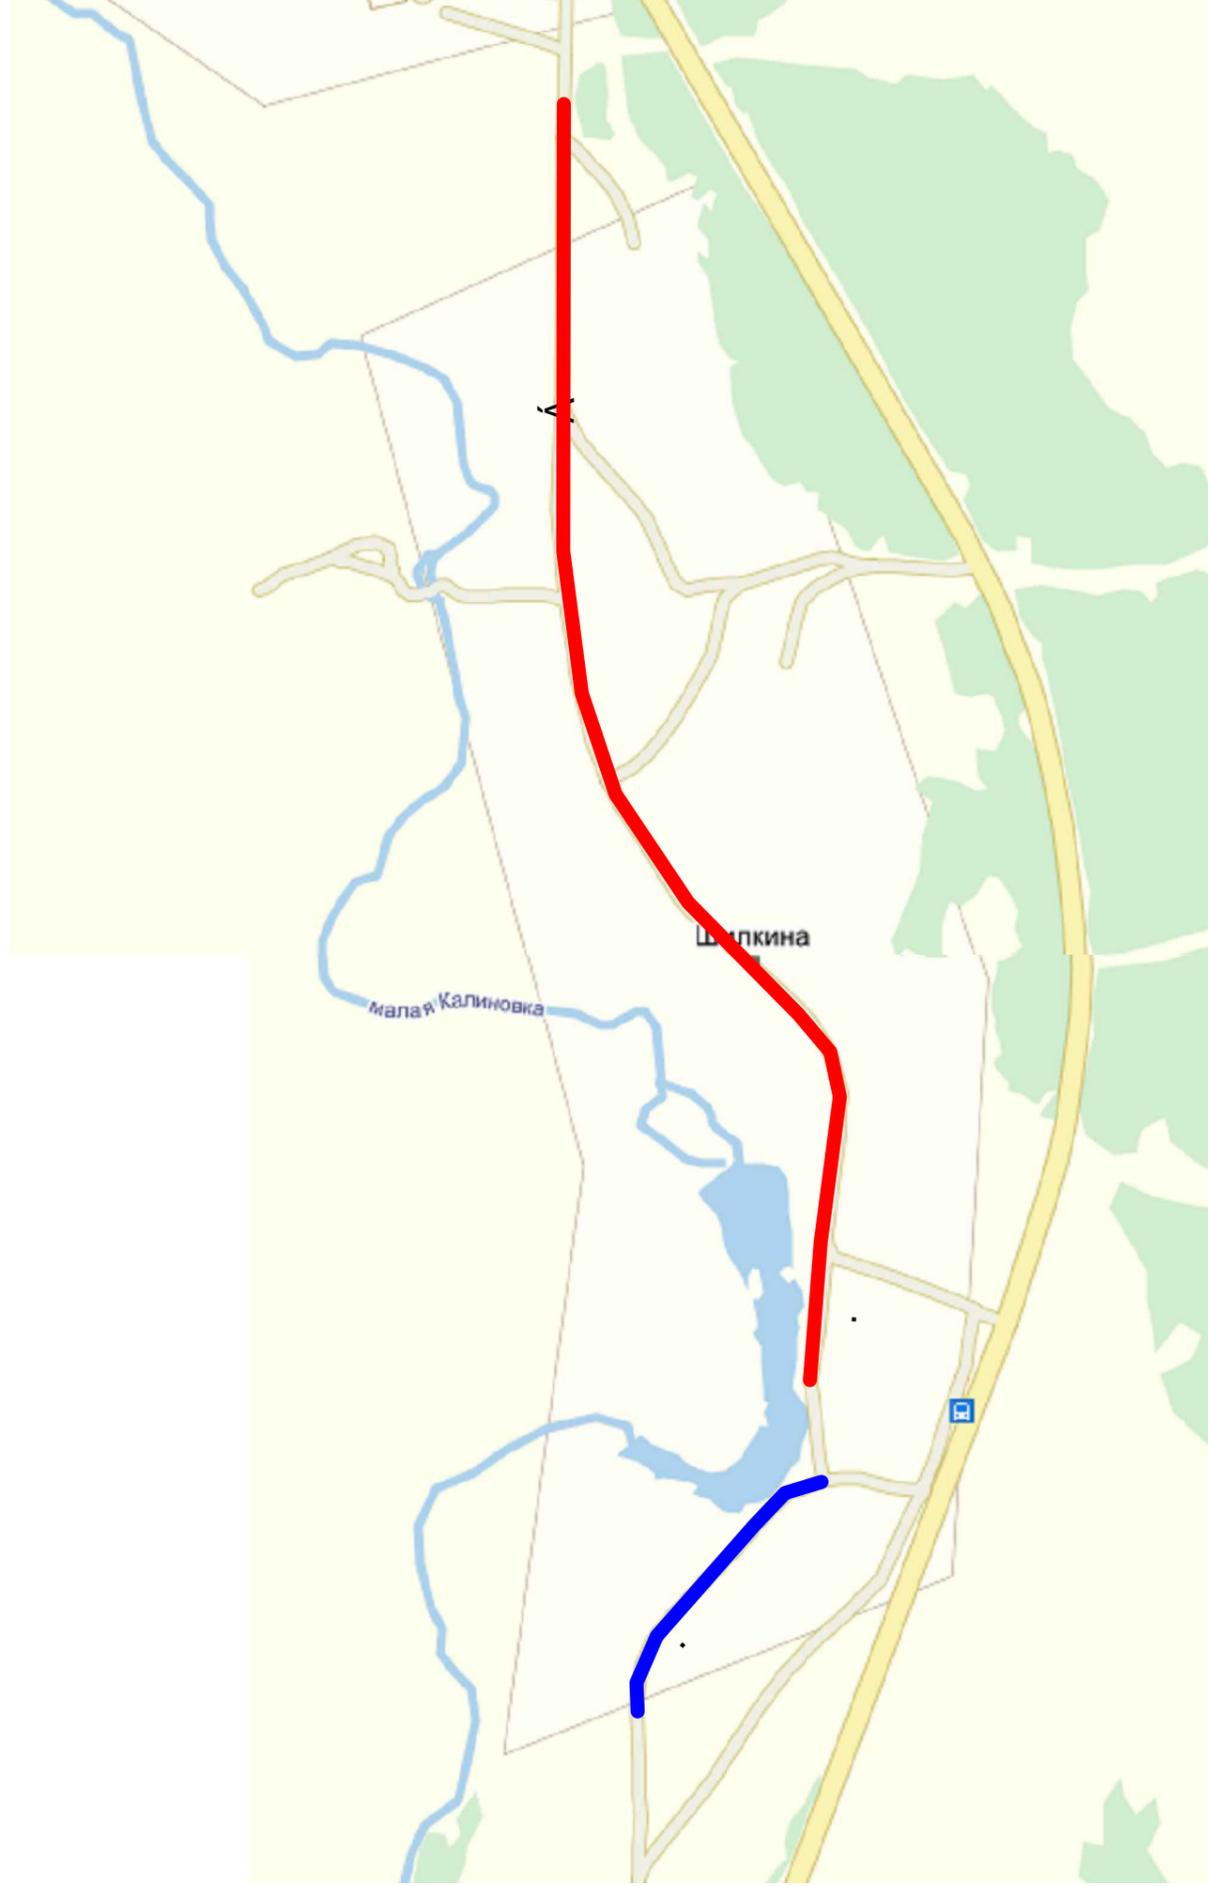


Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВОГО СП

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ЛЕНИНА часть1
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ЛЕНИНА часть1




1. Улица Ленина часть1 имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Ленина часть1 составляет 1607 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (1,607).
3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.
4. По ул.Ленина часть1 осуществляется движение:
 - легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Ленина часть1 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Ленина часть1 отсутствуют
7. Светофорные объекты на ул.Ленина часть1 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (адм. элемент район)	с.Шилкинское ул.Ленина (часть 1)
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

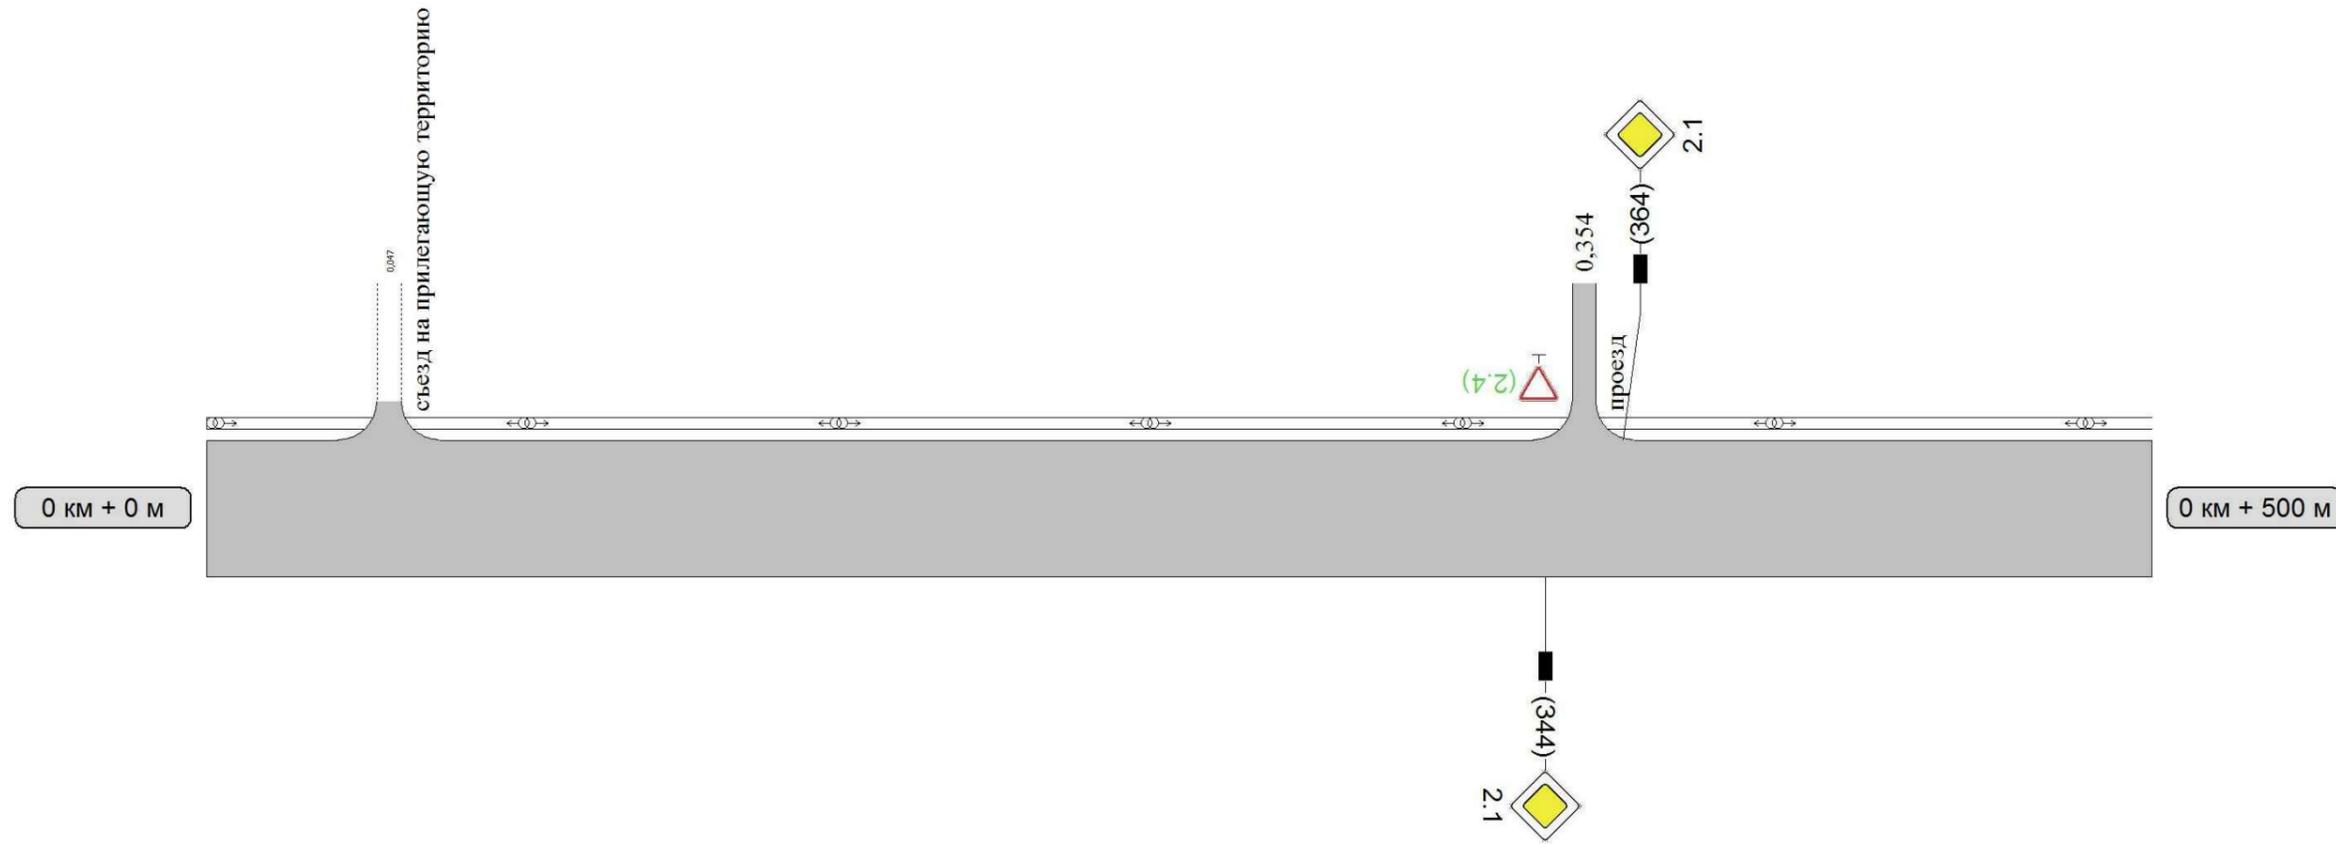


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм. элементы района)	с.Шилкинское ул.Ленина (часть 1)	
Элементы дороги в продольном профиле	500	
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

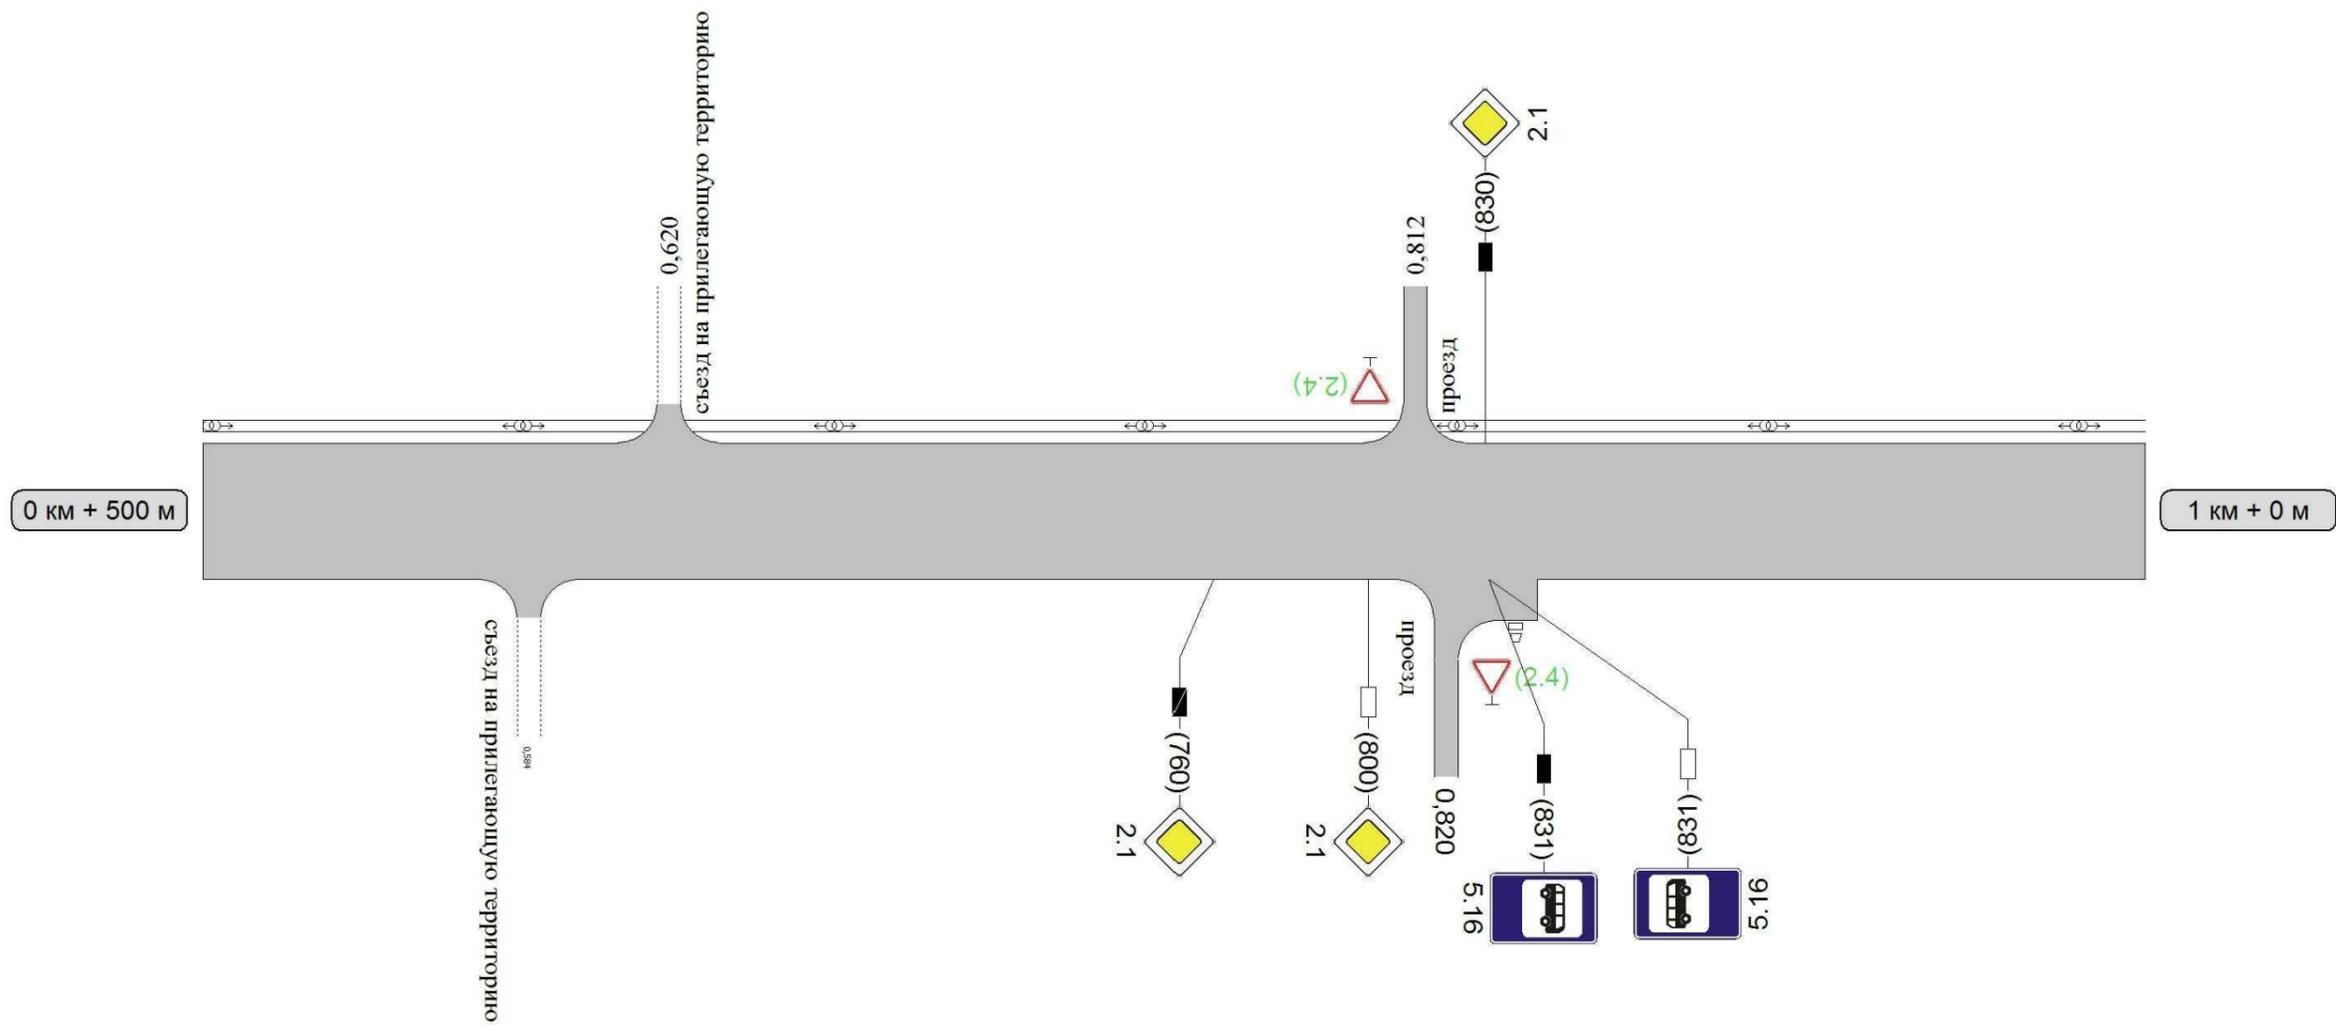


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм. район)	с.Шилкинское ул.Ленина (часть 1)
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

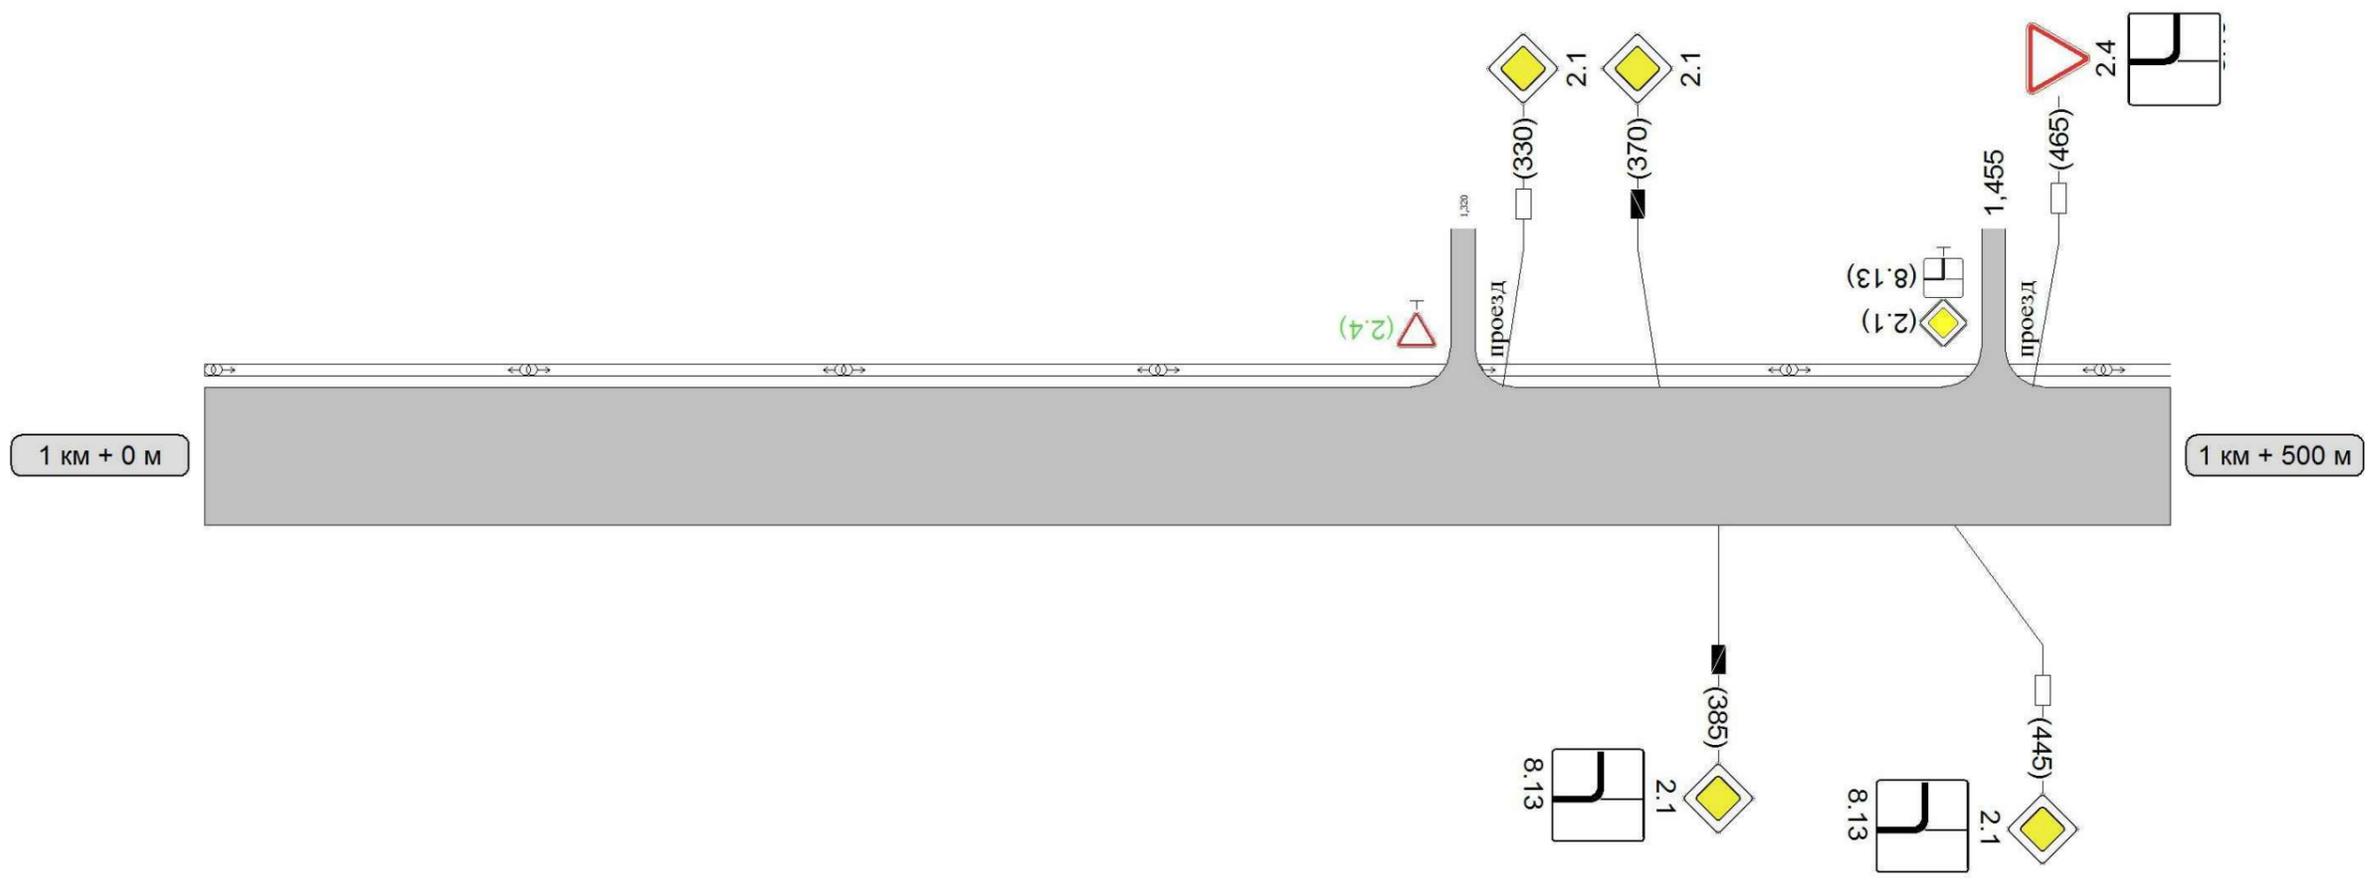

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм.территориальный район)	с.Шилкинское ул.Ленина (часть 1)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001889 - с.Шилкинское ул.Ленина (часть 1)

Участок: 0,000 - 1,607 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+344	установлено	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+364	установлено	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+760	демонтировать	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+800	требуется установить	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+830	установлено	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		1+330	требуется установить	1		слева
7	2.1	Главная дорога	2		1+370	демонтировать	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		1+385	демонтировать	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		1+445	требуется установить	1	справа	
10	2.1	Главная дорога	2		1+455	установлено	1		съезд слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+354	требуется установить	1		съезд слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+812	требуется установить	1		съезд слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+820	требуется установить	1	съезд справа	
14	2.4	Уступите дорогу	2		1+320	требуется установить	1		съезд слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		1+465	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							4		
Итого демонтировать:							3		
Итого требуется:							8		
Итого:							12		
Запрещающие знаки									
16	3.1	Въезд запрещен	2		1+607	установлено	1	справа	
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							1		
Знаки особых предписаний									
17	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+831	требуется установить	1	справа	
18	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+831	установлено	1	справа	
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							2		
Знаки дополнительной информации(таблички)									
19	8.13	Направление главной дороги	2		1+455	установлено	1		съезд слева
20	8.13	Направление главной дороги	2		1+385	демонтировать	1	справа	
21	8.13	Направление главной дороги	2		1+445	требуется установить	1	справа	
22	8.13	Направление главной дороги	2		1+465	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							1		
Итого требуется:							2		
Итого:							3		
Всего установлено:							7		
Всего демонтировать:							4		
Всего требуется установить:							11		
Всего:							18		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

46

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001889 - с.Шилкинское ул.Ленина (часть 1)

Участок: 0,000 - 1,607 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	3
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	4
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1
	Итого для группы	1
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	2

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

47

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ЛЕНИНА часть2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ЛЕНИНА часть2




1. Улица Ленина часть2 имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Ленина часть2 составляет 430 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,430).
3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.
4. По ул.Ленина часть2 осуществляется движение:
 - легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Ленина часть2 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Ленина часть2 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Ленина часть2 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Шилкинское ул.Ленина (часть 2)
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

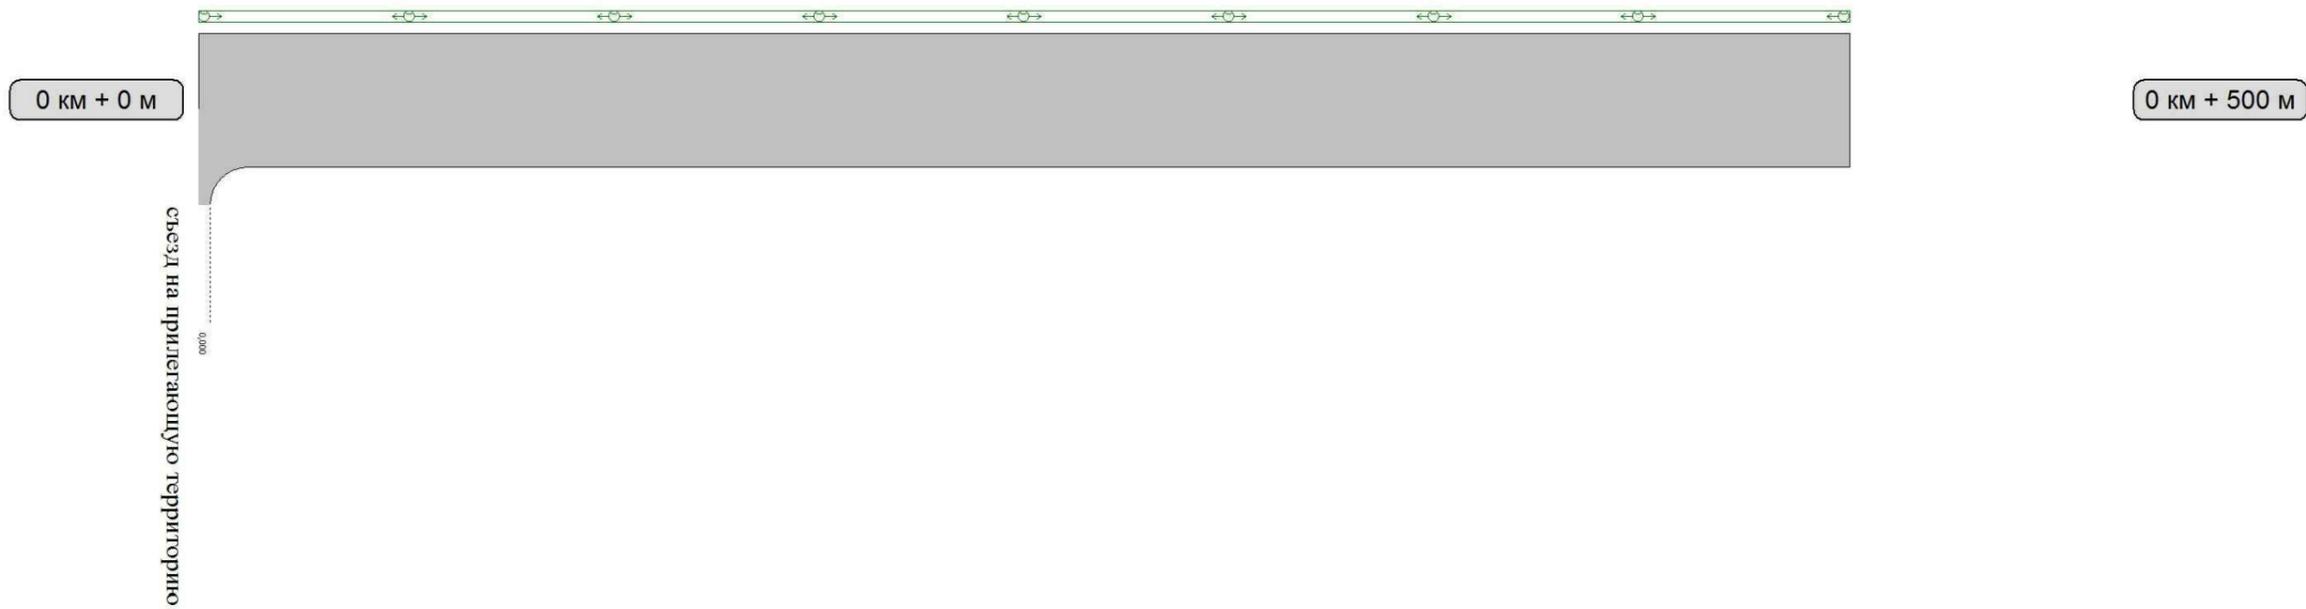

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001890 - с.Шилкинское ул.Ленина (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+430		9/9	430	0	430	Слева
Итого:				9/9	430	0	430	


Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

50

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ д.КОЛЯСНИКОВА

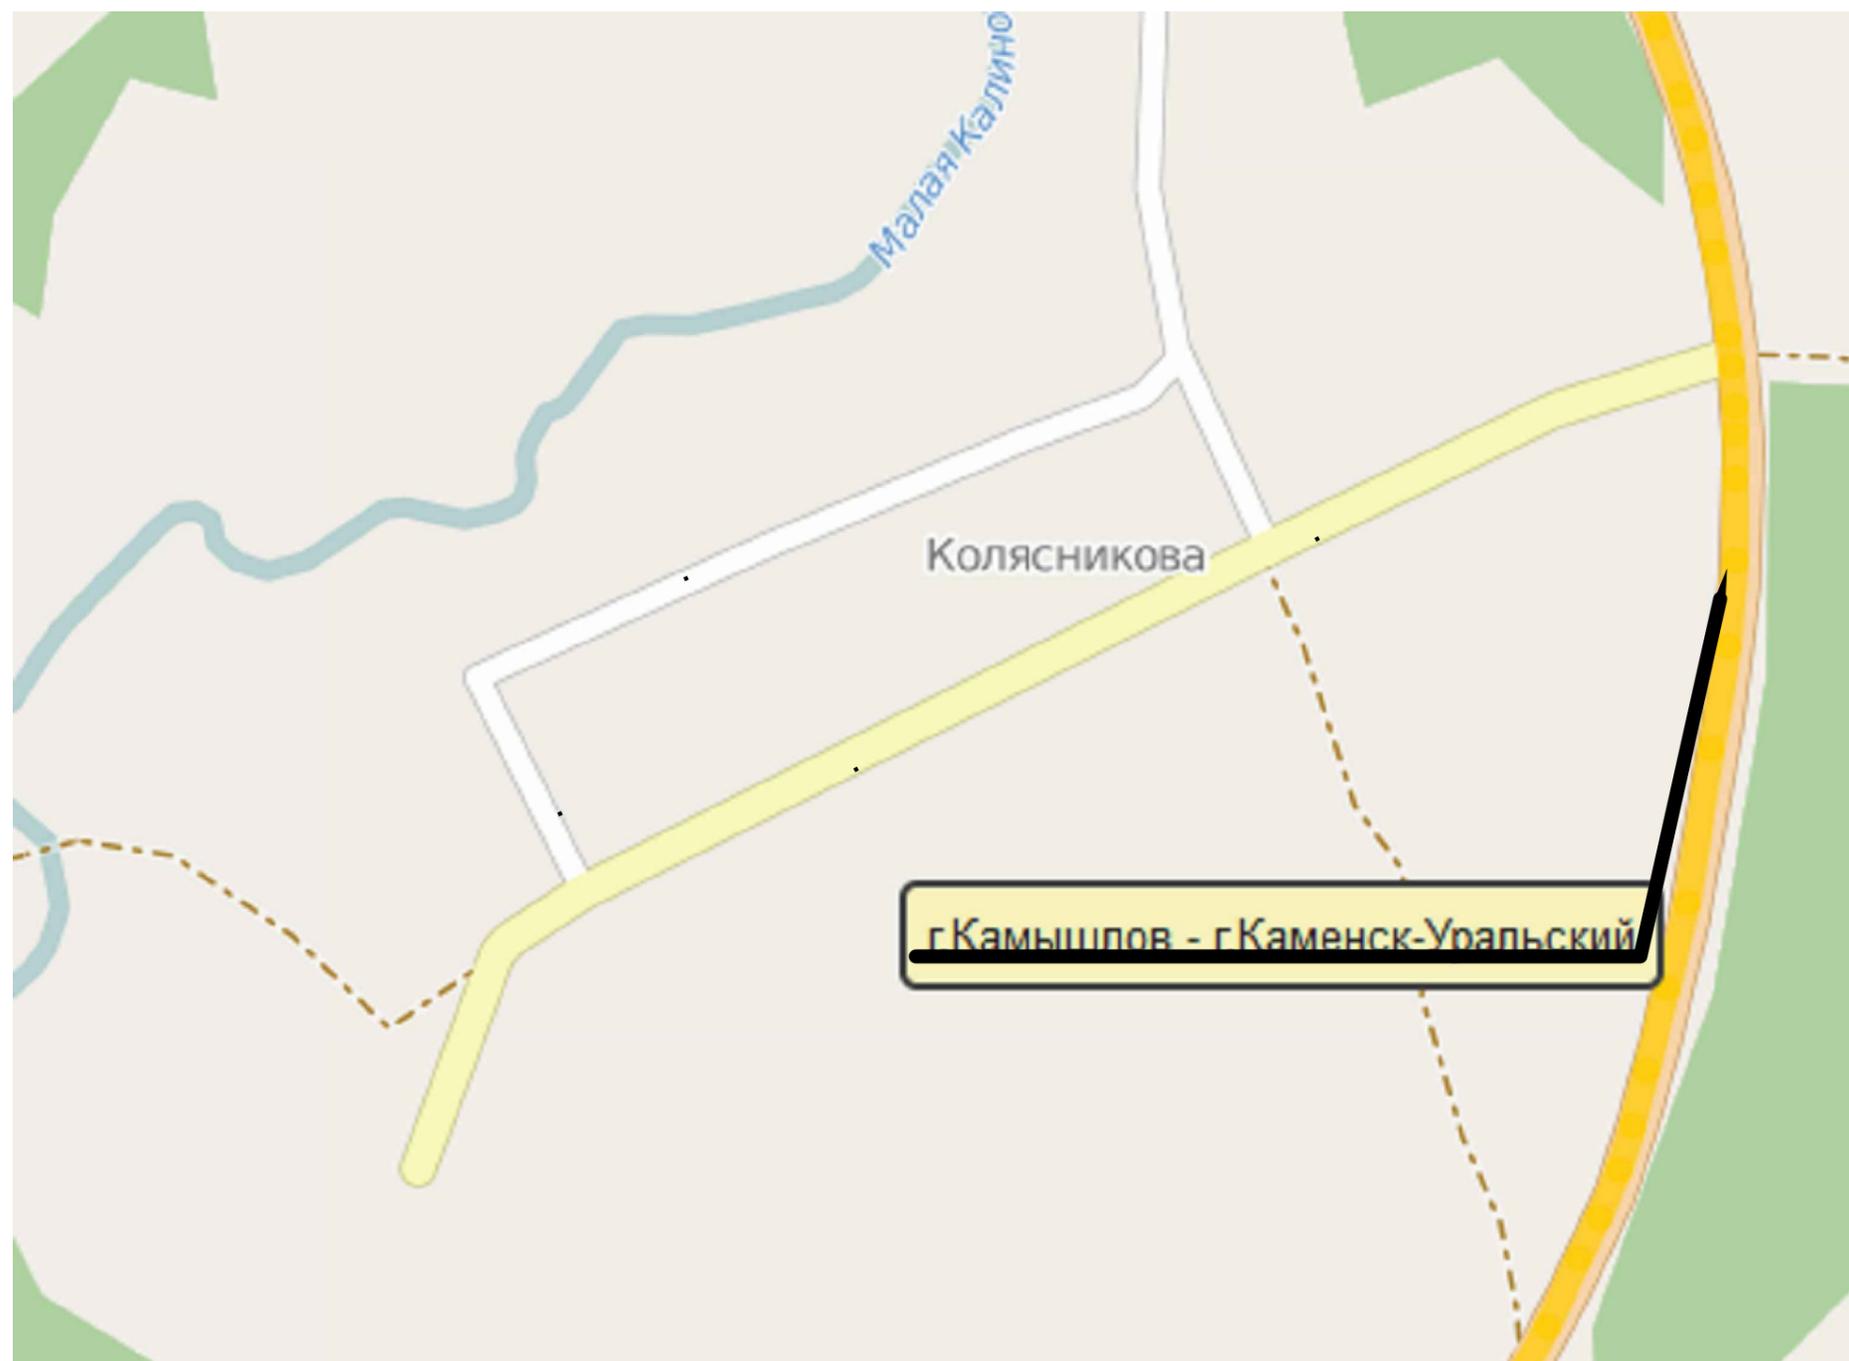


Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВОГО СП

Лист 51

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.КЛЮЧЕВАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.КЛЮЧЕВАЯ



1. Улица Ключевая имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул.Ключевая составляет 766 м.

Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,766).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

4. По ул.Ключевая осуществляется движение :

- легкового транспорта ;
- грузового транспорта ;
- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Ключевая установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .


6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Ключевая отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.Ключевая отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (адм. муниципальный район)	д.Колясникова ул.Ключевая
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

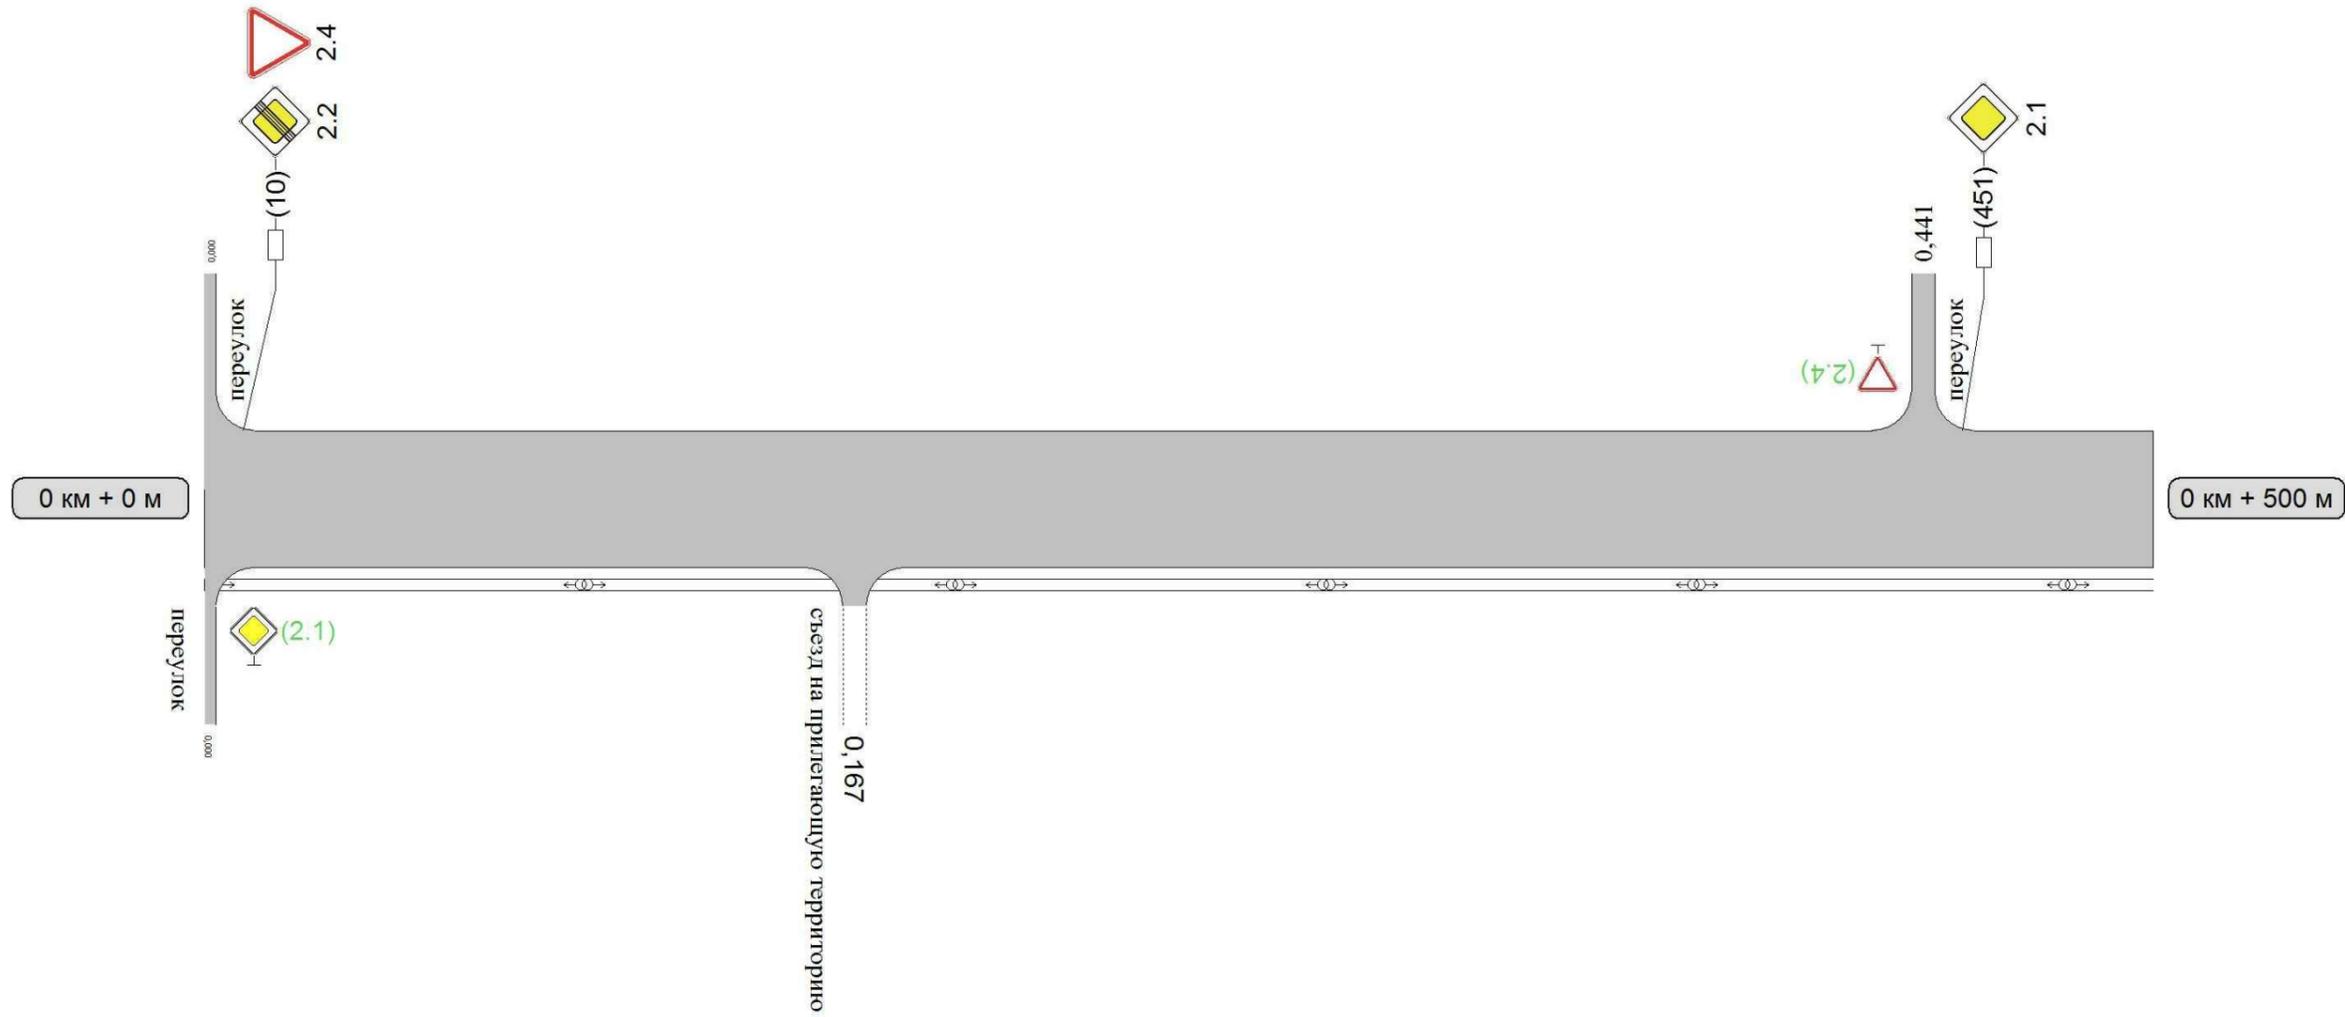

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (административный район)	д.Колясникова ул.Ключевая	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001892 - д.Колясникова ул.Ключевая

Участок: 0,000 - 0,766 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+451	требуется установить	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+610	требуется установить	1		слева
4	2.2	Конец главной дороги	2		0+010	требуется установить	1		слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+441	требуется установить	1		съезд слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+600	требуется установить	1		съезд слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					7		
		Итого:					7		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					7		
		Всего:					7		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001892 - д.Колясникова ул.Ключевая



Участок: 0,000 - 0,766 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	2
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	4
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

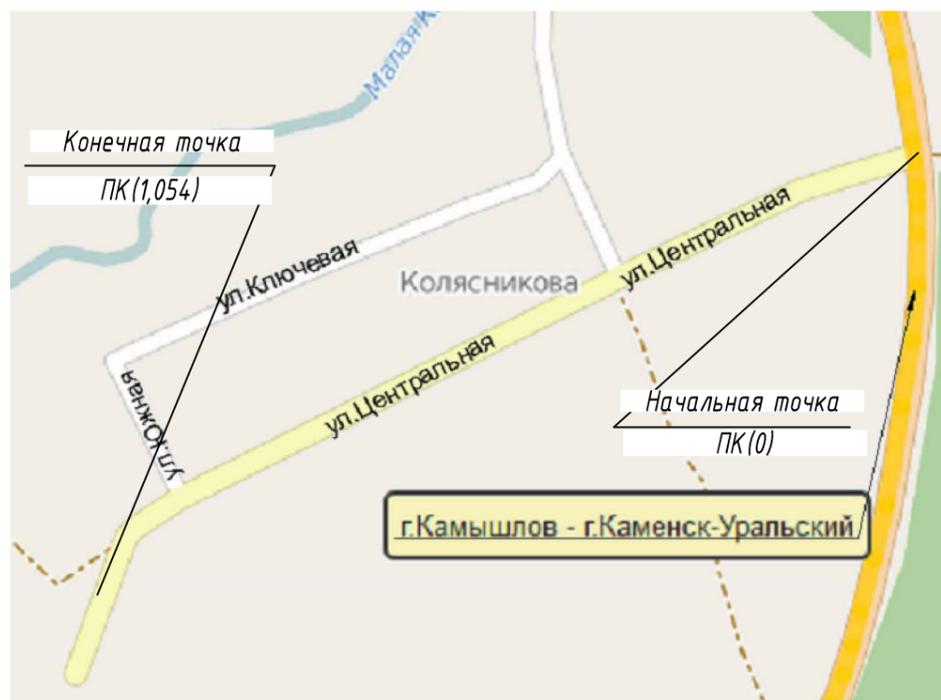

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ

1. Улица Центральная имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Центральная составляет 1054 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .40 лет Победы и ул.Строителей (часть 1). Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (1,054).

3. Ширина проезжей части составляет 5,7 м.

4. По ул.Центральная осуществляется движение :

- легкового транспорта ;
- грузового транспорта ;
- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Центральная установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .


6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Центральная отсутствуют

7. Светофорные объекты на ул.Центральная отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (адм. - территориальный район)	д.Колясников ул.Центральная	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

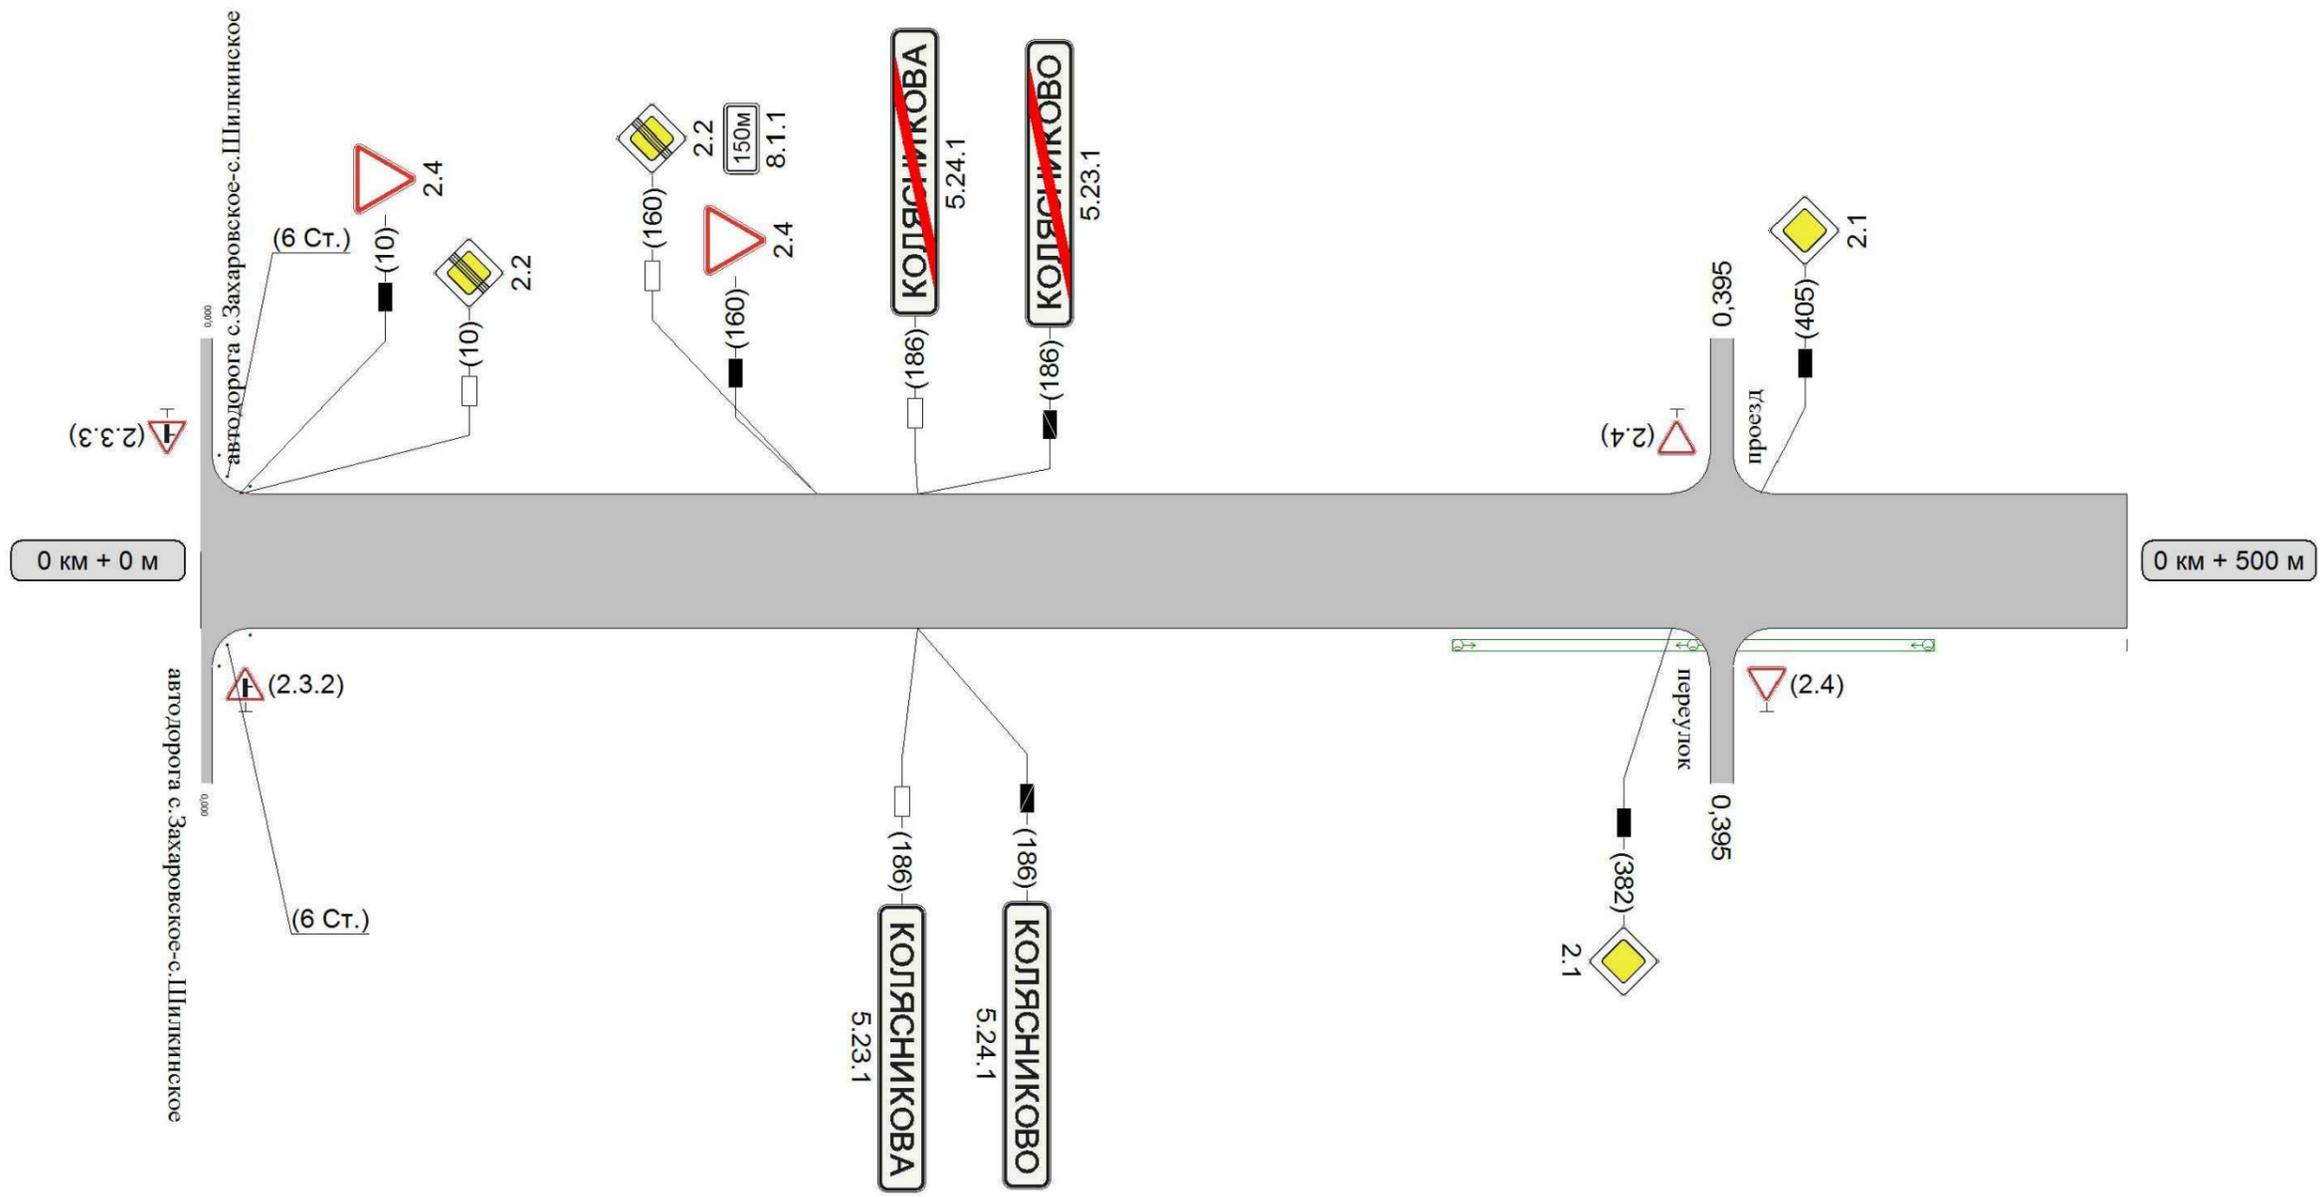


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Тротуары справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм. район)	д.Колясникова ул.Центральная	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

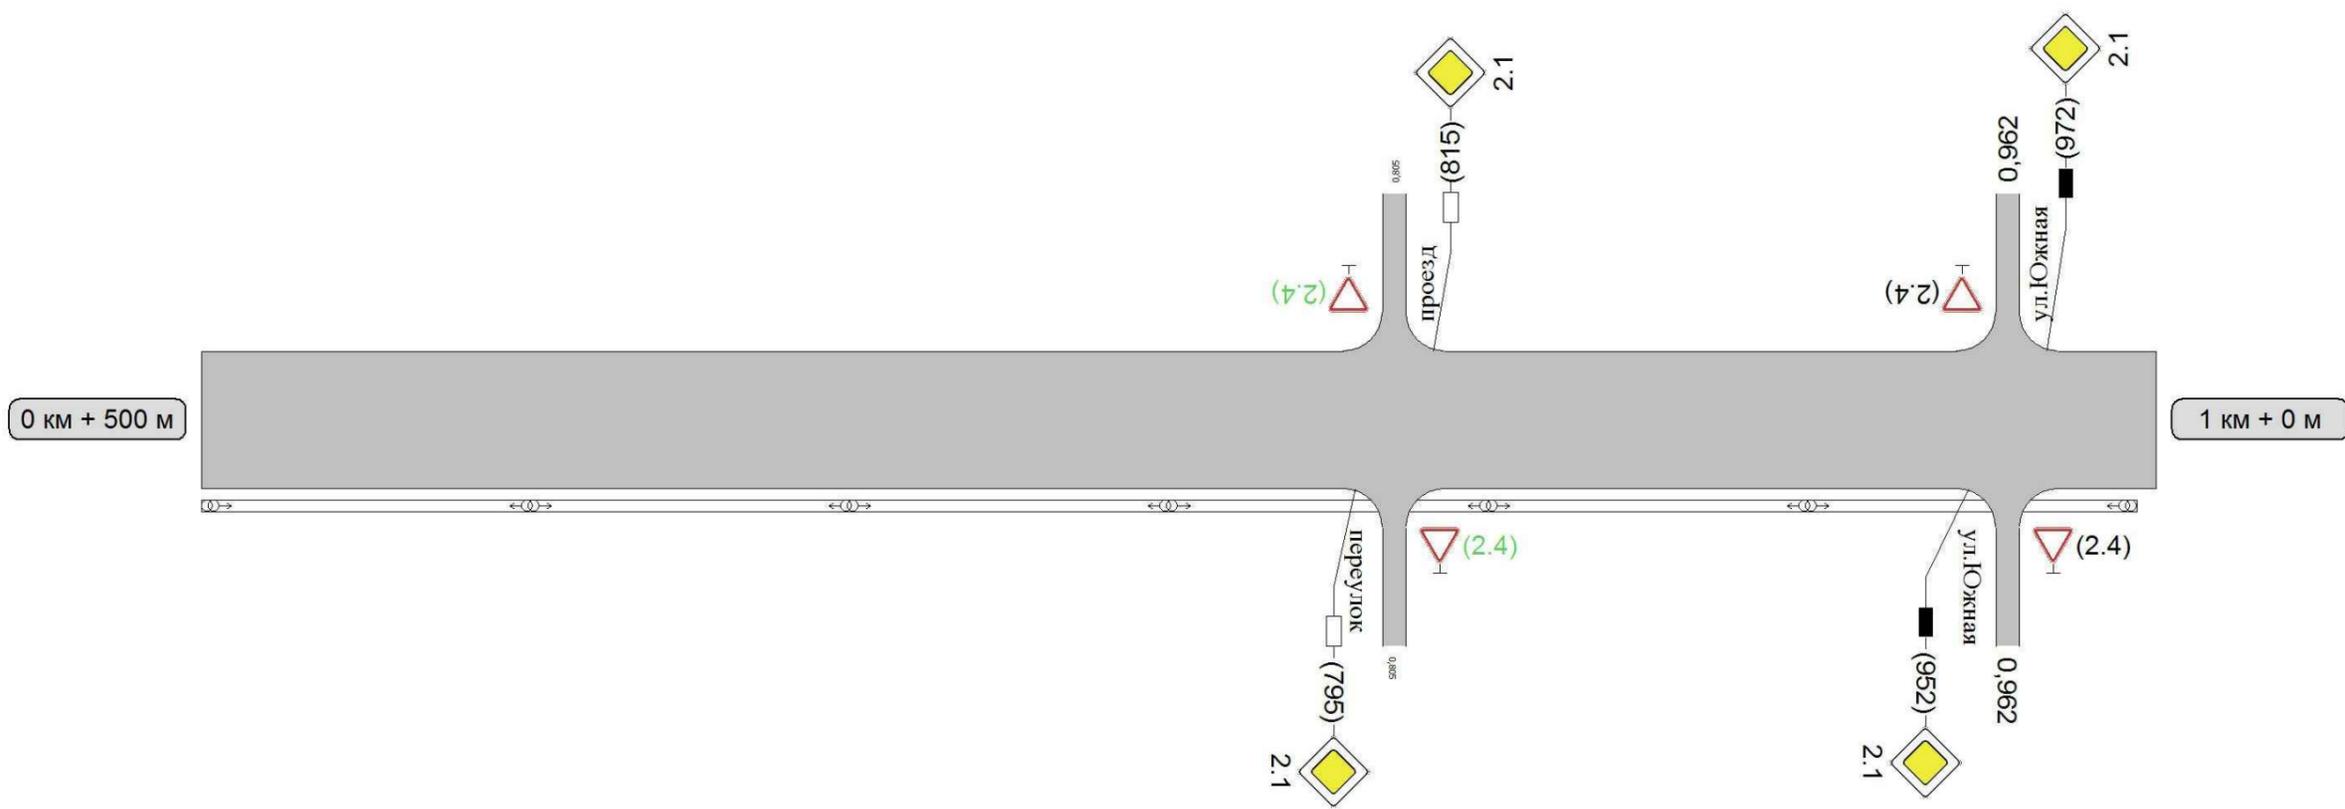

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм.территория, район)	д.Колясникова ул.Центральная
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001891 - д.Колясникова ул.Центральная

Участок: 0,000 - 1,054 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Мест ора спол о же ние	Ме ст ора спол о же ние
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+382	установлено	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+405	установлено	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+795	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+815	требуется установить	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+952	установлено	1	справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+972	установлено	1		слева
7	2.2	Конец главной дороги	2		0+010	требуется установить	1		слева
8	2.2	Конец главной дороги	2		0+160	требуется установить	1		слева
9	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
10	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		0+000	установлено	1		съезд слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	установлено	1		слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	установлено	1		съезд слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	установлено	1	съезд справа	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+805	требуется установить	1		съезд слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+805	требуется установить	1	съезд справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+962	установлено	1		съезд слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+962	установлено	1	съезд справа	
Итого установлено:							12		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							6		
Итого:							18		
Знаки особых предписаний									
19	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,96	0+186	демонтировать	1		слева
20	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,96	0+186	требуется установить	1	справа	
21	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,96	0+186	требуется установить	1		слева
22	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,96	0+186	демонтировать	1	справа	
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							2		
Итого требуется:							2		
Итого:							2		
Знаки дополнительной информации (таблички)									
23	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+160	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							1		
Всего установлено:							12		
Всего демонтировать:							2		
Всего требуется установить:							9		
Всего:							21		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001891 - д.Колясникова ул.Центральная
Участок: 0,000 - 1,054 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	2
2.2	Конец главной дороги	2
	Итого для группы	4
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
5.23.1	Начало населенного пункта	1
5.24.1	Конец населенного пункта	1
	Итого для группы	2
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.1.1	Расстояние до объекта	1
	Итого для группы	1

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001891 - д.Колясникова ул.Центральная
Участок: 0,000 - 1,054 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+325	0+450		3/3	125	0	125	Справа
Итого:				3/3	125	0	125	

Ведомость размещения сигнальных столбиков



Дорога: 0001891 - д.Колясникова ул.Центральная
Участок: 0,000 - 1,054 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			0/12	0/0	0/12			
1	0+003	0+003	0/6	0/0	0/6	Справа	Пластмасса	Пересечение
2	0+003	0+003	0/6	0/0	0/6	Слева	Пластмасса	Пересечение

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ЮЖНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

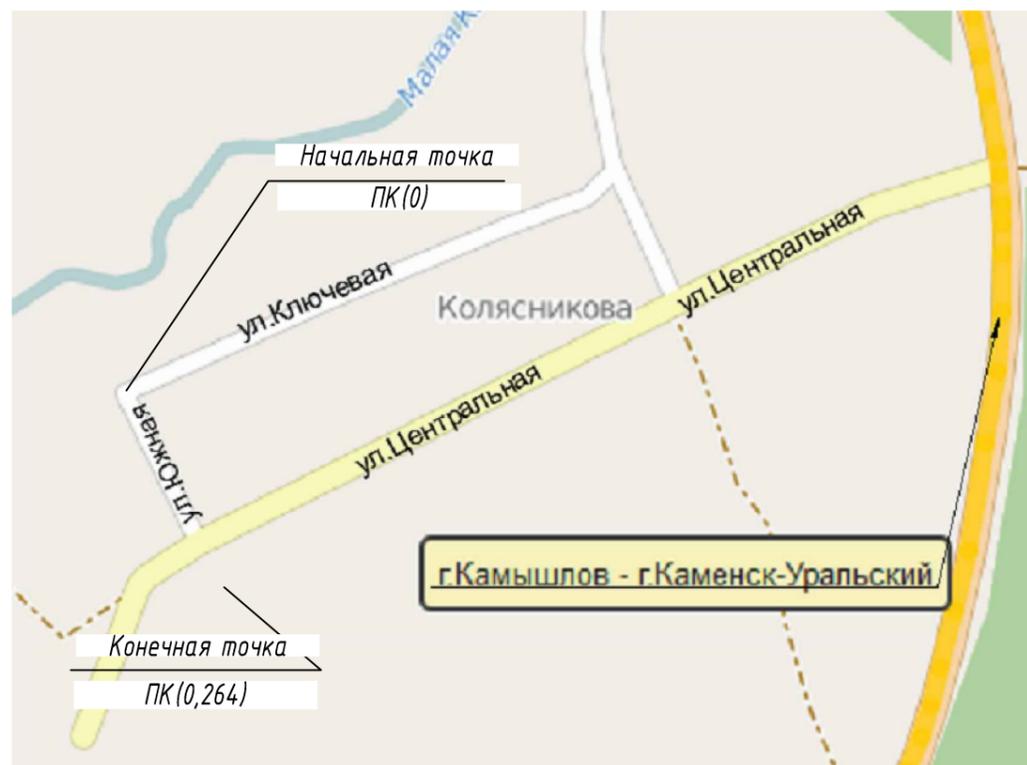


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ЮЖНАЯ

1. Улица Южная имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Южная составляет 264 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,264).
3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.
4. По ул.Южная осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Южная установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Южная отсутствуют
7. Светофорные объекты на ул.Южная отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	д. Колясникова ул. Южная	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

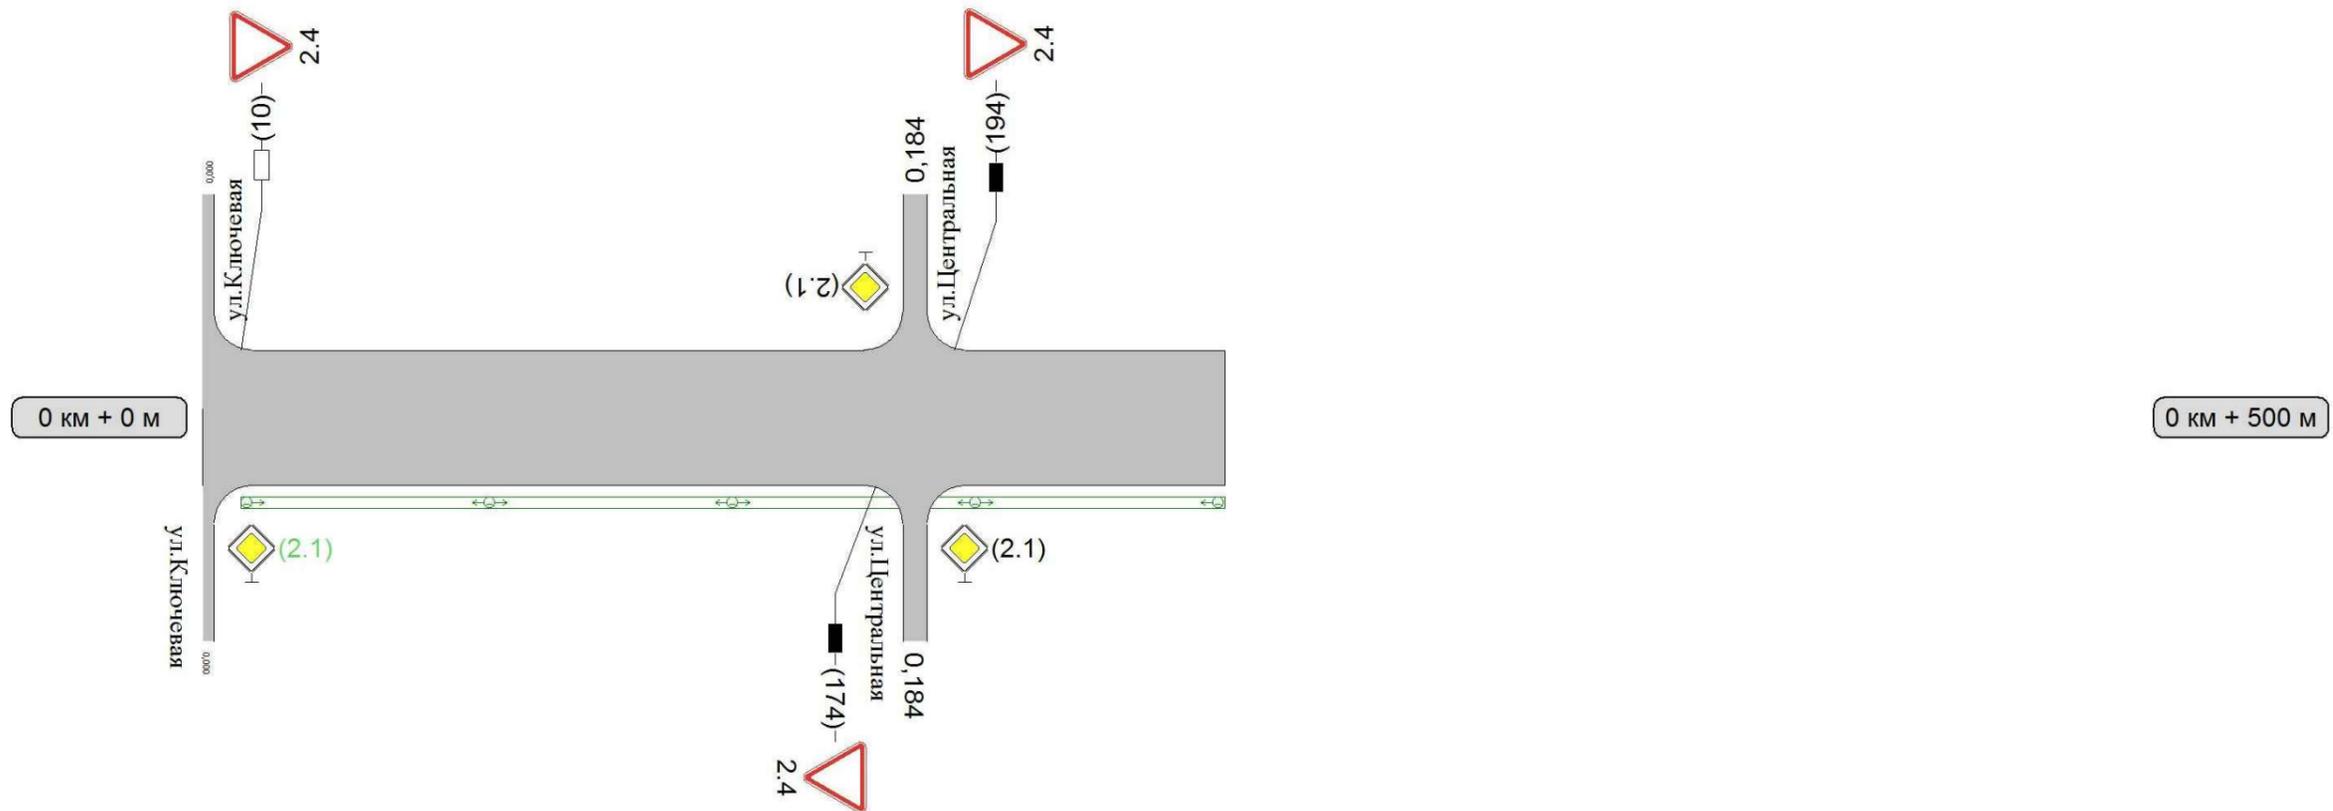

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001893 - д.Колясникова ул.Южная
Участок: 0,000 - 0,264 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+184	установлено	1		съезд слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+184	установлено	1	съезд справа	
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+174	установлено	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+194	установлено	1		слева
		Итого установлено:					4		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					6		
		Всего установлено:					4		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					2		
		Всего:					6		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001893 - д.Колясникова ул.Южная
Участок: 0,000 - 0,264 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0001893 - д.Колясникова ул.Южная
Участок: 0,000 - 0,264 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+010	0+264		5/5	254	0	254	Справа
Итого:				5/5	254	0	254	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ д.ШИПИЦИНА

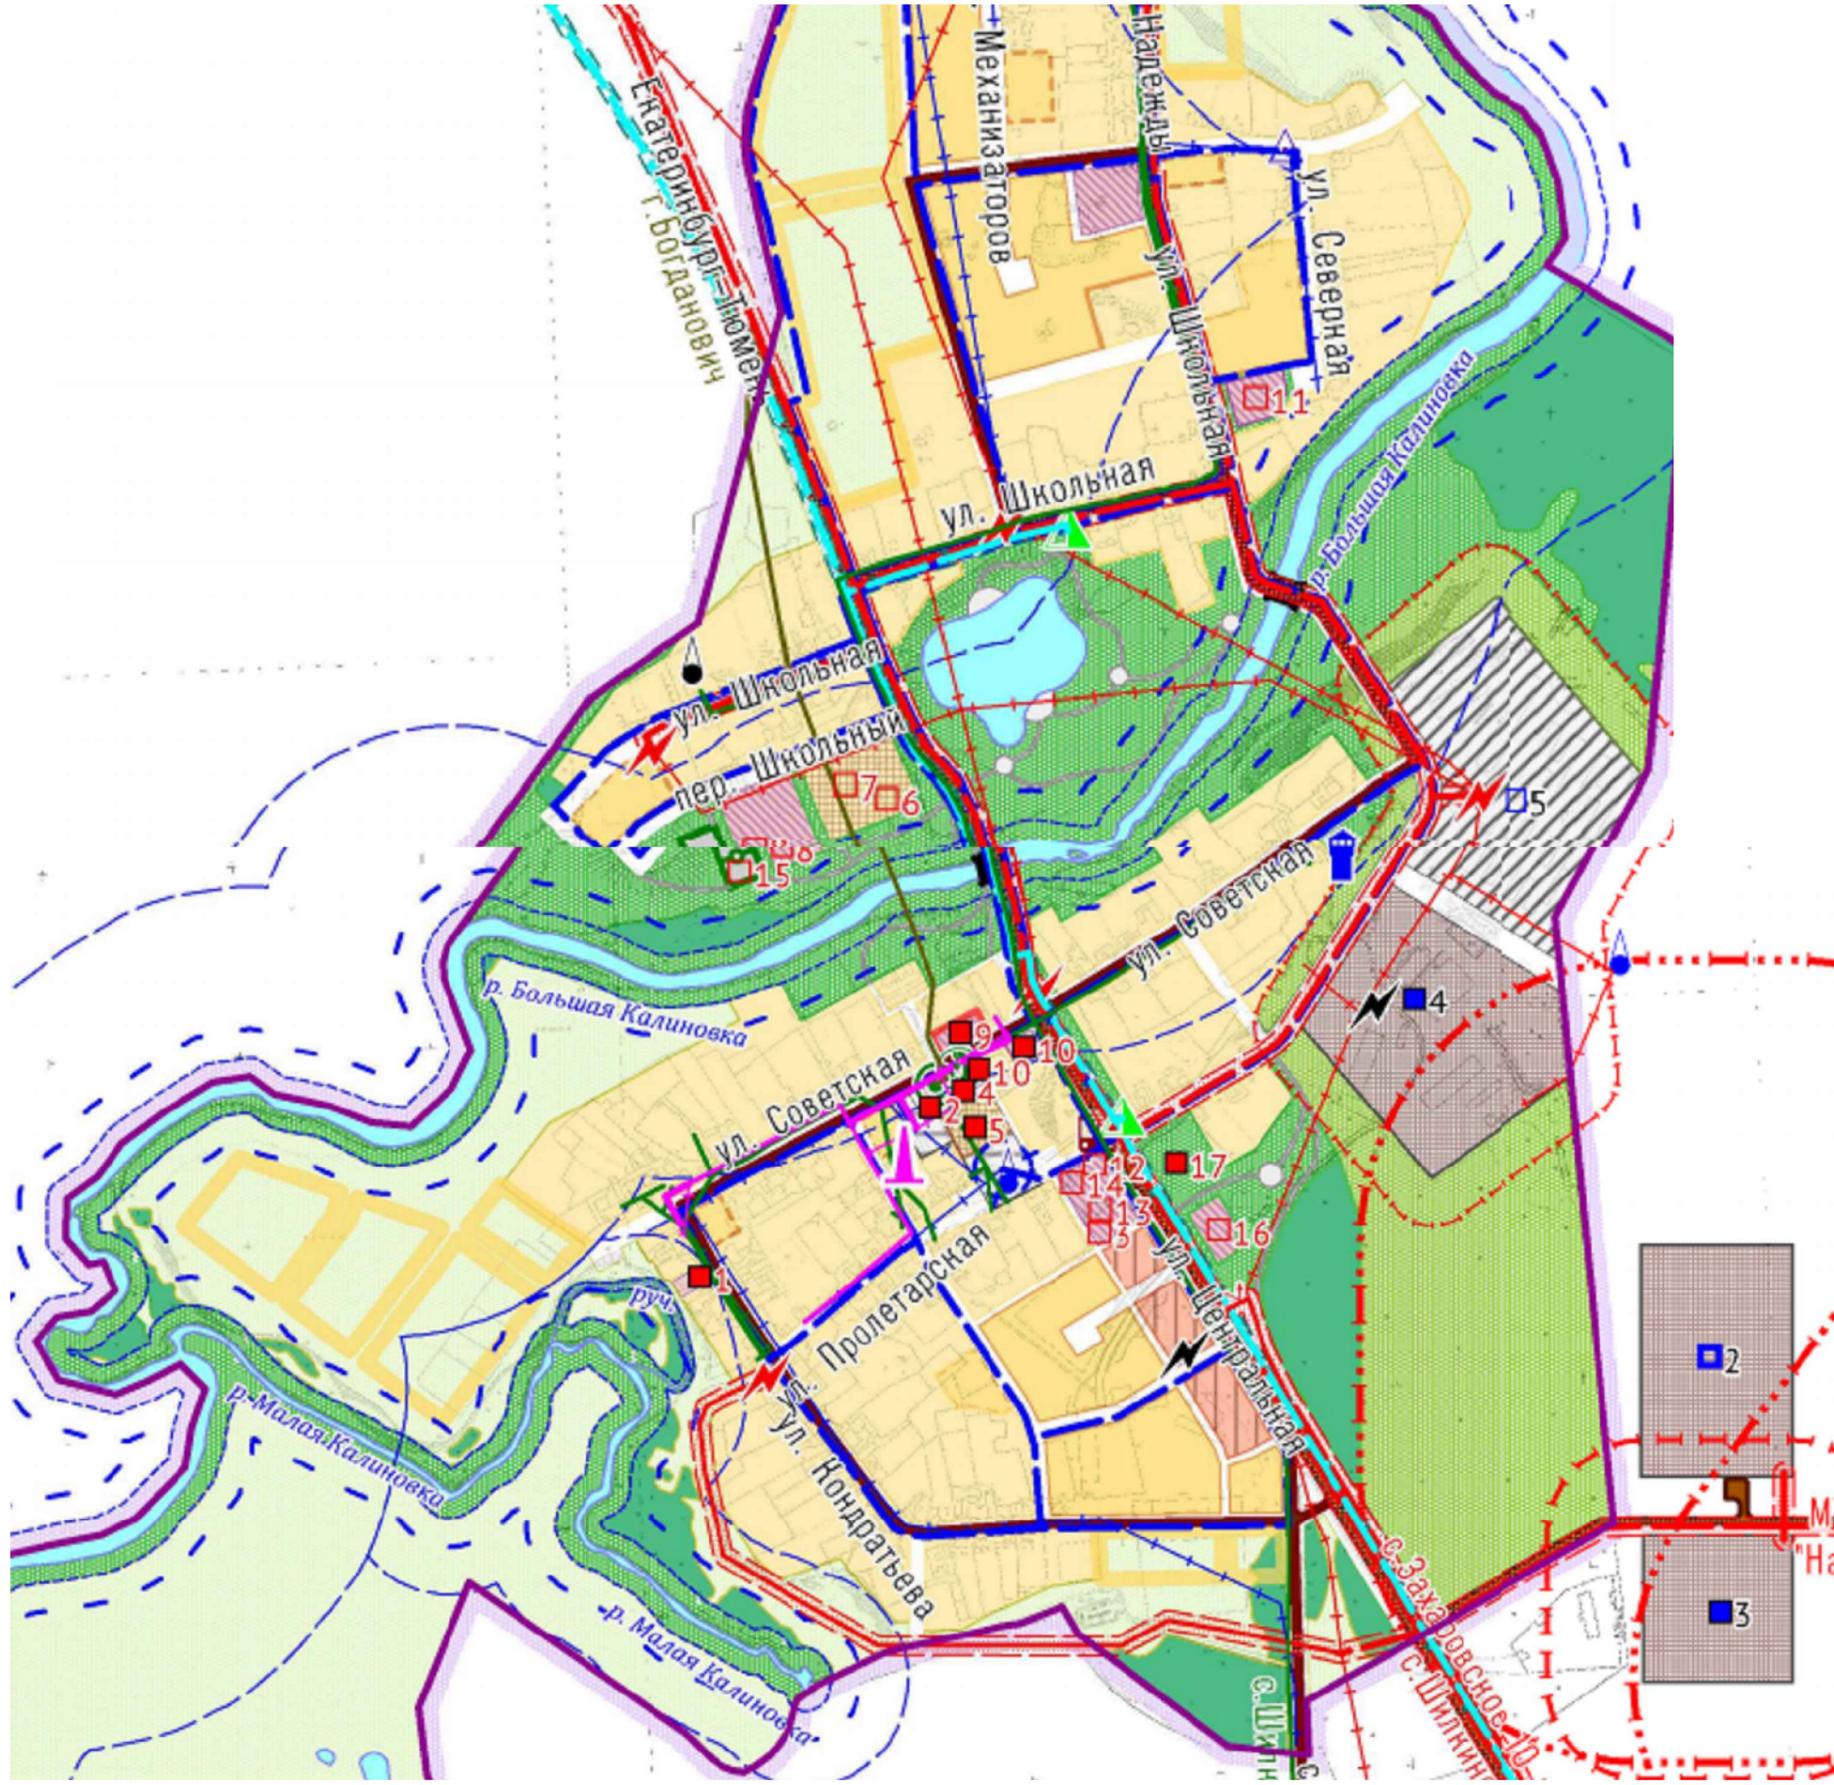

Лист	65				
Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВОГО СП

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.КОНДРАТЬЕВА часть1
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА




ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.КОНДРАТЬЕВА часть1

1. Улица Кондратьева часть1 имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Кондратьева часть1 составляет 596 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,596).
3. Ширина проезжей части составляет 5 м.
4. По ул.Кондратьева часть1 осуществляется движение:
 - легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Кондратьева часть1 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Кондратьева часть1 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Кондратьева часть1 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (адм. район)	д. Шипицина ул. Кондратьева (часть 1)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

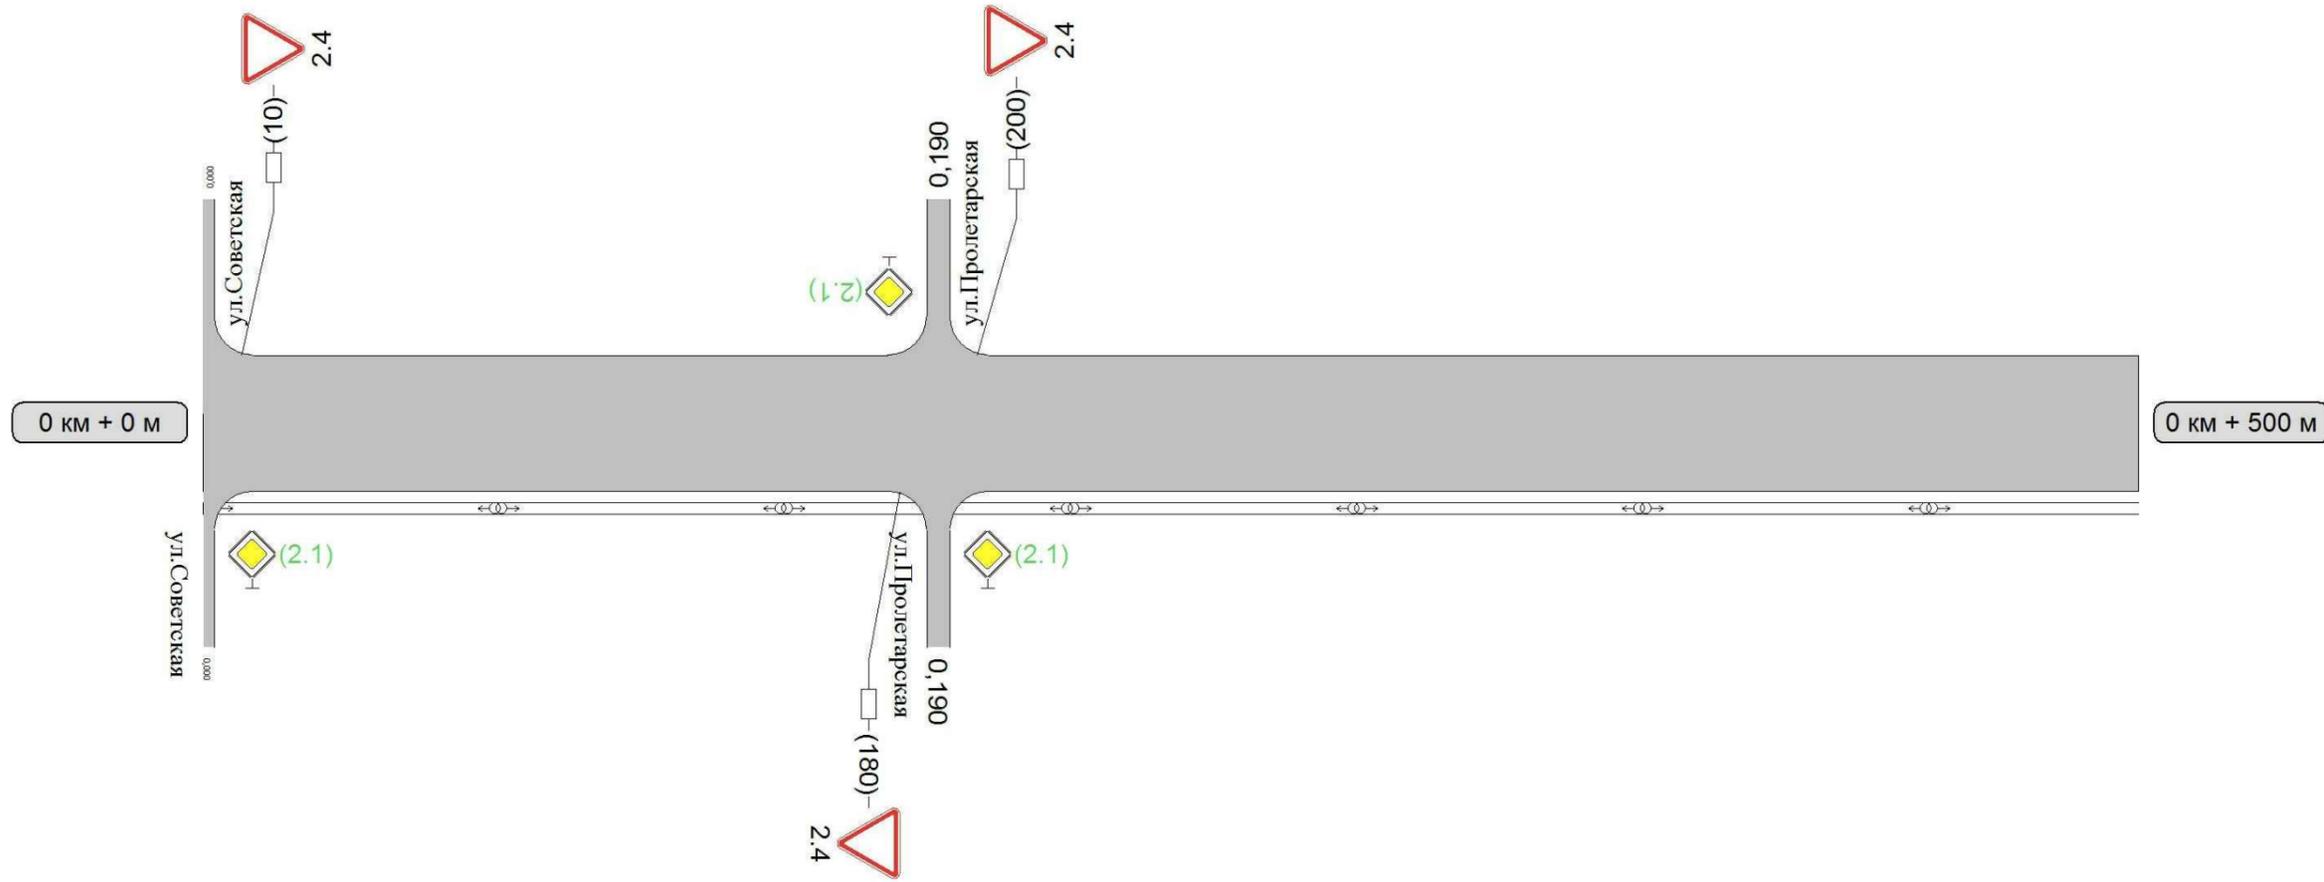

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Наименование автодороги (адм. район)	д. Шипицина ул. Кондратьева (часть 1)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001885 - д.Шипицина ул.Кондратьева (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,596 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+190	требуется установить	1		съезд слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+190	требуется установить	1	съезд справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+553	требуется установить	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+563	требуется установить	1		съезд слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+180	требуется установить	1	справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+200	требуется установить	1		слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+563	требуется установить	1	съезд справа	
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+573	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							10		
Итого:							10		
Знаки дополнительной информации (таблички)									
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+553	требуется установить	1	справа	
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+563	требуется установить	1	съезд справа	
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+573	требуется установить	1		слева
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+563	требуется установить	1		съезд слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							4		
Итого:							4		
Всего установлено:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							14		
Всего:							14		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001885 - д.Шипицина ул.Кондратьева (часть 1)

Участок: 0,000 - 0,596 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.4	Уступите дорогу	4
	Итого для группы	5
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	2


Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

69

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.КОНДРАТЬЕВА часть2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

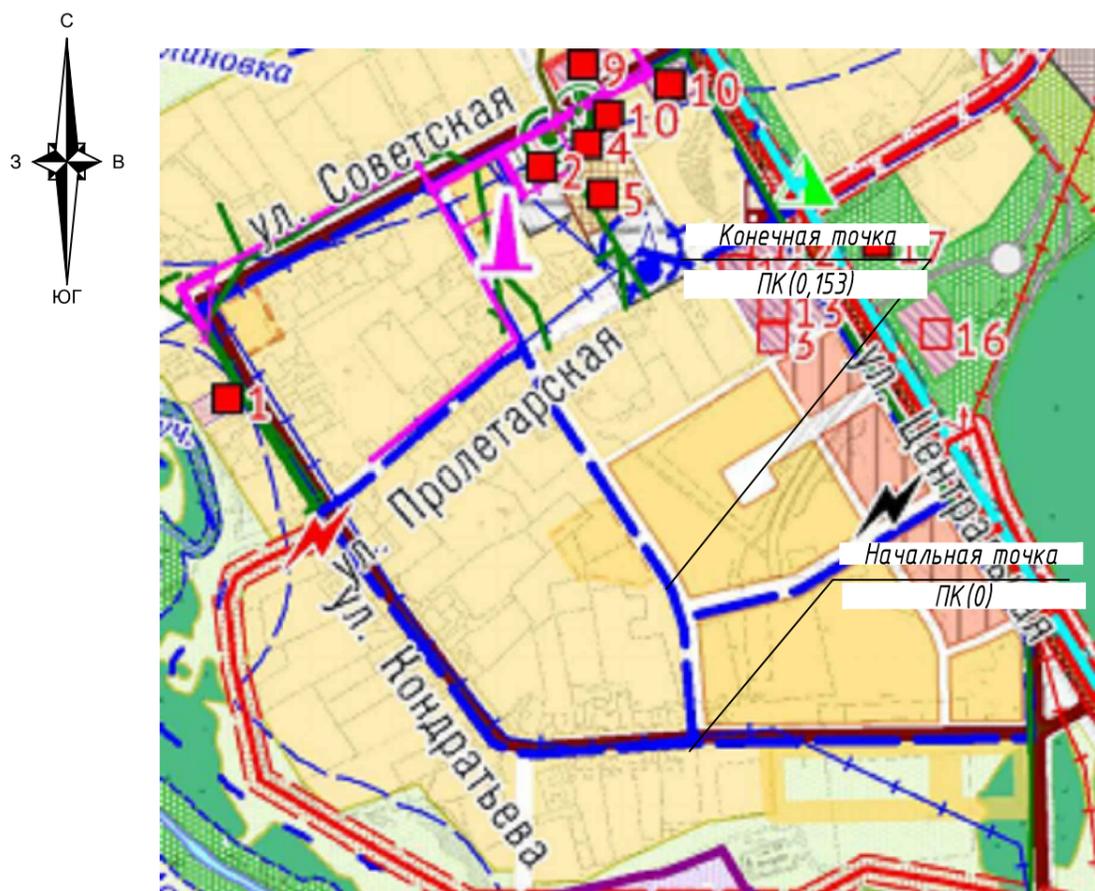


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.КОНДРАТЬЕВА часть2

1. Улица Кондратьева часть2 имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Кондратьева часть2 составляет 153 м.
Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .40 лет Победы и ул.Строителей (часть 1). Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,153).
3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.
4. По ул.Кондратьева часть2 осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Кондратьева часть2 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Кондратьева часть2 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Кондратьева часть2 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (адм. элемент территории)	д. Шипицина ул. Кондратьева (часть 2)
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

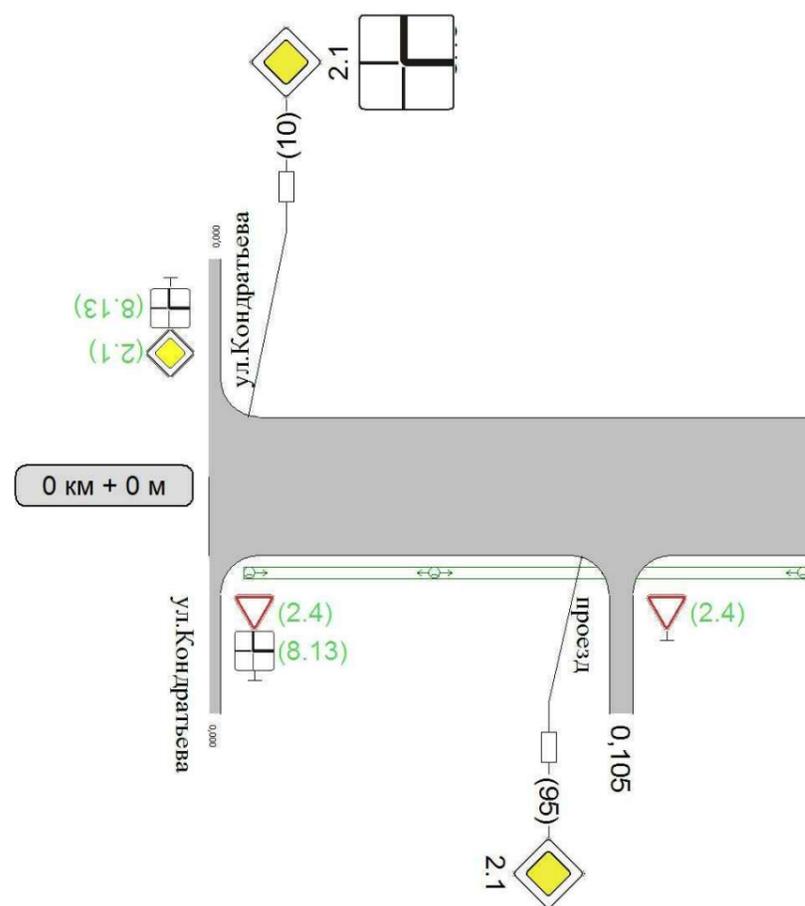

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001886 - д.Шипицина ул.Кондратьева (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,153 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется установить	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+095	требуется установить	1	справа	
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+105	требуется установить	1	съезд справа	
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							5		
Итого:							5		
Знаки дополнительной информации (таблички)									
6	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							3		
Итого:							3		
Всего установлено:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							8		
Всего:							8		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001886 - д.Шипицина ул.Кондратьева (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,153 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	2
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	1

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001886 - д.Шипицина ул.Кондратьева (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,153 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+009	0+153		4/4	144	0	144	Справа
Итого:				4/4	144	0	144	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ часть2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА




ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ часть2

1. Улица Пролетарская часть2 имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Пролетарская часть2 составляет 229 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,229).
3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.
4. По ул.Пролетарская часть2 осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Пролетарская часть2 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул.Пролетарская часть2 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Пролетарская часть2 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	д. Шипицина ул. Пролетарская (часть 2)
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

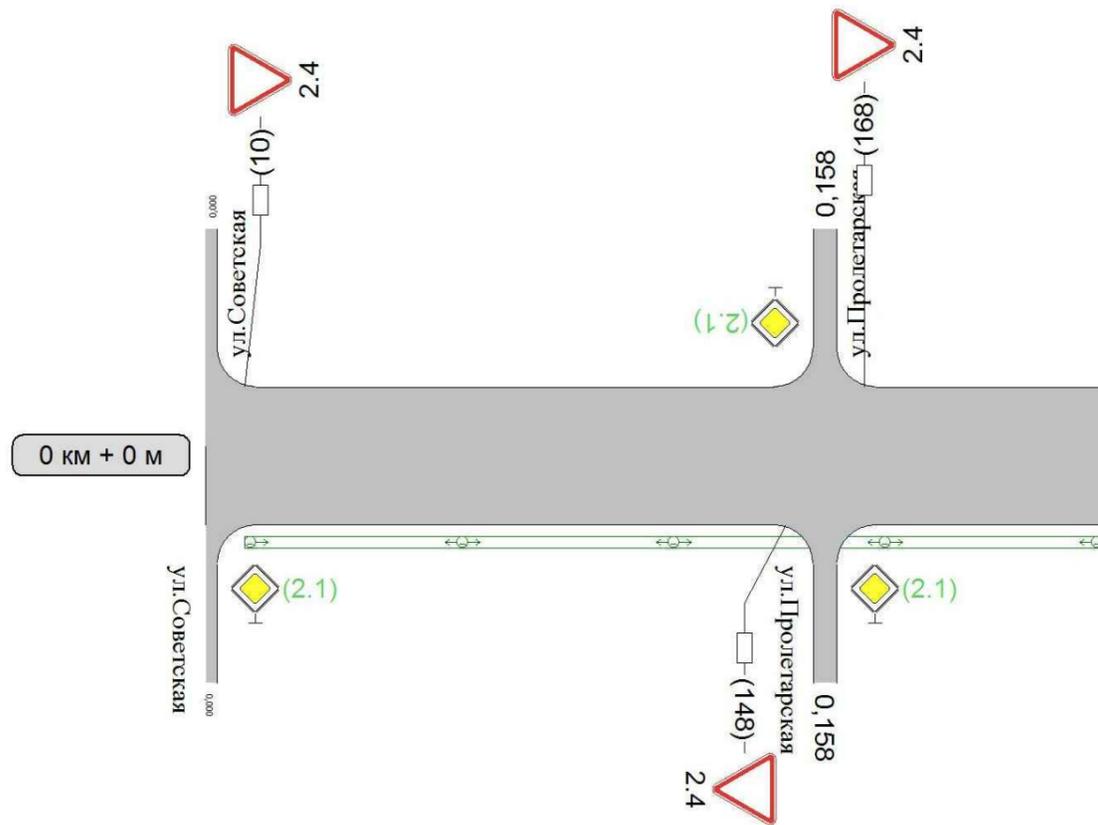

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001887 - д.Шипицина ул.Пролетарская (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,229 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+158	требуется установить	1		съезд слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+158	требуется установить	1	съезд справа	
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+148	требуется установить	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+168	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					6		
		Итого:					6		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					6		
		Всего:					6		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001887 - д.Шипицина ул.Пролетарская (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,229 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	3
	Итого для группы	3
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001887 - д.Шипицина ул.Пролетарская (часть 2)



Участок: 0,000 - 0,229 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+010	0+229		5/5	219	0	219	Справа
Итого:				5/5	219	0	219	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ частьЗ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

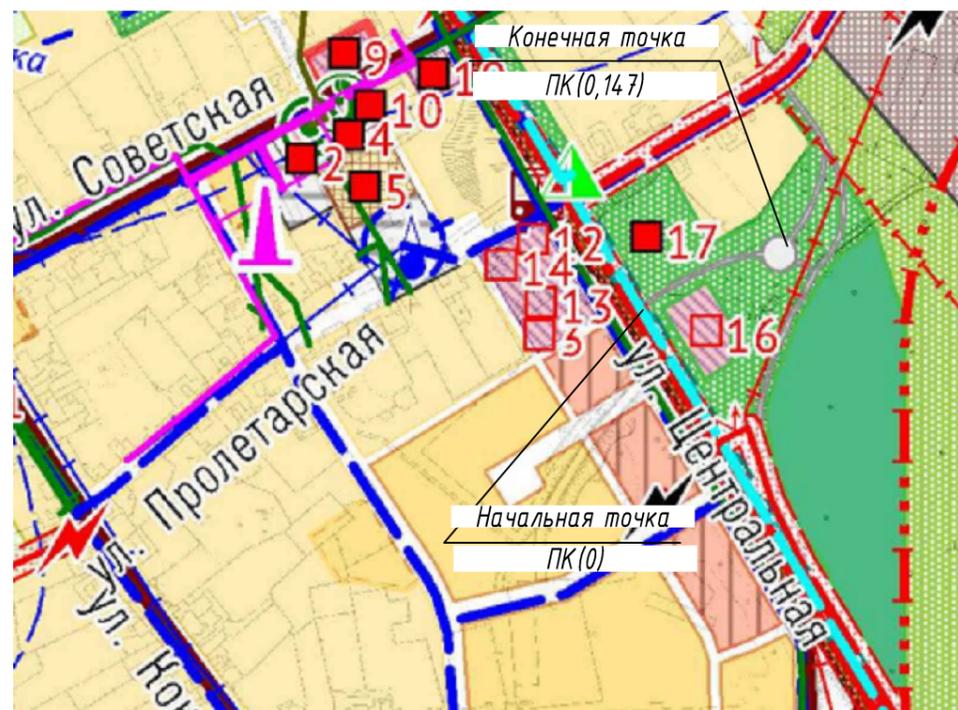

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ частьЗ

1. Улица Пролетарская частьЗ имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Пролетарская частьЗ составляет 147 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,147).
3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.
4. По ул.Пролетарская частьЗ осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Пролетарская частьЗ установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул.Пролетарская частьЗ отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Пролетарская частьЗ отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (адм. элементы дороги в продольном профиле)	д. Шипицина ул. Пролетарская (часть 3)	Разметка на участке:
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001888 - д.Шипицина ул.Пролетарская (часть 3)

Участок: 0,000 - 0,147 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					2		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					2		
		Всего:					2		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001888 - д.Шипицина ул.Пролетарская (часть 3)

Участок: 0,000 - 0,147 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001888 - д.Шипицина ул.Пролетарская (часть 3)



Участок: 0,000 - 0,147 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+009	0+147		3/3	138	0	138	Справа
Итого:				3/3	138	0	138	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

**СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.СЕВЕРНАЯ часть1
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

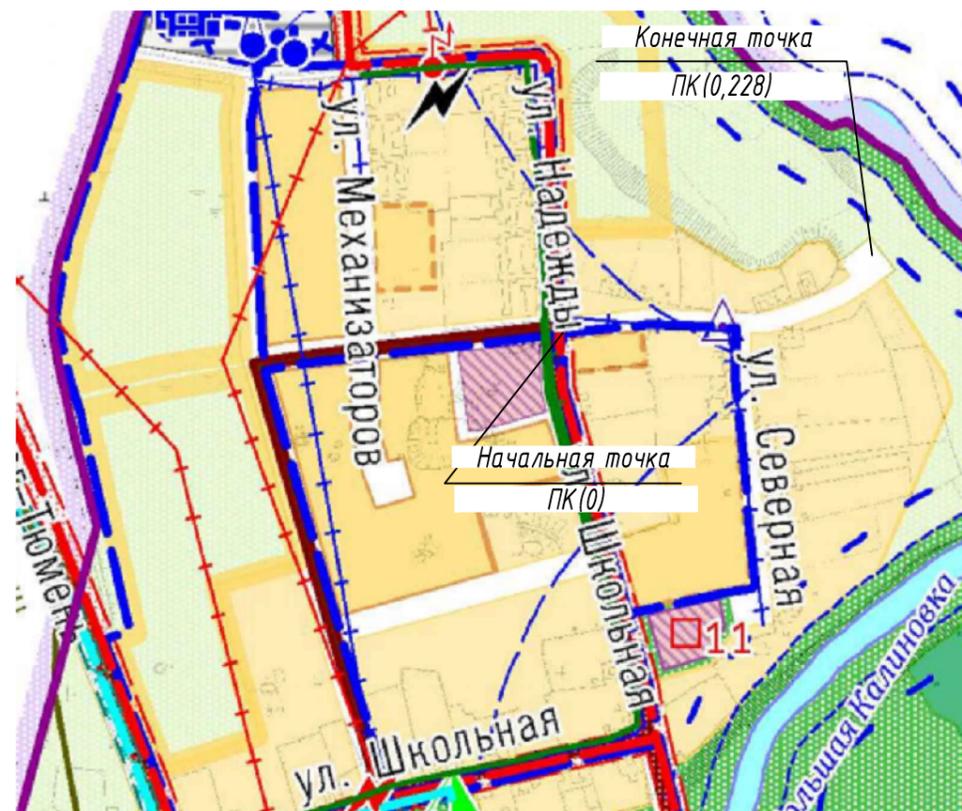


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.СЕВЕРНАЯ часть1

1. Улица Северная часть 1 имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Северная часть1 составляет 228м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,228).
3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
4. По ул.Северная часть1 осуществляется движение:
 - легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Северная часть1 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Северная часть1 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Северная часть1 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (вдоль элементов дороги в продольном профиле)	д. Шипицина ул. Северная (часть 1)
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

Разметка на участке:

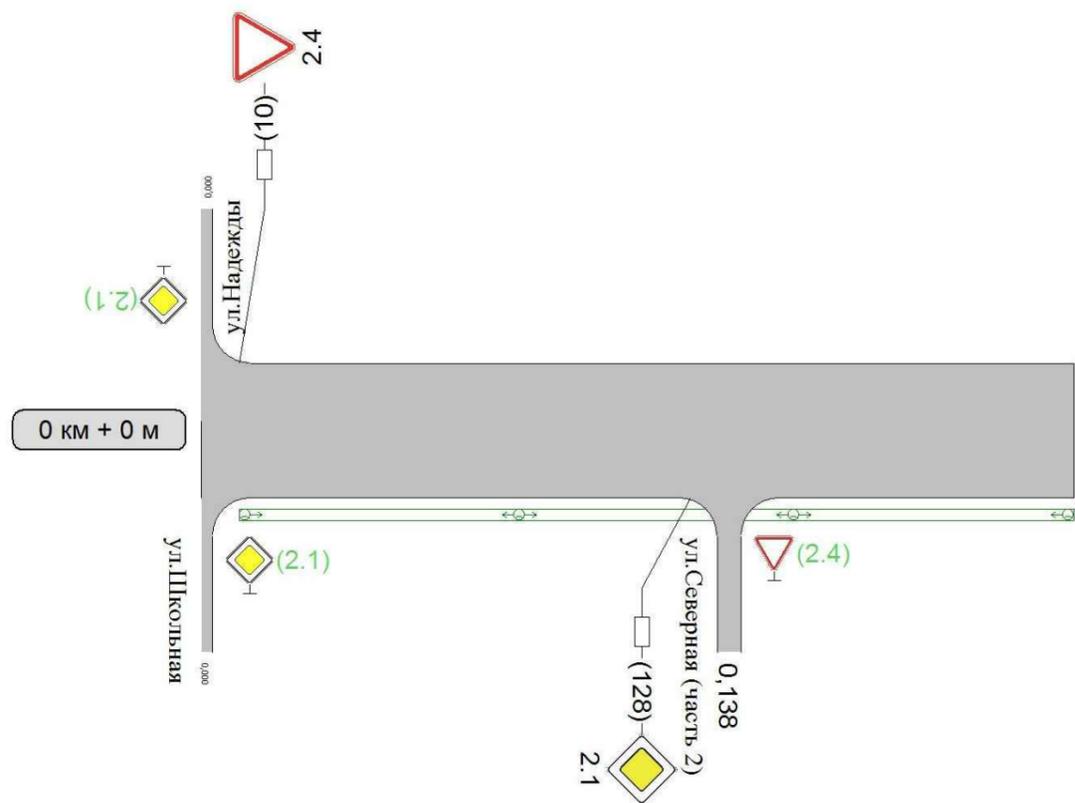

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001883 - д.Шипицина ул.Северная (часть 1)

Участок 0,000 - 0,228 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+128	требуется установить	1	справа	
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+138	требуется установить	1	съезд справа	
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					5		
		Итого:					5		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					5		
		Всего:					5		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001883 - д.Шипицина ул.Северная (часть 1)

Участок 0,000 - 0,228 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001883 - д.Шипицина ул.Северная (часть 1)

Участок 0,000 - 0,228 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+010	0+228		4/4	218	0	218	Справа
Итого:				4/4	218	0	218	



Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Лист

81

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул.СЕВЕРНАЯ часть2
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

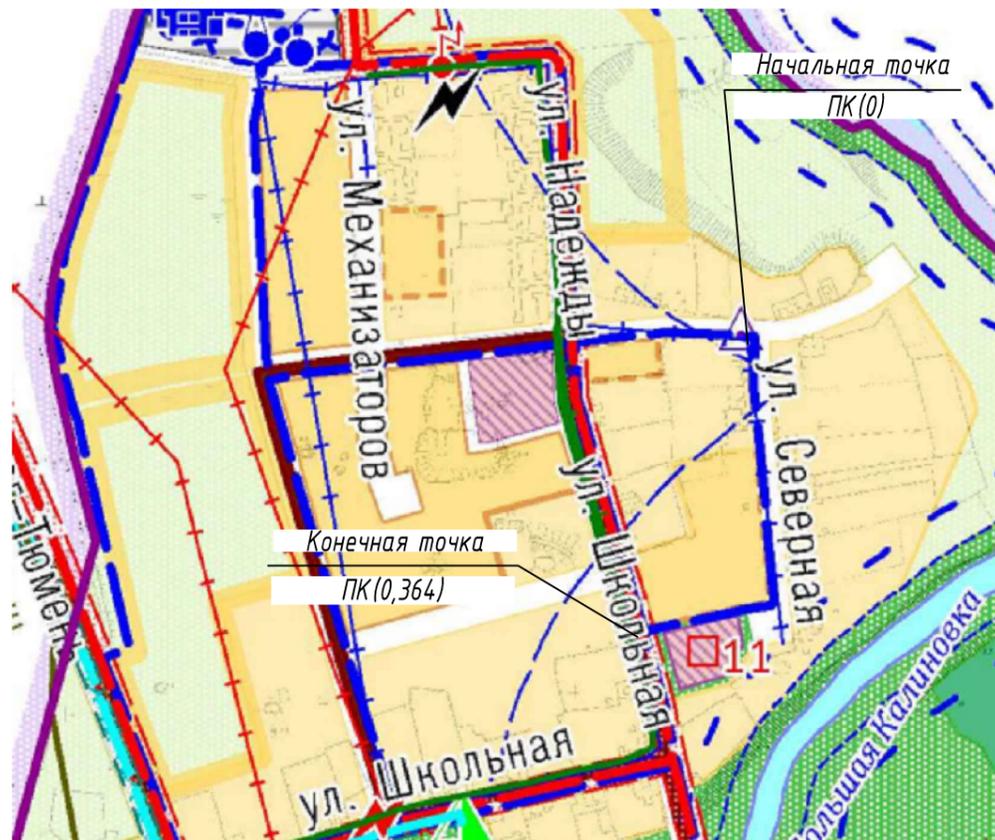


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул.СЕВЕРНАЯ часть2

1. Улица Северная часть2 имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Северная часть2 составляет 364 м.
Начальной точке присвоен ПК (0).
Конечной точке присвоен ПК (0,364).
3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
4. По ул.Северная часть2 осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном направлению движения транспорта ;
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Северная часть2 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Северная часть2 отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Северная часть2 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Наименование автодороги (адм. элемент)	д. Шипицина ул. Северная (часть 2)	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

Разметка на участке:

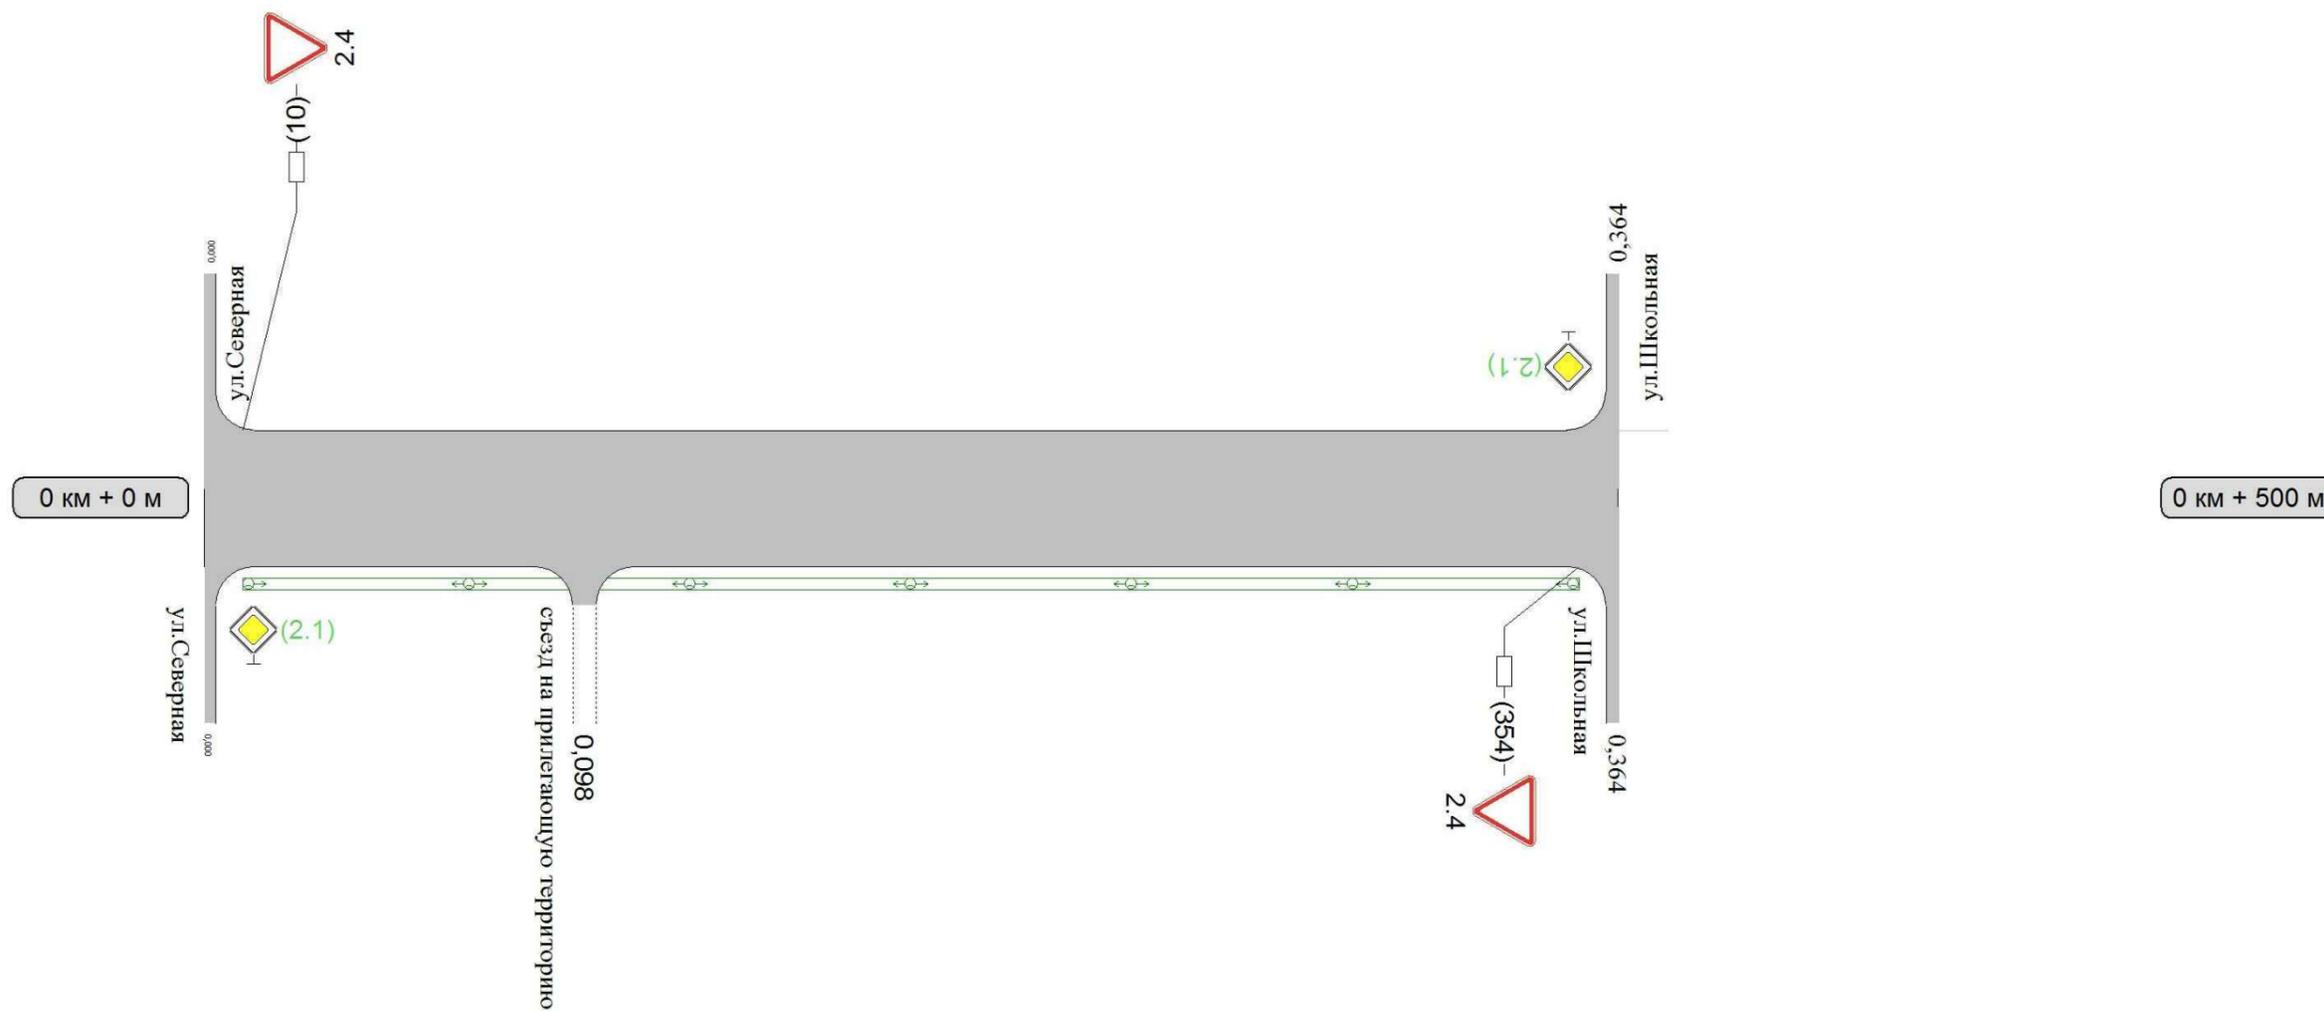

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Тротуары справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001884 - д.Шипицина ул.Северная (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,364 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Мест ора споло жение	Мест орасполо жение
Знаки приоритета									
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+364	требуется установить	1		съезд слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+354	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							4		
Итого:							4		
Всего установлено:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							4		
Всего:							4		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001884 - д.Шипицина ул.Северная (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,364 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	2
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001884 - д.Шипицина ул.Северная (часть 2)

Участок: 0,000 - 0,364 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+010	0+354		7/7	344	0	344	Справа
Итого:				7/7	344	0	344	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СП
