

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

*ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
с.ОБУХОВСКОЕ
ТОМ 2*

ПОДД-2014

2014 г.

Согласовано:

Начальник ОГИБДД ММО МВД России «Камышловский»,
майор полиции:

_____ А.Б. Кренин

“ _____ ” _____ 2014 года

Утверждаю:

Глава администрации МО “Обуховское сельское поселение”

_____ В.И. Верхорубов

“ _____ ” _____ 2014 года

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
с.ОБУХОВСКОЕ

ПОДД-2014

Исполнитель:

Директор общества с ограниченной ответственностью
“АгроНефтеХимПроект”

_____ А.Г.Фурсов

“ _____ ” _____ 2014 года











ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Номер листов
1	Ведомость рабочих чертежей	3
2	Условные обозначения	4
3	Схема улично-дорожной сети с.Обуховское	5
4	Проект организации дорожного движения по ул.Заречная	6-11
5	Проект организации дорожного движения по ул.Мира	12-17
6	Проект организации дорожного движения по ул.Рабочая	18-23

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Настоящий проект организации дорожного движения (далее по тексту – ПОДД) муниципальных автодорог, находящихся на территории “Обуховского сельского поселения”, с.Обуховское, разработан Обществом с ограниченной ответственностью “АгроНефтеХимПроект” по заказу МО “Обуховское сельское поселение”.
2. ПОДД разработан на основании статьи 21 Федерального закона “О безопасности движения” №196–ФЗ от 10 декабря 1995г.
3. ПОДД разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правил дорожного движения, стандартов, технических норм и направлен на решение следующих задач:
- обеспечение безопасности участников движения;
 - введение необходимого режима движения и организация регулирования узлов в соответствии с категорией улицы (дороги), конструктивными элементами поперечного профиля, искусственными дорожными сооружениями и другими факторами, влияющими на дорожное движение;
 - своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении объектов, населенных пунктов, маршрутах проезда грузового транспорта, в том числе с опасными грузами и транзитных автомобилей через населенный пункт.
 - обеспечение рационального использования всей ширины проезжей части для движения автотранспортных средств, соблюдения правил движения и парковки.
4. Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
5. Техническое задание на разработку ПОДД утверждено Заказчиком.
6. Обследование улично-дорожной сети проведено в августе 2014 года.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Контур проезжей части в бровках		Горизонтальная дорожная разметка, с указанием номера по ГОСТ Р 51256-99
	Автобусные остановки на автомобильной дороге 1 – Автобусный павильон существующий 2 – Автобусный павильон проектируемый 3 – Заездной карман		Способы установки дорожных знаков: – сбоку на стойке (стойках) – сбоку на консоли
	Искусственные сооружения 1 – Водопропускные трубы, с указанием месторасположения 2 – Мосты, путепроводы, с указанием адреса начала и адреса конца сооружения		Дорожные знаки – Существующие – Проектируемые
	1 – Примыкание к проезжей части, с указанием месторасположения 2 – Тротуар существующий 3 – Тротуар проектируемый		
	График кривых в плане, с указанием начала и конца кривой, радиуса кривой и угла поворота трассы		
	График продольных уклонов, с указанием начала и конца уклона, его значения в промиллях и длины уклона		
	График необеспеченной видимости – В прямом направлении, – В обратном направлении, С указанием начала и конца участка с ограниченной видимостью и минимального допустимого значения обеспеченной видимости для данной категории дороги (улицы) или ее участка		
	Ширина проезжей части и обочин. Значения указанные от дефиса слева относятся к левой стороне проезжей части, справа – к правой: 1,0 – ширина обочины (0,5) – ширина укрепленной части обочины 3,0 – ширина полосы движения в данном направлении		
	Опоры освещения: 1 – существующая; 2 – проектируемая		
	Светофоры: – Транспортные существующие – Пешеходные существующие		




	Участки дороги (улицы) представляемые на отдельном листе
	Металлические опоры высоковольтной ЛЭП
	Ограждающие и направляющие устройства – ограждения пешеходные существующие – ограждения пешеходные проектируемые – ограждения барьерные существующие – ограждения барьерные проектируемые – столбики сигнальные существующие – столбики сигнальные проектируемые

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ с.ОБУХОВСКОЕ



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА УЛИЦАХ КАМЕНСКОГО ГО, с.ОБУХОВСКОЕ					Лист	5
Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата	

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. ЗАРЕЧНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

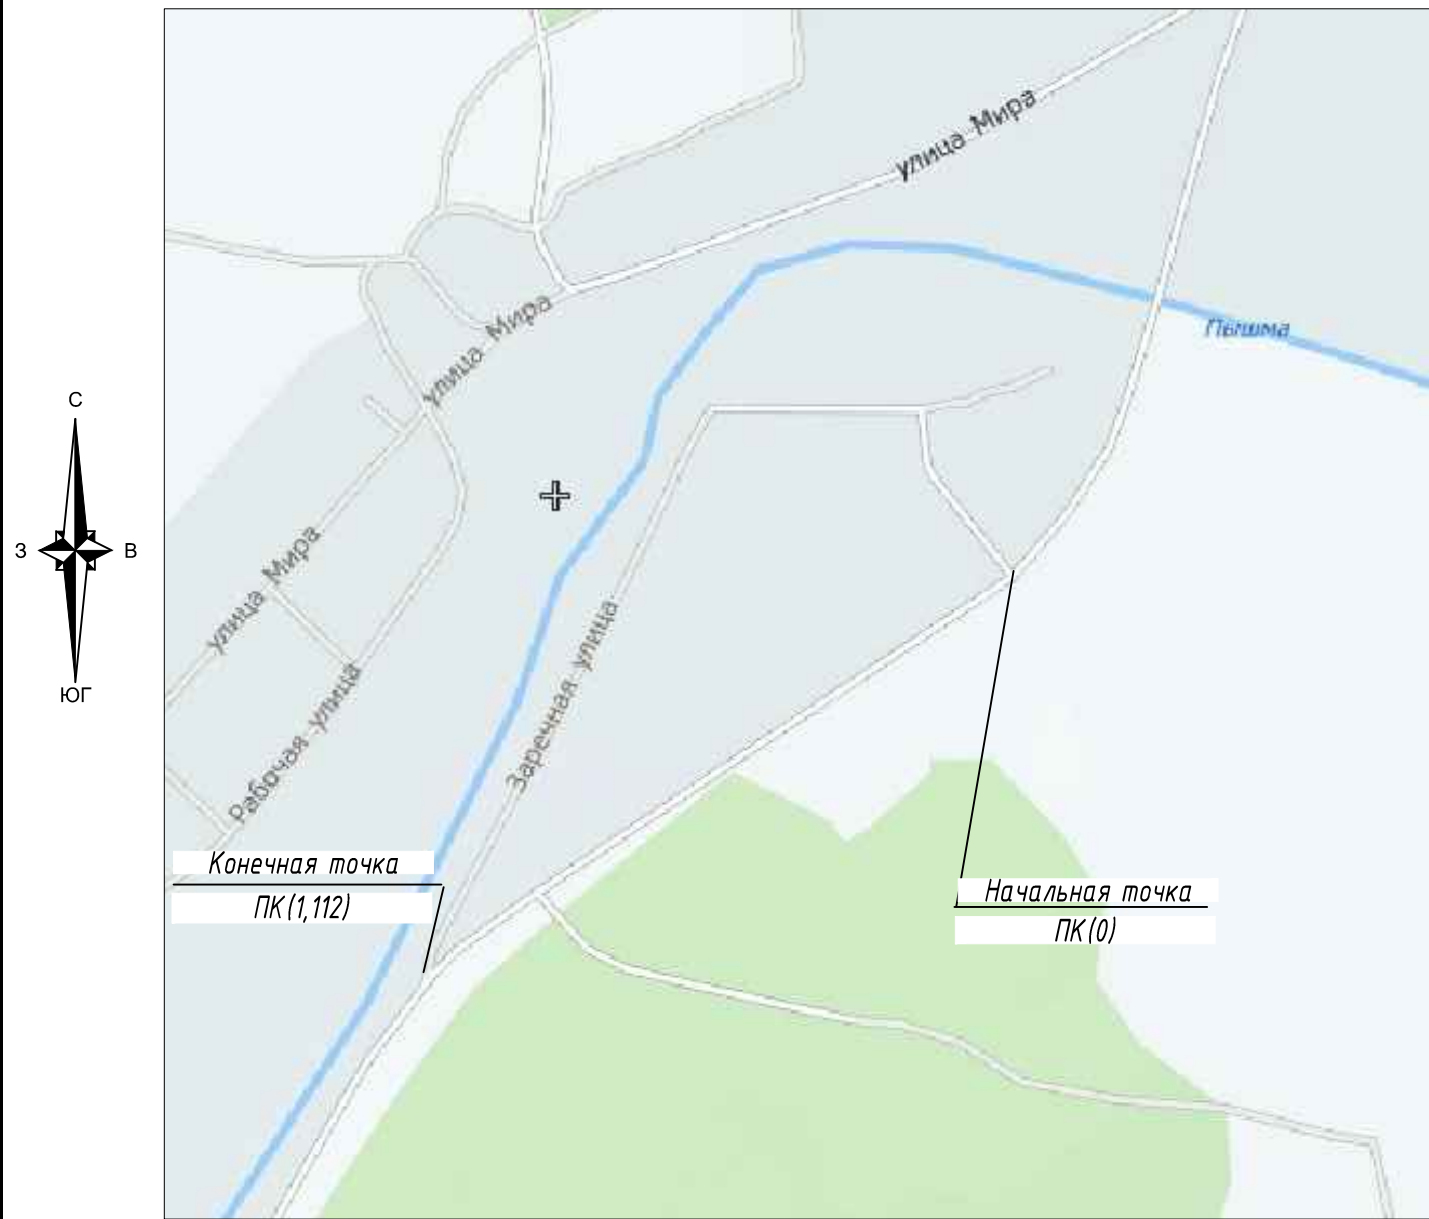

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ЗАРЕЧНАЯ

- 1. Улица Заречная имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
- 2. Общая протяженность ул.Заречная составляет 1112 м.


Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании к объездной автоороге.

Конечной точке присвоен ПК (1.112). Конечная точка расположена на примыкании к объездной автодороге.

- 3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
- 4. По ул.Заречная осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
- 5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Заречная отсутствуют
- 6. Светофорные объекты на ул.Заречная отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Заречная
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по обочине	
1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

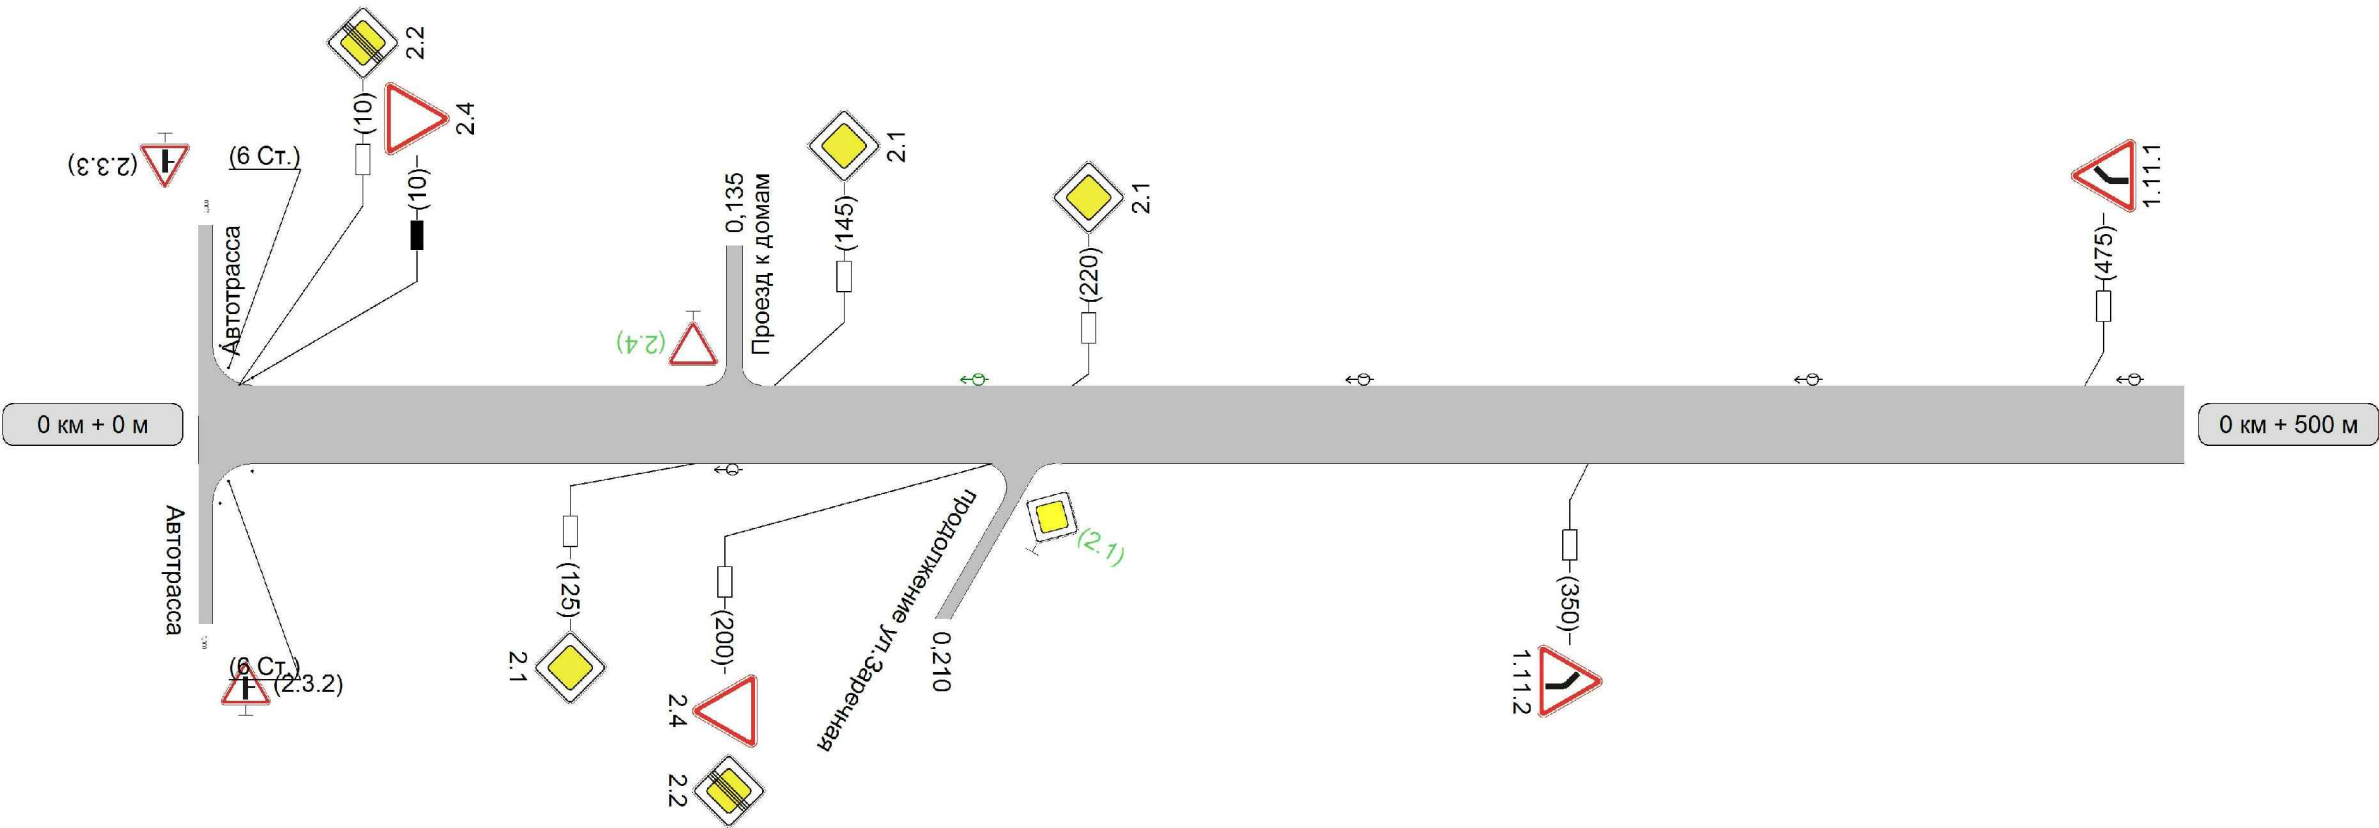


Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ С,ОБУХОВСКОЕ

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Заречная
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальное дрожное ограждение по осевой	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

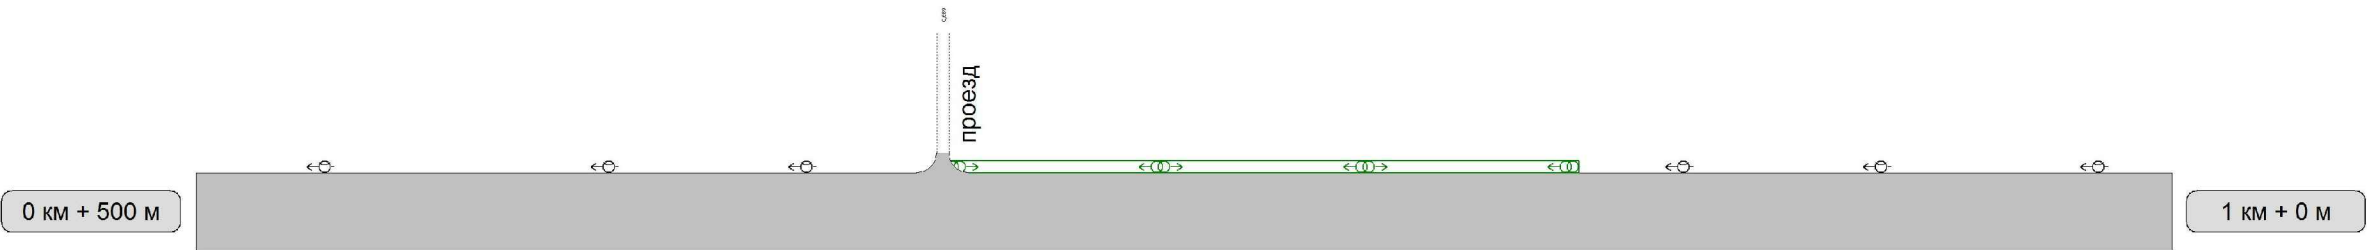

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Горизонтальное дрожное ограждение по осевой	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-ая от осевой
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ С,ОБУХОВСКОЕ



Дорога: 0213213 - с.Обуховское, ул.Заречная Участок: 0,000 - 1,112 км. Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+475	требуется установить	1		слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+350	требуется установить	1	справа	
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					2		
		Знаки приоритета							
3	2.1	Главная дорога	2		0+125	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+145	требуется установить	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+210	требуется установить	1	съезд справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+220	требуется установить	1		слева
7	2.2	Конец главной дороги	2		0+010	требуется установить	1		слева
8	2.2	Конец главной дороги	2		0+200	требуется установить	1	справа	
9	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
10	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2		1+103	установлено	1		съезд слева
11	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		0+000	установлено	1		съезд слева
12	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		1+103	установлено	1	съезд справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	требуется установить	1		съезд слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+200	требуется установить	1	справа	
16	2.4	Уступите дорогу	2		1+066	демонтировать	1	справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		1+088	требуется установить	1	справа	
		Итого установлено:					5		
		Итого демонтировать:					1		
		Итого требуется:					9		
		Итого:					14		
		Всего установлено:					5		
		Всего демонтировать:					1		
		Всего требуется установить:					11		
		Всего:					16		

Ведомость размещения искусственного освещения								
Дорога: 0213213 - с.Обуховское, ул.Заречная Участок: 0,000 - 1,112 км. Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+195	0+195		1/1	0	0	0	Слева
2	0+690	0+850		4/4	160	0	160	Слева
Итого:				5/5	160	0	160	

Ведомость размещения сигнальных столбиков								
Дорога: 0213213 - с.Обуховское, ул.Заречная								
Участок: 0,000 - 1,112 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			0/0	20/24	0/0			
1	0+004	0+004	0/0	0/6	0/0	Справа	Пластмасса	Пересечение
2	0+004	0+004	0/0	0/6	0/0	Слева	Пластмасса	Пересечение
3	1+090	1+100	0/0	10/4	0/0	Справа	Пластмасса	Пересечение
4	1+090	1+100	0/0	10/8	0/0	Слева	Пластмасса	Пересечение

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 0213213 - с.Обуховское, ул.Заречная		
Участок: 0,000 - 1,112 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
1.11.1	Опасный поворот	1
1.11.2	Опасный поворот	1
	Итого для группы	2
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	3
2.2	Конец главной дороги	2
2.4	Уступите дорогу	2
	Итого для группы	7
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. МИРА
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

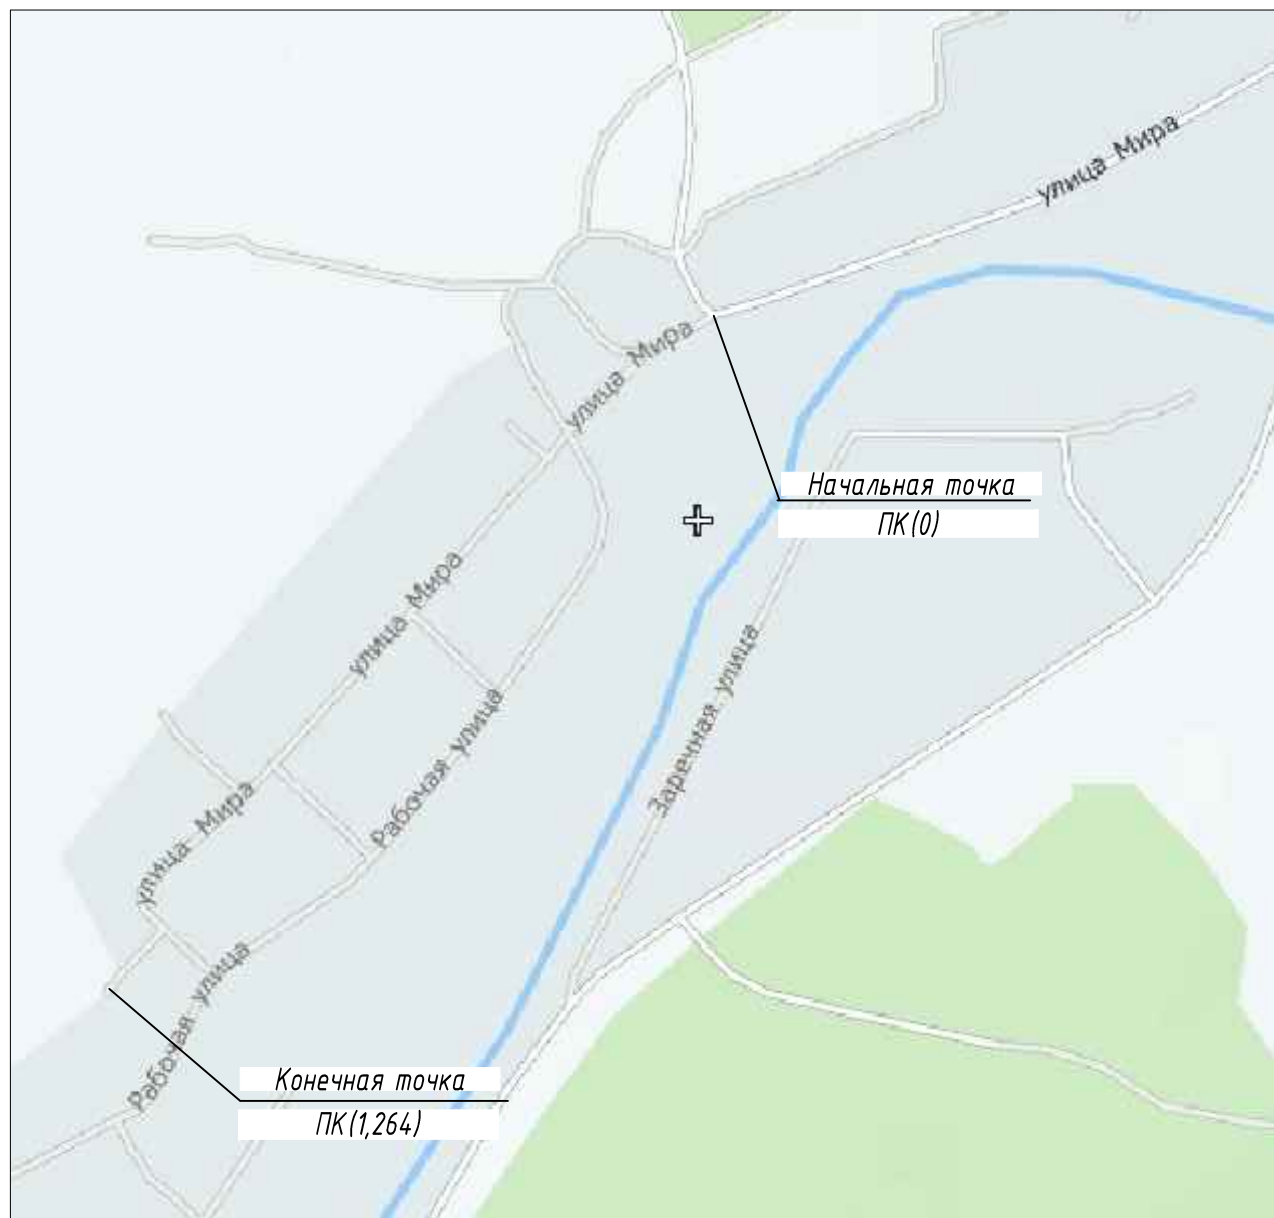


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. МИРА

1. Улица Мира имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Мира составляет 1264 м.

Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка расположена на примыкании с ул . Мира и Автодорогой ведущей из с.Обуховское.


Конечной точке присвоен ПК (1,264). Конечная точка расположена в тупике .
3. Ширина проезжей части составляет 5.2 м.
4. По ул.Мира осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Мира отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Мира отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Мира	Разметка на участке:
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальное дорож. от. от осевой слева	1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении		

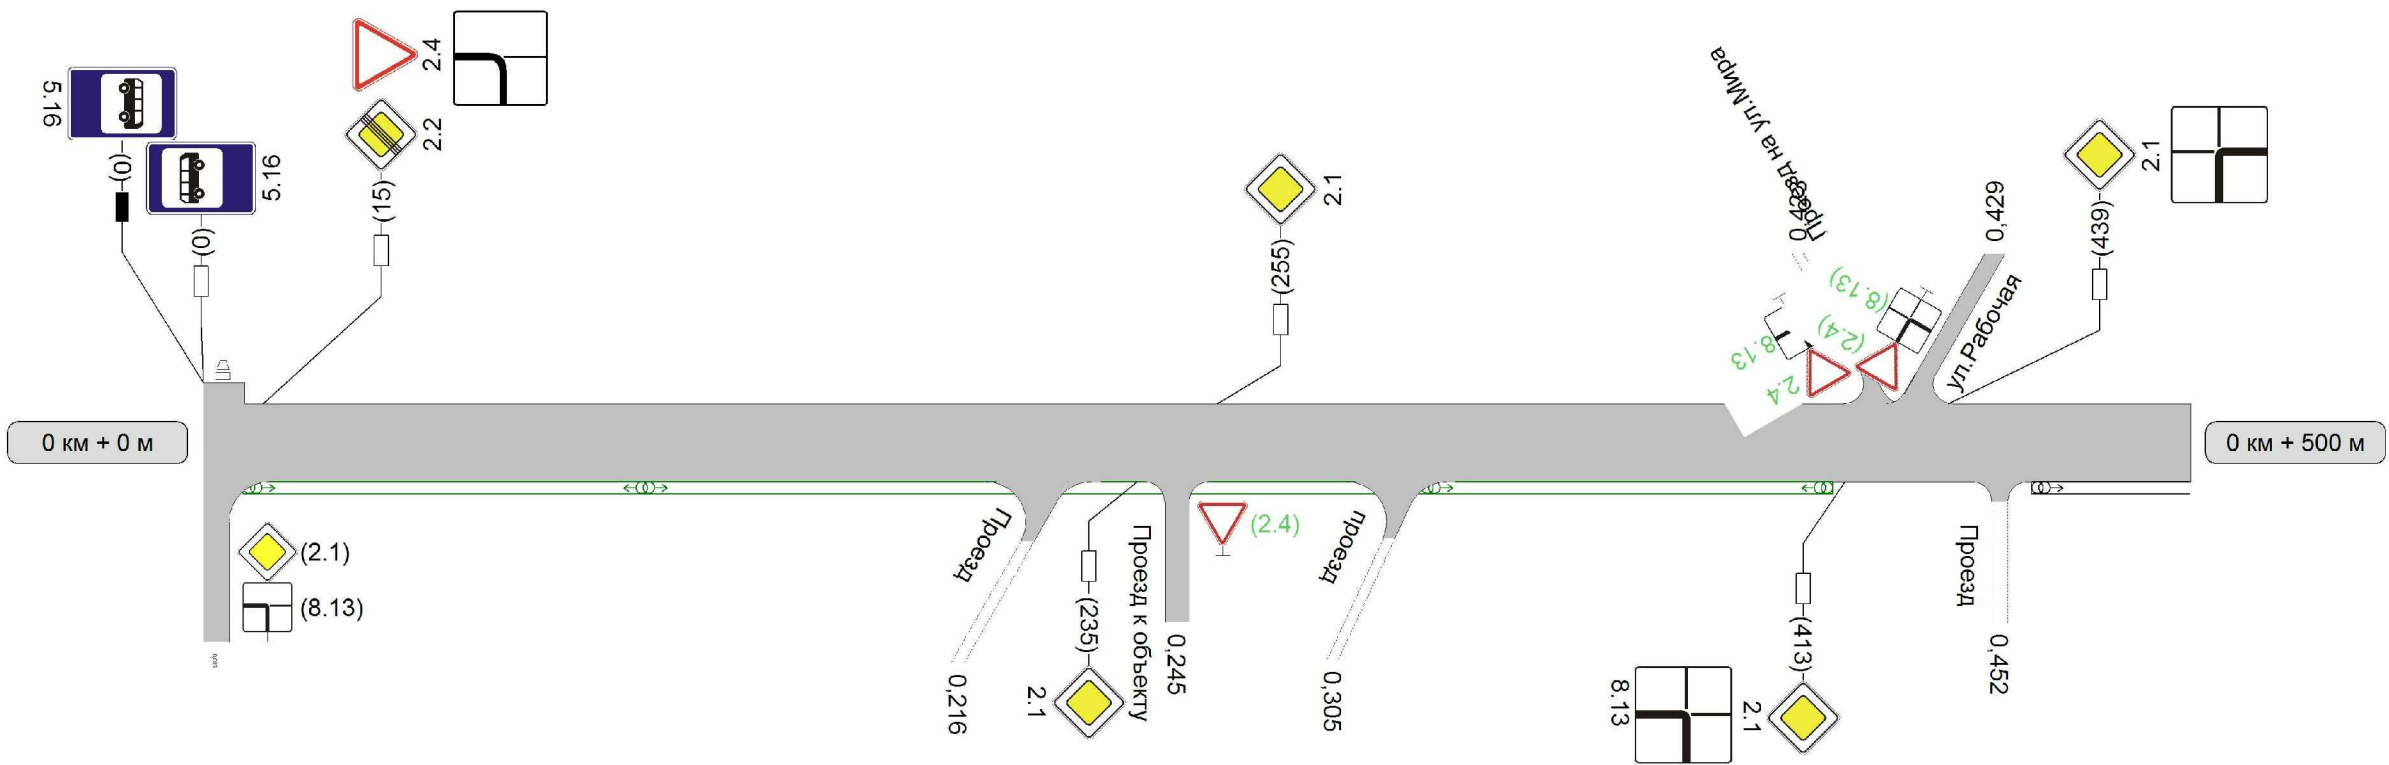

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Мира	Разметка на участке:
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка (ГОСТ)	1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении		

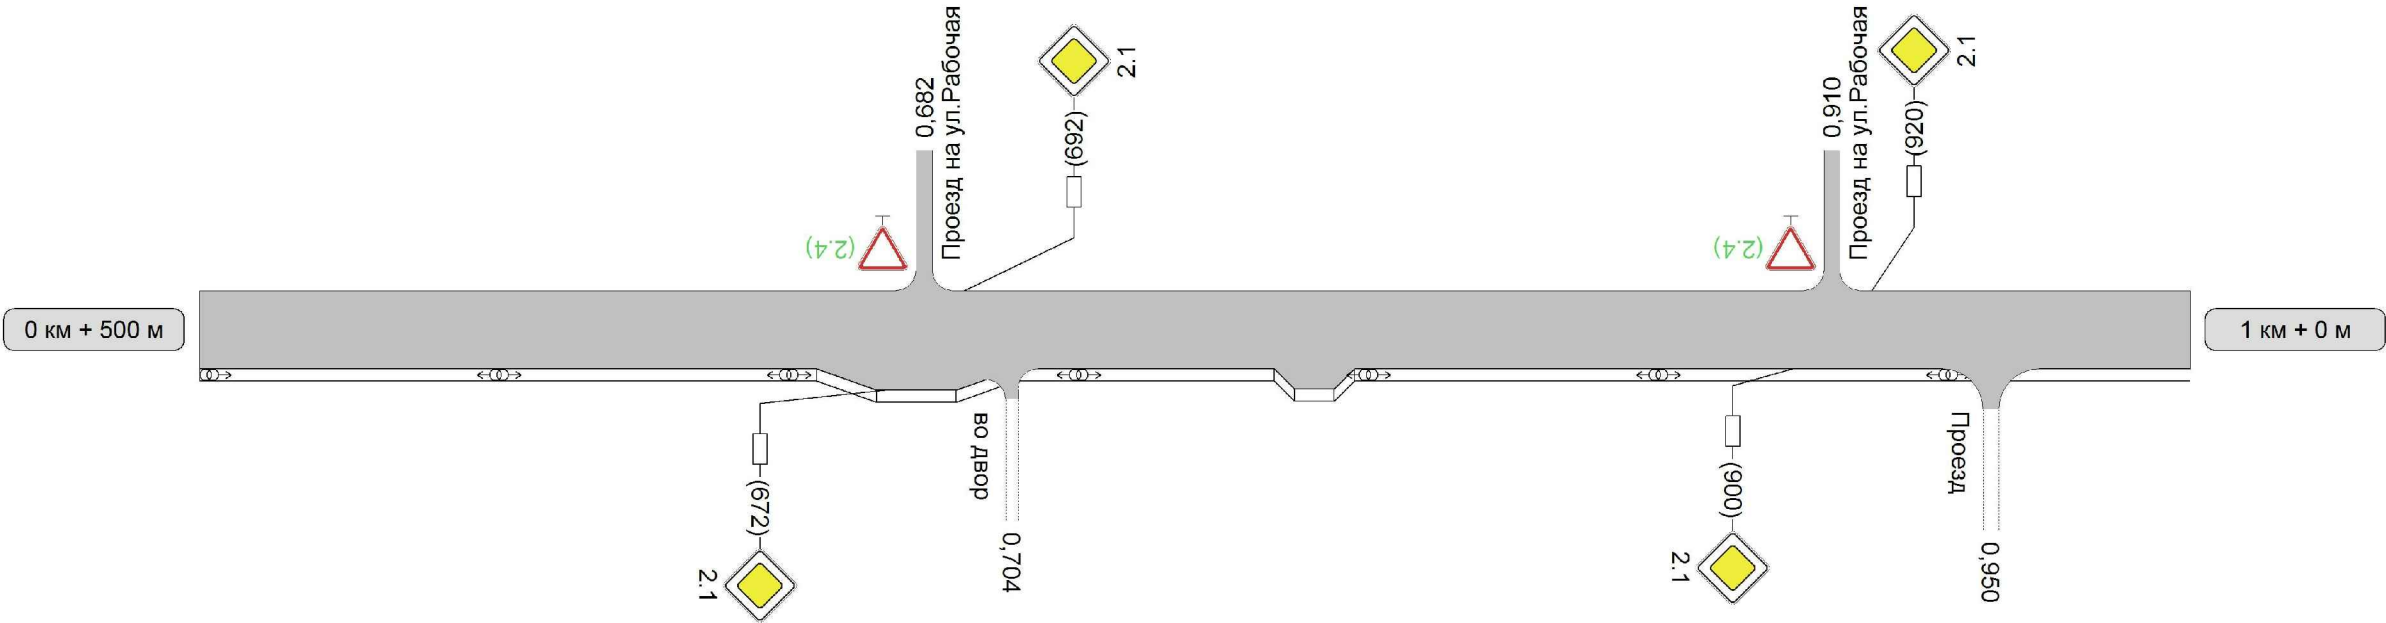


Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка (ГОСТ)	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-ая от осевой
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Мира
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальн.-верт. разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

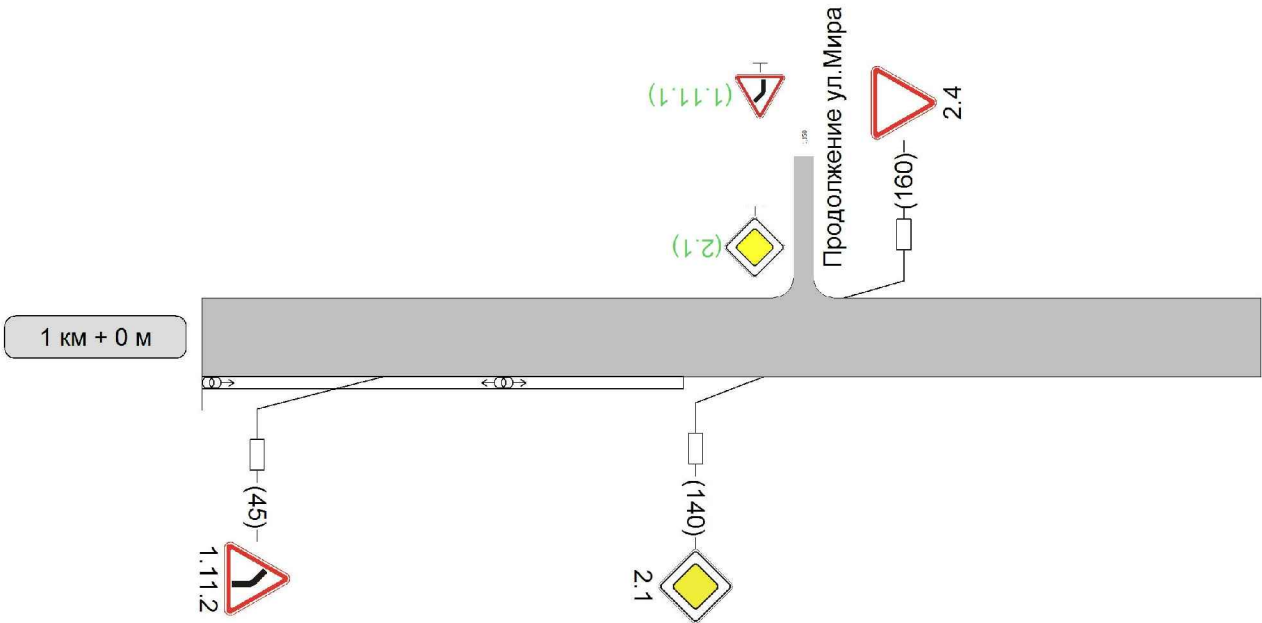

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Горизонтальн.-верт. разметка справа	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-ая от осевой
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ С,ОБУХОВСКОЕ

Ведомость размещения дорожных знаков	
Дорога: 0212313 - с.Обуховское, ул.Мира Участок: 0,000 - 1,264 км. Год паспортизации: 2014	

Год паспортизации: 2014


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		1+150	требуется установить	1		съезд слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		1+045	требуется установить	1	справа	
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					2		
		Итого:					2		
		Знаки приоритета							
3	2.1	Главная дорога	2		0+003	установлено	1	съезд справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+235	требуется установить	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+255	требуется установить	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+413	требуется установить	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+439	требуется установить	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+672	требуется установить	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+692	требуется установить	1		слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+900	требуется установить	1	справа	
11	2.1	Главная дорога	2		0+920	требуется установить	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		1+140	требуется установить	1	справа	
13	2.1	Главная дорога	2		1+150	требуется установить	1		съезд слева
14	2.2	Конец главной дороги	2		0+015	требуется установить	1		слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	требуется установить	1		слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	требуется установить	1	съезд справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+423	требуется установить	1		съезд слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+429	требуется установить	1		съезд слева
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+429	требуется установить	1	съезд справа	
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+682	требуется установить	1		съезд слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	требуется установить	1		съезд слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		1+160	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					18		
		Итого:					19		
		Знаки особых предписаний							
23	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+000	требуется установить	1		слева
24	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+000	установлено	1		слева
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					1		
		Итого:					2		
		Знаки дополнительной информации (таблички)							
25	8.13	Направление главной дороги	2		0+439	требуется установить	1		слева
26	8.13	Направление главной дороги	2		0+429	требуется установить	1		съезд слева
27	8.13	Направление главной дороги	2		0+429	требуется установить	1	съезд справа	
28	8.13	Направление главной дороги	2		0+423	требуется установить	1		съезд слева
29	8.13	Направление главной дороги	2		0+413	требуется установить	1	справа	
30	8.13	Направление главной дороги	2		0+003	установлено	1	съезд справа	
31	8.13	Направление главной дороги	2		0+015	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					1		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					5		
		Итого:					6		
		Всего установлено:					3		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					26		
		Всего:					29		

16

Ведомость размещения искусственного освещения								
Дорога: 0212313 - с.Обуховское, ул.Мира								
Участок 0,000 - 1,264 км.								
Год паспортизации: 2014								
№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+010	0+410		5/5	400	0	400	Справа
Итого:				5/5	400	0	400	

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 0212313 - с.Обуховское, ул.Мира		
Участок 0,000 - 1,264 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
1.11.2	Предупреждающие знаки	0
	Опасный поворот	1
	Итого для группы	1
2.1	Знаки приоритета	0
	Главная дорога	9
	Конец главной дороги	1
2.2	Уступите дорогу	2
2.4	Итого для группы	12
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1
5.16	Итого для группы	1
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	3

СХЕМА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И
КОНЕЧНОЙ ТОЧЕК УЧАСТКА ПО ул. РАБОЧАЯ
НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

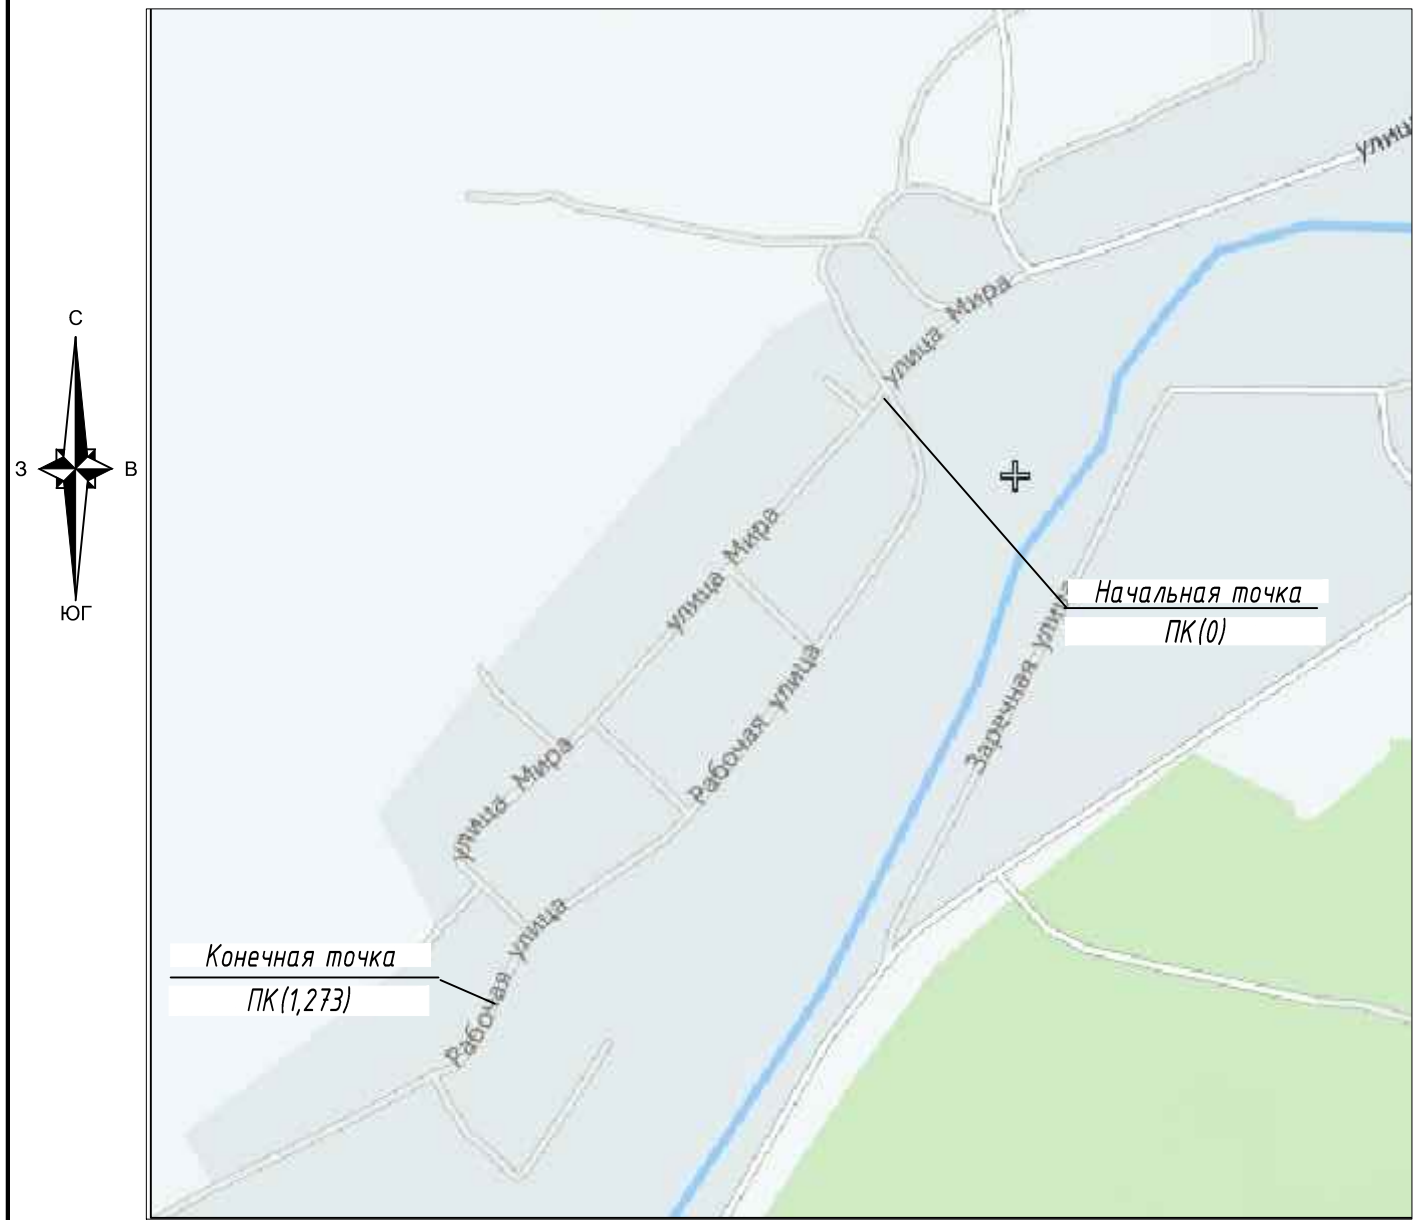


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. РАБОЧАЯ

1. Улица Рабочая имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .
2. Общая протяженность ул.Рабочая составляет 1273 м.
Начальной точке присвоен ПК (0). Начальная точка примыкает к ул.Мира.
Конечной точке присвоен ПК (1,273). Конечная точка расположена в конце жилой застройки .
3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
4. По ул.Рабочая осуществляется движение :
 - легкового транспорта ;
 - грузового транспорта ;
 - пешеходное по обочинам противоположном направлению движения транспорта ;
5. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Рабочая отсутствуют
6. Светофорные объекты на ул.Рабочая отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Рабочая
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

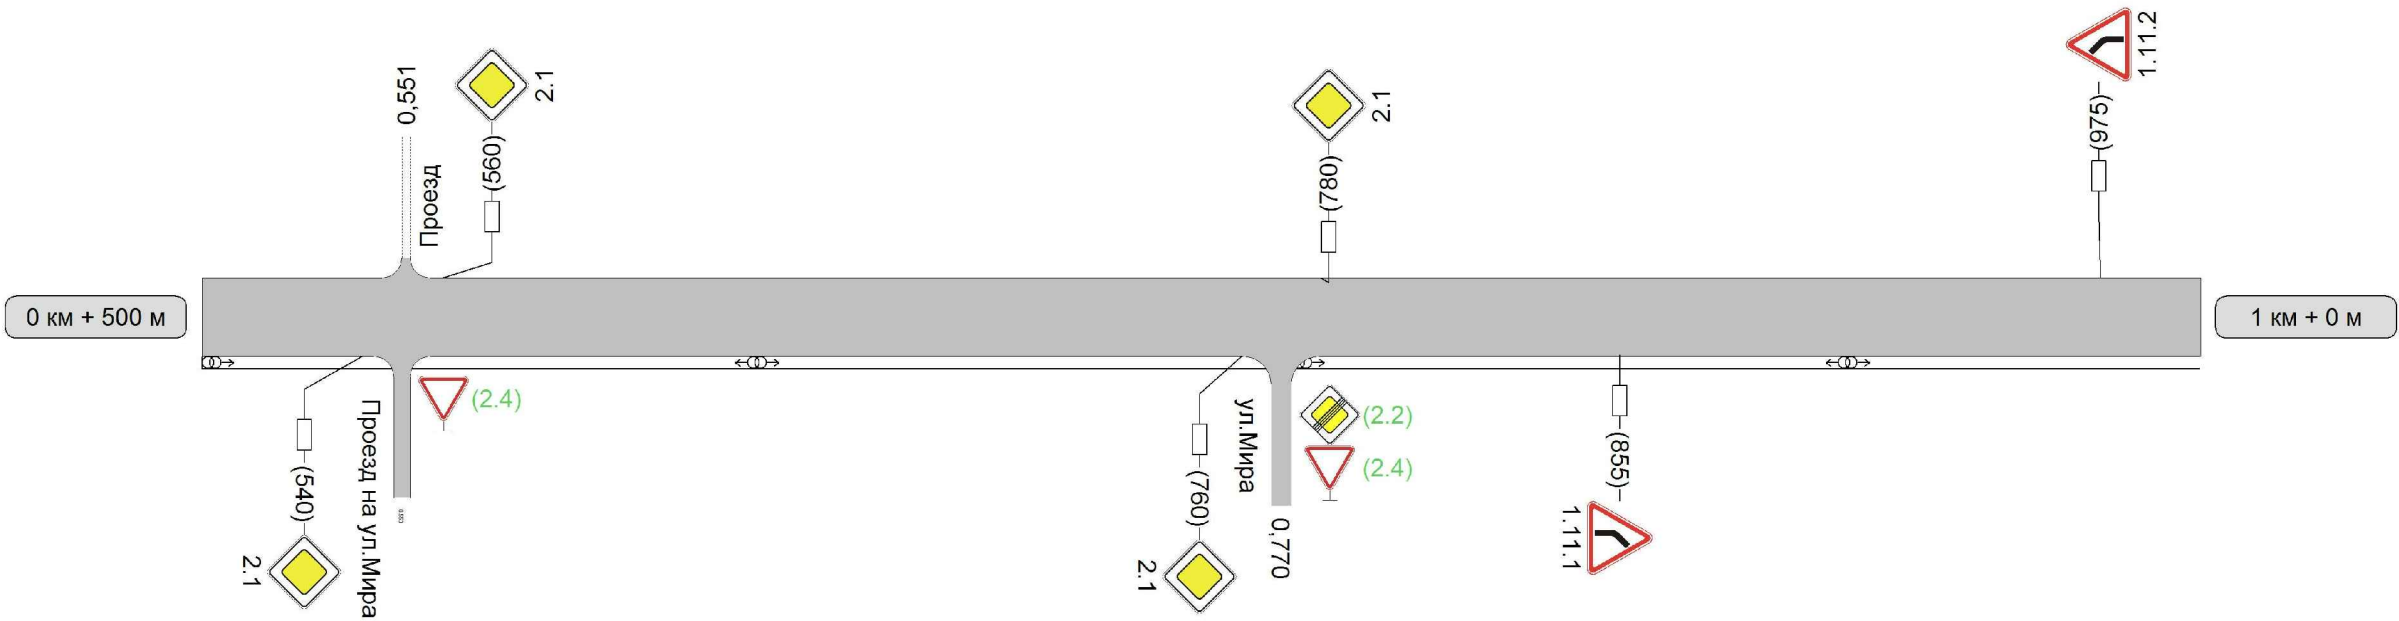

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Видимость в плане в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ С,ОБУХОВСКОЕ

Наименование автодороги (административный район)	с.Обуховское, ул.Рабочая
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по обочине	
1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

$$1 \text{ km} + 0 \text{ m}$$

1 KM + 500 M

Горизонтальное направление направления движения	Видимость автомобиля в прямом направлении	
	Видимость в плане в прямом направлении	
	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
	Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ С.ОБУХОВСКОЕ

Ведомость размещения дорожных знаков									
Дорога: 3113232 - с.Обуховское, ул.Рабочая									
Участок: 0,000 - 1,273 км.									
Год паспортизации: 2014									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+005	требуется установить	1	справа	
2	1.11.1	Опасный поворот	2		0+855	требуется установить	1	справа	
3	1.11.2	Опасный поворот	2		0+155	требуется установить	1		слева
4	1.11.2	Опасный поворот	2		0+975	требуется установить	1		слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					4		
		Итого:					4		
		Знаки приоритета							
5	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+320	требуется установить	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+340	требуется установить	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+540	требуется установить	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+560	требуется установить	1		слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+760	требуется установить	1	справа	
11	2.1	Главная дорога	2		0+780	требуется установить	1		слева
12	2.2	Конец главной дороги	2		0+770	требуется установить	1	съезд справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	требуется установить	1	съезд справа	
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+550	требуется установить	1	съезд справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+770	требуется установить	1	съезд справа	
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					13		
		Итого:					13		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
18	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	требуется установить	1	съезд справа	
19	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	требуется установить	1		слева
20	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	требуется установить	1		съезд слева
		Итого установлено:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					3		
		Итого:					3		
		Всего установлено:					0		
		Всего демонтировать:					0		
		Всего требуется установить:					20		
		Всего:					20		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков		
Дорога: 3113232 - с.Обуховское, ул.Рабочая		
Участок 0,000 - 1,273 км.		
Год паспортизации: 2014		
Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
1.11.1	Опасный поворот	2
1.11.2	Опасный поворот	2
	Итого для группы	4
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	6
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	7
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	1
	Итого для группы	1
